

重修元和吳縣吳江震澤橋寶圖

附說

凡六頁

此橋亦洩太湖北流之水重建於同治十四年文牘詳卷第十四



元和縣境沿塘修建各橋自減渡橋南約一里之燈草橋起又南一里餘為仙涇橋又南二里餘為北朱涇橋又南一里半為南朱涇橋又南一里半為寶帶橋長半里又南三里餘為吳家橋又南一里半為新橋又南半里為連石橋又南五里為長洪橋又南一里半為張墓橋又南三里餘為瓜涇橋又南二里半驛路折至東止

湖 太

湖 臺 澹

橋 帶 寶

寶帶橋南有水寶一座

吳家橋南水寶一座

尹山橋

吳淞江

夾浦橋基

界牌橋

吳江縣志作七里橋亦名北小橋

元和縣界

吳江縣界

南小橋南水寶一座

南小橋

三里橋

七里港

此橋光緒十一年

山 厓

吳江
震澤

重建詳卷第三

三里橋南水寶一座

浮玉洲橋南水寶一座

王家港橋南水寶一座

杜游港橋南水寶一座

三江橋南水寶六座

安邑橋基

觀瀾橋南水寶六座

惠政橋南水寶六座

仙槎橋南水寶三座

廟涇橋南水寶一座

萬頃橋南水寶一座

定海橋南水寶六座

三山橋南水寶一座

甘泉橋南水寶十五座

徹浦橋南水寶六座

白龍橋南水寶五座

吳江縣界

大浦橋

震澤縣界

虹橋

虹橋南水寶二座

吳江縣境沿塘修建各橋自界牌橋南約二里之南小橋起又南二里餘為三里橋又南一里為浮玉洲橋又南二里為王家港橋又南半里為牽港橋又南半里為杜游港橋又南一里為觀瀾橋又南一里為惠政橋又南一里為仙槎橋又南半里為廟涇橋又南半里為萬頃橋又南半里為定海橋又南半里為甘泉橋又南半里為徹浦橋又南三里半為白龍橋又南七里半為大浦橋

北斤鎮

震澤縣境沿塘修建各橋自大浦橋南約一里之虹橋起又南四里餘為翁涇橋又南五里餘為太平橋又南二里為晨腰橋又南四里餘為洪水橋又南一里半為孔家曲橋又南四里餘為長老橋又南半里為通安橋又南不及半里為安德橋

此橋跨練聚港
光緒八年重建
文續詳卷第三
十一

練聚橋

三蕩口

翁涇橋南水寶十一座

太平橋南水寶三座

長腰橋南水寶九座

孔家曲橋南水寶五座

皆屬吳江縣
東圻

安民橋

平望鎮

震澤縣界

安德橋

安德橋南水寶一座

鴛脰湖

下湖橋
小暮虹橋

小暮虹橋南水寶十四座

南六里橋南水寶一座


南三里橋南水寶一座

無名橋南水寶一座

吳江縣南境自安德橋南半里之
下湖橋小暮虹橋起又南五里為
六里橋又南三里為南三里橋又
南二里半為無名橋又南一里為
鰕魚橋又南三里為上匯橋又南
一里為積善橋又南二里為雙里
橋又南三里為七里橋又南四里
為楊橋又南一里半至浙江界

吳江縣界
東浙江浙分界處
秀水縣界

南

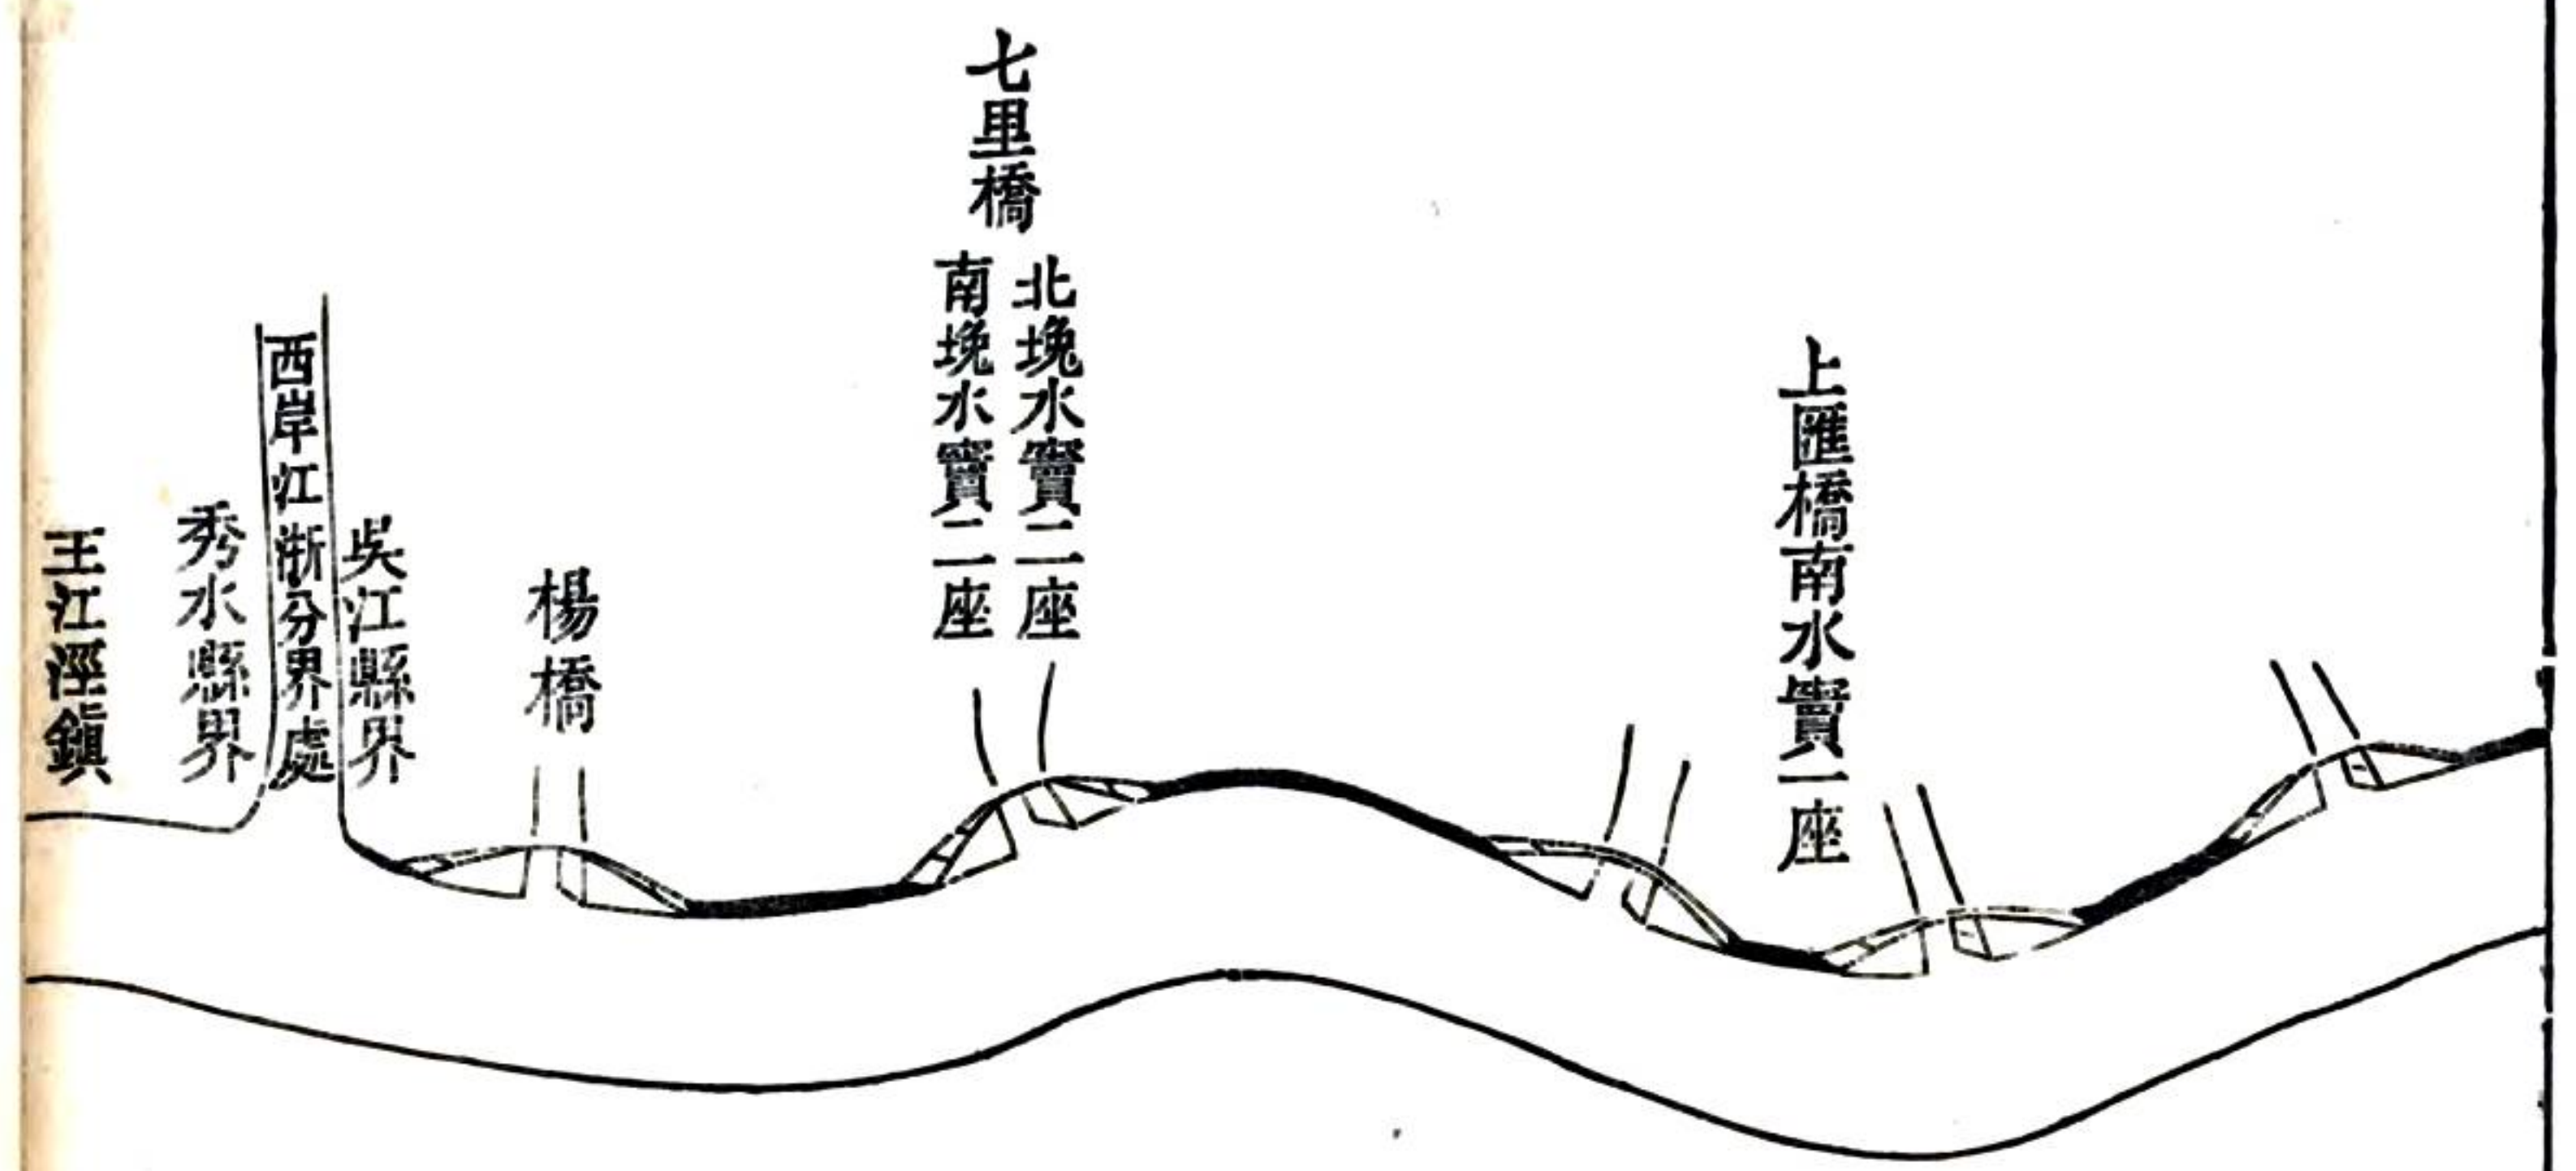

蘇州水鄉也自唐刺史王仲舒隄松江為路
吳江之遠郡城乃不專恃舟楫宋元以來雖
事營治易土為石隄益堅整然攤過湖水
必規宣洩此橋實中利而為子隄相始終也隄
起郡城古赤門訖吳江至江涇一百餘里間橋
以數十計橋起於唐迄多於宋元實以百數十計實指於元隄多
於國朝兵燹後或崩或敷水道多阻生此不
治隄障將為湖病當務為急不必智者皆能

知之顧今昔情事之異亦有以宜審者昔
時洪波浩漸迫近隄下歛治橋竇必至治
隄固而橋竇通後無遺患今則不然隄
外填閉田疇日涸湖流分道可率成涇港愚
民貪灌溉之便往往塞竇自利多不數年已
迷其所脫遇盛漲僅恃各橋貫輪而無竇
以菊殺其怒湍悍迅洩必見淪溢然則治今
日之橋竇又不可無以善持其後者勢則然

矣橋之役修治者七

吳江四
震澤三

重建者四十五

震澤

江二十六元和
十三吳縣

竇之役增置者九

吳江鶯
脰湖

重建者

百有三惟吳縣二橋在盤門外山皆隄比
屬聯級若壁帶之銜金釵也

續纂江蘇水利全案正編卷九



候補知縣李慶雲謹稟竊卑職奉委總辦元利江震橋竇工程業將開辦各工隨時稟奉批准照辦在案茲查元和境內之通仙橋北洙涇橋均在運河西岸爲內河宣洩要口歲久失修全圯入水前經飭匠先將墮石撈清河流業已通暢惟查兩橋均係南北跨塘往來要路必須趕緊修復復經卑職親往履勘實勘得通仙橋原係一洞環橋通長八丈二尺橋門寬二丈二尺水盤長一丈二尺兩塊各長三丈今另砌平臺各六尺照原修建自水盤至橋頂應高一丈四

續纂江蘇水利全案

卷九

元和橋梁
正編

一

尺橋面應寬一丈查驗撈起墮石千金兩塊並未斷損天盤龍筋各存一條圈板一項尙多可用其餘缺折之石只能改作填肚核實確估計需工價石料錢八百九十千五百零北洙涇橋原係一洞平橋通長七丈六尺橋門寬二丈水盤長一丈二尺兩塊各長二丈八尺今另砌平臺各六尺照原修建水盤至橋頂應高一丈橋面應寬一丈查驗撈起墮石較之通仙加多舊時橋面雖盡斷折逐細丈量尙可改作排柱天盤之用其餘石料亦可少添現擬將此橋兩塊俱用排柱核實確估計需工價石料錢六百七十二

千六百零界牌橋在浮玉洲橋迤北東通張家港坍毀日久就沿塘橋梁而論雖非洩水最要之口究係驛遞必由之路該橋原只平面一洞工程本不甚鉅查驗舊時橋面及側塘尙有可用若能及早修復工料較爲節省勘量該橋通長五丈二尺水門寬一丈二尺兩塊各長二丈另做平臺各六尺水盤至橋頂八尺橋面寬一丈核實確估計需工價石料錢三百四十二千零黃家壩橋在運河東岸界牌橋之北歲久失修全圯入水其宣洩利涉情形均與界牌橋相似查驗舊存石料亦有可用勘量該橋平面一洞通

長五丈一尺水門寬一丈一尺兩塊各長二丈今另做平臺各六尺水盤至橋頂八尺橋面寬一丈核實確估計需工價石料錢三百三十七千零南朱涇橋在運河西岸寶帶橋之北南北跨塘歲久失修橋身傾側現查橋面塘石存不及半起步鎖口殘缺更甚必須拆卸釘樁及早修復免致坍塌之後工鉅料多勘量該橋通長四丈四尺水門寬一丈兩塊各長一丈七尺今另做平臺各六尺橋面寬一丈水盤至橋頂高七尺核實估計共需工價石料錢三百千零吳家橋新橋均在運河西岸寶帶橋之南爲官塘往來

必由之路歲久失修全行坍塌港門墮石填塞阻礙水道亟應撈挖深通一律建復卑職帶同匠頭詳細履勘并詢之土人據云該兩橋均係平面一洞逐一丈量吳家橋水門寬一丈兩塊各長一丈八尺另砌平臺各六尺自水盤至橋頂應高八尺橋面應寬一丈新橋水門寬一丈三尺兩塊各長二丈六尺另砌平臺各六尺自水盤至橋頂應高一丈二尺橋面應寬一丈查驗兩橋港門內外墮石除水盤外大都斷缺只能改爲墊裏之用覈實確估吳家橋計需工價石料錢五百四十二千零新橋計需工價石料錢七

百六十五千零長浜橋在運河西岸橋內長浜港遙接太湖係屬宣洩要口橋坍以後行人病涉河流亦不通暢必須及早建復庶水陸均無阻礙勘量該橋原係平面一洞通長七丈六尺水門寬一丈六尺兩塊各長二丈四尺兩平臺各長六尺自水盤至橋頂高一丈橋面寬一丈八寸核實確估計需工價石料錢一千四千文張墓橋介居長濱瓜涇兩橋間爲驛遞往來必由之路橋內張墓港直通太湖又係洩水要口兵燹之後全行坍塌勘量該橋原係平面三洞通長十一丈六尺正水門寬一丈八尺次水門兩

洞各寬一丈四尺兩塊各長二丈九尺另砌平臺各六尺自水盤至橋頂應高一丈橋面應寬一丈此橋雖係平洞與他處情形稍有不同上游河面較寬橋下水深逾丈釘椿排砌既費人力卽水中石料亦須倍增核實確估計需工價石料錢二千一百六十千文燈草連石兩橋均在運河西岸歲久失修橋身傾側砌石脫落殆盡圯圯慮在目前此二橋南北跨塘亦係驛路所必經橋內各港迤邐通湖並爲洩水要口必須一律拆建庶可堅固持久勘量燈草橋環洞一座通長七丈一尺水門寬一丈九尺兩塊各長二丈另砌平臺各六尺自水盤至橋頂高一丈一尺橋面寬一丈一尺核實確估計需工價石料錢七百八十千文連石橋平面一洞通長六丈六尺水門寬一丈八尺兩塊各長一丈八尺另砌平臺各六尺自水盤至橋頂高一丈一尺橋面寬七尺五寸惟南北塘岸至此畧折而西橋隨塘轉遂成斜勢自迤北之新橋圯後裏湖船隻多由此橋出入橋向旣偏舟行頗覺妨礙旣將新橋建復此橋原可改爲水竇惟查驗存石尙可於水盤之上砌高七尺寬長仍因其舊如此則水道無虞阻塞小舟亦可通行加椿重砌估需

工價石料錢三百二十千文以上各工均係逐項確
估覆加核算不敢稍有浮冒除椿木架木艚板石灰
等項仍照案由局購辦工竣造冊報銷合將勘估拆
建元和境內各橋實需工料數目肅泐具稟仰祈
鑒核批示祇遵

同治 年 月 日稟

候補知縣李慶雲謹稟竊查元和境內瓜涇橋係太湖宣洩最要之口爲吳淞江經流前因兵燹坍塌水道阻礙當經稟准先將墮石撈清再行勘估建復計自五月初旬搭架撈挖迄今兩月有餘天熱匠多水工甚形踴躍摸起石料爲數不少其中圈板一項剔去青石尙有三成可用惟天盤龍筋明柱干觔等料多已折斷只能改作砌石刻下測量河底塊石一律撈清各洞皆已暢流間有零星拳石無礙舟行似可不必再撈至墩底舊椿迭經挑選入水能久之工匠細加摸量各墩均有挂椿一尺至尺五不等雖木質

並未朽爛而露出土面斷難持久現既照原建復自應拆清墩石礮平舊椿加釘新椿添購石料砌高老墩三尺六寸將水盤提出水面使圈石不致浸沒如此則全橋得以鞏固一勞可期永逸昨經卑職會同監修橋工委員馮縣丞蔭華逐一丈量該橋原建環洞五座南北共長二十三丈九尺二寸正水門寬三丈六尺次水門兩洞各寬二丈五尺六寸邊水門兩洞各寬二丈兩塊各長二丈七尺兩平臺各長二丈九尺橋面寬一丈四尺自水盤至橋頂留空一丈九尺三寸水深一丈六七尺不等核實確估計需工價

石料錢一萬一百五十千文俱係逐項細算並無絲毫浮冒其椿木架木艫板灰沙等件仍照章由局購辦工竣造具分款清冊連撈石工價一併彙案請銷合將勘估建復元和境內瓜涇橋實需工料數目開呈清摺肅泐具稟仰祈

察覈批示祇遵

同治 年

月

日稟

安徽候補知府董保成候補知府楊錫麒沈瑋寶候補知縣李慶雲謹稟竊卑府等奉

委總辦蘇松潯湖事宜卑職慶雲專辦元和江震橋寶石工並飭卑府等會商辦理正在分別勘估擇要商辦間復奉

憲臺傳諭飭將元和境內寶帶橋先行酌估興工等因奉此卑府等當卽會商傳集匠頭親詣該處細加勘估實勘得該寶帶橋舊址橋身連拖梢南北共長一百丈六尺橋面寬一丈四尺計環洞大小五十三個本係官塘大路橋裏澹臺湖遙接太湖來源分注

續纂江蘇水利全案

卷九

元和橋梁
正編

八

運河直達金雞獨墅等湖入於吳淞實爲宣洩一大要口今查橋身靠北二十七洞兵燹之後全行坍塌靠南二十六洞橋面及鎖口各石亦多殘缺內十一洞水盤欹側尤難經久現經督飭匠頭吳兆祥王春泉徐載昌核實確估分別建修共需工價石料錢一萬四千七百九十千零業經該匠等寫立承攬准於三月二十日破土開工所需樁木石灰等項由局自行購辦彙案列銷其架木桅板等件當由省城官木廠借撥應用工竣移還再查寶帶橋北首舊有廟宇供奉關帝神像現亦破毀無存此次修復橋梁似

應酌量興建以復舊觀並經飭匠估計約需錢八百
餘千所有經費擬請在於橋工項下撥款應用事竣
分別報銷所有卑府等遵飭會同勘估寶帶橋工程
及辦理緣由理合聯銜具稟仰祈

鑒核批示祇遵

同治 年 月 日稟

安徽候補知府董保成候補知府楊錫麒沈瑋寶候補知縣李慶雲謹稟竊查元和境內寶帶橋前奉撫憲傳諭勘估修復當經卑府等會商確勘飭匠核實估計將該橋北首全圯之二十七洞照依原式建復南首未圯之二十六洞擇其傾側過甚者拆修十一洞已奉

各大憲批准照辦在案卑府等遵卽雇集工匠趕緊興修自開工至今已將北首二十七洞釘樁排砌南首應修十一洞亦已如數拆卸約計工程已在六分以上惟查驗拆修之十一洞從前橋身之內俱係泥

土堆築並未填石灌漿則此外未卸者其中亦可概見現在新修各洞係屬間斷拆卸左右洞石移去中間不免鬆裂兼之搭架釘樁時時震動以致未卸之十五洞就橋身而論本尙完善今漸傾欹似宜一律拆卸加釘新樁添石排砌以期全橋鞏固一勞永逸不敢因稟定在先稍存遷就卑府等公同商酌逐細確估除樁木石灰等項仍照案由局購辦外核計增工添料實需加錢二千六百八十九千零合將復估續添寶帶橋工程數目及辦理情形肅泐具稟仰祈憲臺察核批示祇遵

同治十年七月二十六日稟

水利工程總局批據稟寶帶橋南首未坍二十六洞
先行拆修十一洞查驗從前橋身俱用泥土堆築未
經填石灌漿現在新修各洞係屬間斷拆卸中間不
免鬆裂以致未卸之十五洞橋身亦漸傾欹擬請一
律拆修釘椿填石以期全橋鞏固不敢以稟定在先
稍事遷就估需加增工料錢二千六百八十九千零
自係爲慎重要工起見應准照辦仰卽造具實需工
料清冊呈送查核一面督飭工匠上緊如式興修勿
任草率仍先補稟

續纂江蘇水利全案

卷九

元和橋梁
正編

土

各憲查考並候批示繳
