

80108

144276

49
201

7.007

技術綴結之八

給水

件000117

871563



西北鐵路幹線工程局

1952年12月

前　　言

為了交流經驗，提高技術，茲將新建鐵路的施工操作過程、施工方法、勞動力組織和使用機具等方面，分別做出初步總結，作為一九五二年冬季學習的教材，並供施工業務學習參考之用。

由於廣大員工的積極創造性，在與大自然的鬥爭過程中，創造了豐富的經驗，但是我們收集總結還很不完整，希望各單位員工同志繼續收集資料補充豐富其內容，并進一步加強今後施工中的技術總結工作。

原擬結合我們的施工實際，能更有系統地介紹蘇聯先進經驗，但由於缺乏這一方面的現存資料，雖介紹了一些，但還很不夠，留待以後陸續補充。

由於時間短促，在內容上缺點和錯誤很多，希同志們多提意見，以便修正。

承甘肅日報社大力幫助，加工排印，特此致謝。

西北鐵路幹線工程局

一九五二年十二月

給水工程初步總結目錄

| | |
|------------------|-------|
| (一) 施工前準備工作 | 1—2 |
| 1. 細水工程設計 | 1 |
| 2. 勞動力組織 | 1 |
| 3. 施工組織計劃 | 2 |
| 4. 材料供應 | 2 |
| (二) 木水塔 | 2—6 |
| (三) 山上水槽 | 7—12 |
| A. 150T山上水槽 | 7 |
| 1. 勞動力組織 | 7 |
| 2. 使用工具 | 7 |
| 3. 施工準備情況 | 7 |
| 4. 施工經過 | 7 |
| 5. 施工操作方法 | 8 |
| 6. 脚手架模型板及支撐結構 | 8 |
| 7. 工數統計表 | 8 |
| B. 100T山上水槽 | 9 |
| 1. 打混凝土的方法 | 9 |
| 2. 工程進度 | 9 |
| 3. 脚手架材料 | 9 |
| 4. 工數 | 10 |
| (四) 鋼筋混凝土水源井 | 13—15 |
| 1. 勞動力組織 | 13 |
| 2. 備料情況 | 13 |
| 3. 施工方法及經過 | 13 |
| 4. 井筒下沉及打混凝土所用機具 | 13 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 5.操作方法 | 16 |
| 6.工數統計表 | 14 |
| 7.腳手架及模型板支撐 | 15 |
| 8.水源井構造 | 15 |
| (五)木質水源井及臨時給水設備..... | 15—21 |
| A.3M×3M×17M木質水源井 | 15 |
| 1.勞動力組織 | 17 |
| 2.使用機具 | 17 |
| 3.備料情形 | 17 |
| 4.施工操作方法 | 17 |
| 5.工率 | 18 |
| B.安裝機械及直送設備 | 18 |
| (六)洋灰管..... | 22—25 |
| 1.概說 | 22 |
| 2.製洋灰管 | 22 |
| 3.鋪設洋灰管 | 23 |
| (七)水管及水鶴安裝..... | 25—26 |
| 1.水管安裝 | 25 |
| 一.鉛口接頭操作方法 | 25 |
| 二.洋灰瀝青接頭操作方法 | 25 |
| 三.施工組織 | 26 |
| 四.工率 | 26 |
| 2.水鶴安裝 | 26 |
| (八)機械安裝..... | 26—35 |
| 1.鍋爐水泵的裝卸和搬運 | 27 |
| 2.鍋爐水泵的安設 | 28 |
| 3.配管的安裝 | 30 |
| 4.工料率 | 32 |

給水工程初步總結

(一) 施工前準備工作

(1) 細水工程設計：

定綫測量時，必需按照設計規程由換算距離及機械設備情況，決定給水站之站間距離，擬定給水站址，按所用機車種類、列車對數及其他情況計算所需要給水量。

設計前必需化驗水源之水質，並試驗其湧水量是否可用或够供所需要水量，是否需要軟水設備或沉澱池，詳測地形、研究地質及凍結深度，統籌給水設備之佈置，決定採用水源之類型及位置（利用山上水槽、挖井、河流或儲水池），設計給水所水塔、水鶴、管路等及其防寒設備與埋管深度。

施工之前必需有給水設備佈置圖、各種設備詳細設計圖及其他全部技術文件。

給水工程之各種設備應利用定型設計，因所用材料機械及配件等種類繁多、且不普通，各標單圖應附有材料機具詳細規格及數量，施工前按之備好。

(2) 勞動力組織：

給水工程所用勞動力，因個別工程數量少而工程種類繁多，故工少而工種多，為使工人技術熟練，必須實行專業化，實施時分組，通常分挖井組負責挖井（淺井、深井、臨時井），混凝土組負責做山上水槽混凝土、水井混凝土、水塔及水鶴坑等混凝土，水道組負責安裝水管及水鶴等，修配組

• 2 •

負責安裝機械及其他鐵工、鉗工工作，木工組負責做木水塔及模型板。

(3) 施工組織計劃：

給水工程分佈地區廣，工程不集中，工作流動性大，個別工程數量少，在施工前應詳擬施工計劃，使各種工人密切配合流水作業法，皆無空隙時間，以提高工作效率。編計劃時應考慮研究正式給水是否在通車前做好應用，或需先做臨時給水或在鋪軌時使用水櫃車，臨時給水必需預先準備配合使用，以免影響運輸。

(4) 材料供應：

給水工程之工期依靠材料供應是否及時，是否有停工待料，給水工程所用材料機具種類繁雜，且多數非臨時所可購置，必須預先訂購，並擬好供應計劃，使料具機械皆及時供應，以免發生停工待料現象，浪費勞動力甚至誤運輸之需要。

(一) 木水塔

木水塔係 $2 \sim 30T \times 12M$ ，支於四排木排架，在成品廠做成，共用木工165工，組立排架共用技工108工，大工7工，普通工48工，安裝水槽及做防寒板（包括鋁板）共用木工793工，普通工88工，以上共計木工958工，普通工136工，技工108工，大工7工。

(1) 所用工具（木工工具不計）：5T手搖絞車一台，3T三輪滑車二個，三噸單輪滑車一個，25#呂宋繩四條，約重400公斤，16#鋼絲繩一條，約重350公斤，12#鋼絲繩一條，約重200公斤。1500mm龍鋸二條，1200mm合鋸四

條，1400mm 鐵鏈根四根，16mm 青麻繩20公斤， $16\phi \times 170$ mm 蓋鉛錠80公斤，銅錢錘兩個，450mm 鐵水平尺一把，21 #木鎖六把，30M 皮尺一盤，12" 懸嘴扳子八把，8#大錘兩個。

(2) 脚手架結構及所用材料：

160 $\phi \times 7M$ 圓木，50厚松木板，8#10#角線，鐵鉗鋸。



腳手架是利用木架上部夾板，將圓木安在夾板上，伸出約3.5M，上鋪50厚松木板，板上立小圓木柱，與木排連結成約高8M。

(3) 施工步驟和幾點改進。

木排架開工時，是根據圖上尺寸將前後及側面排架的夾板及十字撐木大樣放出，依照大樣做好各部十字撐木及夾板與元木柱接連的位置樣板，然後照樣板割綫，依綫下料，進行工作，吊綫方法在每根元木柱開工時，在元木柱四面打好明順的中綫，排架立好時用銅錢錘吊綫找直。木水槽木料經過烘乾後先做出標準樣板，每工作人一塊，實行負責制，每塊槽壁板均編有號碼，並記工作人姓名，於槽壁板上，槽底板與槽壁接連的榫口，派專人負責割綫及開鋸榫口，槽壁與槽壁連接處有 $1/2"$ 硬元木榫三度，槽底板按標準圖上規定是150mm寬木板，但在槽底與配水管接連之處，需在兩底板接連之間挖200mm元眼一口，元眼之外，過閘尚需鑽 $1/8"$ 螺絲眼六個至八個，兩塊150mm寬的木板，除挖200mm元眼及鑽固定螺絲眼之外，這兩塊底板，除去已挖之元眼過閘只餘約25mm寬的木板，槽底是要漏水的，鐵箇兩端的緊絲器標準圖規定

是熔接的（即電焊），但熔接之處一經震動，容易破裂，1949年京漢綫所做之木水塔，結果試水漏水，經數次修理後，配水管與槽底板接連處，仍是滲水。鐵箍熔接部分，也修理數次。在此次修建隨西木水塔時，槽底木板與鐵管連接部分統改用300mm寬的木板兩塊，鐵箍緊絲器改用生鐵做的緊絲器使用，成績良好，木水槽鐵箍圖定每度鐵箍緊絲器為兩度，在槽底板上下之間的兩度箍，若仍用緊絲器兩度，則槽底與槽壁連接之處不易結密，恐有漏水之虞。故改為緊絲器四度，則槽底與槽壁接連之處容易結密，結果成績甚佳，木水槽裝置時，先將槽底梁木如圖尺寸固定，並將槽底木板圈好，槽底木板接連處（做有 $3/8 \times 1\frac{1}{2}$ "硬木方榫二度至三度），然後根據中綫擺在梁木上，再將用油煮過的青蘆鞭裝在槽底木板四週（即與槽壁接連之處），然後將槽壁順次安裝（槽壁板每三塊連成一組），再上鐵箍，按圖規定尺寸，將箍擺好，再上緊螺絲，關於槽壁與槽底連接之處，需留5mm的縫子，用土瀝青煮過的青蘆填塞結實，再用煮滾的土瀝青將縫口封嚴，木槽內部抹生桐油三次，試水時，發現配水管與槽底板接連部分滲水，查其原因是安管時，管子下墜底板吃力過大，板縫分離所致，即將水放出修理後，再試水，結果成績尚好，點水不漏。


2#水塔进气装置(一)

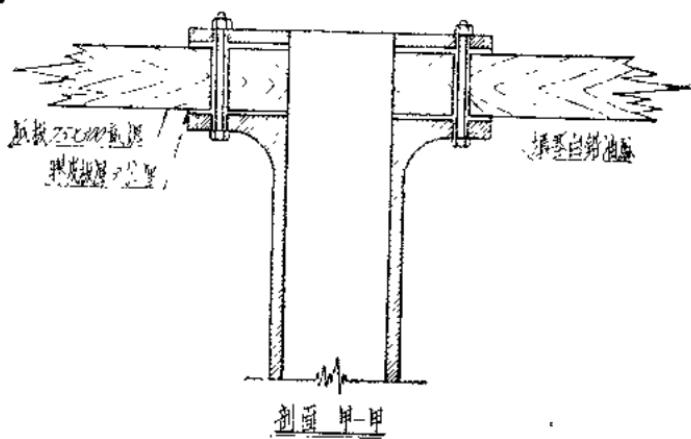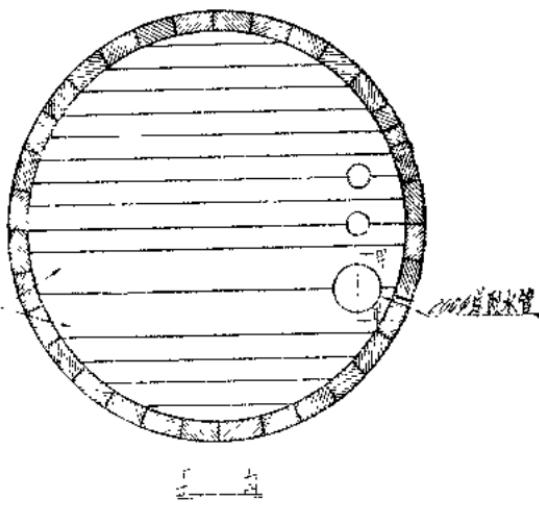


• 6 •

6030 "木永塔結構次經圖(二)


本圖尺寸以公厘計




剖面 二-一

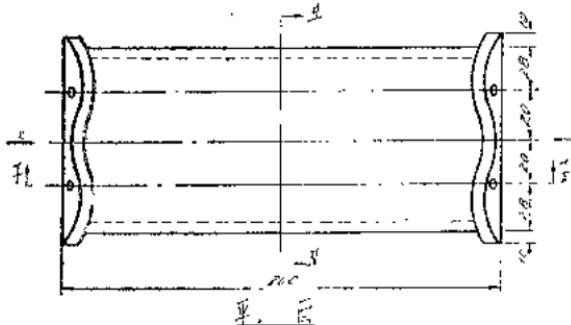


单 截



前面 (左)



前面 (中)



前面 (右)

(三)山上水槽

配水設備為省用水塔，有用山上水槽者，如地形許可，儘量利用山頭做水槽，建築費用少，因為水槽埋在地內，減少防寒設備，又不需用鐵支架。

A.150t山上水槽施工經過及施工方法如後：

(1) 原有勞動力：鐵工2人，木工2人，水泥工2人，普通工24人，共計30人（做模型板時，由木工組調人協助，小工不够，添僱臨時工）。

(2) 使用工具：平頭鎚6把，圓頭鎚30把，大平頭鎚（剷灰用）2把，洋鎗10把，大棕繩(28mm)30公斤，單輪滑車2個，大鐵板3塊，扒鋸500個，8#鐵鉗50公斤，大水桶4個，小水桶10個，抬筐50個，抬槓30根，麻袋30條，16#麻繩20公斤，12#麻繩20公斤，150公斤木夯一個，緊絲器12個，9公斤大錘2把，6公斤錘2把，鐵棍2根，16#鋼筋扳手一個，12#黃絲鉗子一把，鐵鑽一個。

(3) 施工準備情況：先在附近河中，採集河卵石，一部分改鍛後做混凝土石礫，天河卵石做水槽基礎，且因水槽基礎土質較軟（經過32小時荷重試驗，面積 $20\text{cm} \times 20\text{cm}$ 只1200公斤），用二塊枕木合併起打夯，夯後乾砌天河卵石基礎，在其上打第一層混凝土。

(4) 施工經過：(一)挖水槽基礎，(二)打夯，(三)乾砌片石基礎，(四)立外模型板及紮鋼筋，(五)打水槽基礎混凝土 9.6M^3 ，打坡腳混凝土 1.4M^3 ，(六)立內模型打混凝土 1.5M 高，立外模型與紮鋼筋及搭腳手，打混凝土 1.3M 高，

• 8 •

三套模型倒用分層灌注混凝土，（七）最末層混凝土打完後二天拆模型板，用腳手架抹防水層，由15人白天抹一次，晚上再抹一次，（八）翌日試水如仍有滲水現象，再抹一層洋灰砂漿。（九）乾後正式交付使用。

（5）施工操作方法：

一、挖土：當挖掘深度由2.5M至5.4公尺時，於中間搭架子，分兩層出土，提高工率十分之一。

二、打混凝土：拌合4人，灌注4人，搗插6人，抬砂石6人，倒灰1人，倒灰1人，用兩塊鐵板拌合，用木滑槽送到下面鐵板上，灌注4人用鏟送入模型內，三人插邊，三人搗固，打完後，蓋濕麻袋養生，每天噴水潤滑。

（6）腳手架及模型板支撐結構裏面，豎立8根6M長圓木，兩豎木間用橫木拉住（詳圖三）。

（7）工數統計表：

150T山上水槽工數統計表

| 工程項目 | 單位 | 數量 | 實際出工工數 | | | 附註 |
|-------------|----------------|------|--------|-----|-----|----|
| | | | 技工 | 小工 | 共計 | |
| 挖 土 | M ³ | 285 | — | 102 | 102 | — |
| 模型板做立拆 | M ² | 270 | 110 | 27 | 137 | — |
| 搭拆腳手架 | | | 13 | 27 | 40 | — |
| 彎繫鋼筋 | 噸 | 2.6 | 10 | 25 | 35 | — |
| 灌注14 Kg 混凝土 | M ³ | 45.6 | 30 | 55 | 85 | — |
| 抹 防 水 層 | M ² | 1455 | 16 | 20 | 30 | — |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 乾砌片石 | M ³ | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 安裝配管 | 套 | 1 | 10 | 20 | 30 | |
| 做安水標尺 | 個 | 1 | 10 | | 10 | |
| 回填土打夯 | M ³ | 100 | | 30 | 30 | |
| 做安鐵梯子 | 個 | 1 | 9 | | 9 | |
| 做安人孔蓋 | 個 | 1 | 2 | | 2 | |
| 共 計 | | | 209 | 311 | 520 | |

B. 100T山上水槽(圖四)施工程序：(1)開挖基礎(7.5M × 4.5M)，勞動力因挖土深度增大出土困難故逐日增加。(2)挖好後用兩根枕木併在一起作木齊，由4人夯實基礎。(3)由12人砌片石基礎。(4)立模型紮鋼筋，打底混凝土。(5)立模型及紮鋼筋打四週圍混凝土分層灌注，立模型板1.6M高費4個工，灌注混凝土費11工。(6)立頂部模型板紮鋼筋灌注混凝土用9工。(7)自第一次打混凝土起每天養生1人。(8)打水標尺座閘閉台及人孔混凝土用4工。

(1)打混凝土的方法：將拌成的混凝土順鐵板推下到水槽內，腳手架上之鐵板上，灌注入用洋鐵鏟到模型內轉圈分層灌注，每層不超過三公寸。勞動力組織：拌合4人，供灰1人，抬石子2人，抬砂子2人，搗插4人，倒水1人，抽水2人，運洋灰2人，灌注2人。

(2)工程進度：若模型板每層高度僅1M高，打混凝土時，不够一天工作，最好每次灌注1.5M高。

(3)腳手架所用材料圓木150φ × 6M30根，100φ × 2M30根，鉋鋸50公斤，8#鉛線20公斤，麻繩15公斤，木板35

• 10 •

M²。


(4) 工數：除備料及零星工作外，共計使用勞動力410工。

混凝土隊做水槽及水源井時，利用間斷時間，做水鵝坑、人孔等小工程，茲將每座200¢水鵝坑需用工數（工期需6天）列表如下：


水鵝坑需用工數表

| 工程項目 | 單位 | 數量 | 需要工數 | | 附註 |
|-----------|----------------|------|------|-----|------|
| | | | 技工 | 小工 | |
| 挖 土 | M ³ | 28 | 6 | 6 | |
| 基礎打夯 | M ³ | 92 | 1 | 1 | |
| 模 型 板 | M ² | 31.2 | 5 | 17 | |
| 乾 砌 片 石 | M ³ | 27 | 3 | 3 | |
| 140Kg 混凝土 | M ³ | 0.6 | 1 | 1 | |
| 110Kg 混凝土 | M ³ | 8.8 | 7 | 14 | |
| 繩 紮 鋼 筋 | 公尺 | 40 | 0.5 | 0.5 | |
| 安 裝 鐵 蹤 | | | 2 | 2 | |
| 回 塡 土 | M ³ | 8 | 2 | 2 | |
| 共 計 | | | 22.5 | 24 | 46.5 |

做一座 1M¢ × 2M 混凝土人孔，需技工14工、小工 24工（工期三天）。

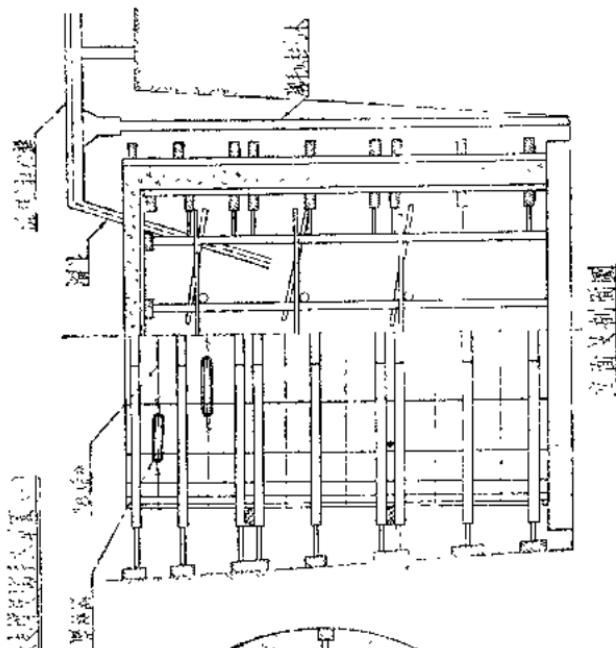


橋墩構造圖

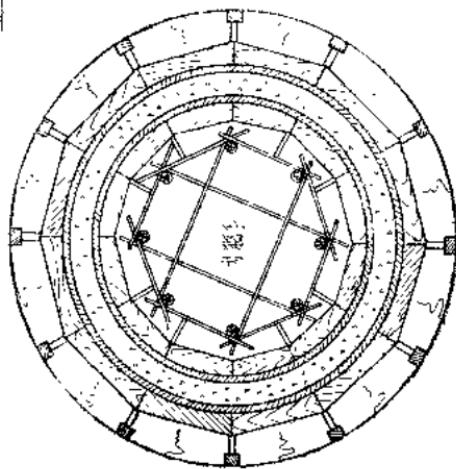

平面圖

100' 江上木槽模型试验装置示意图

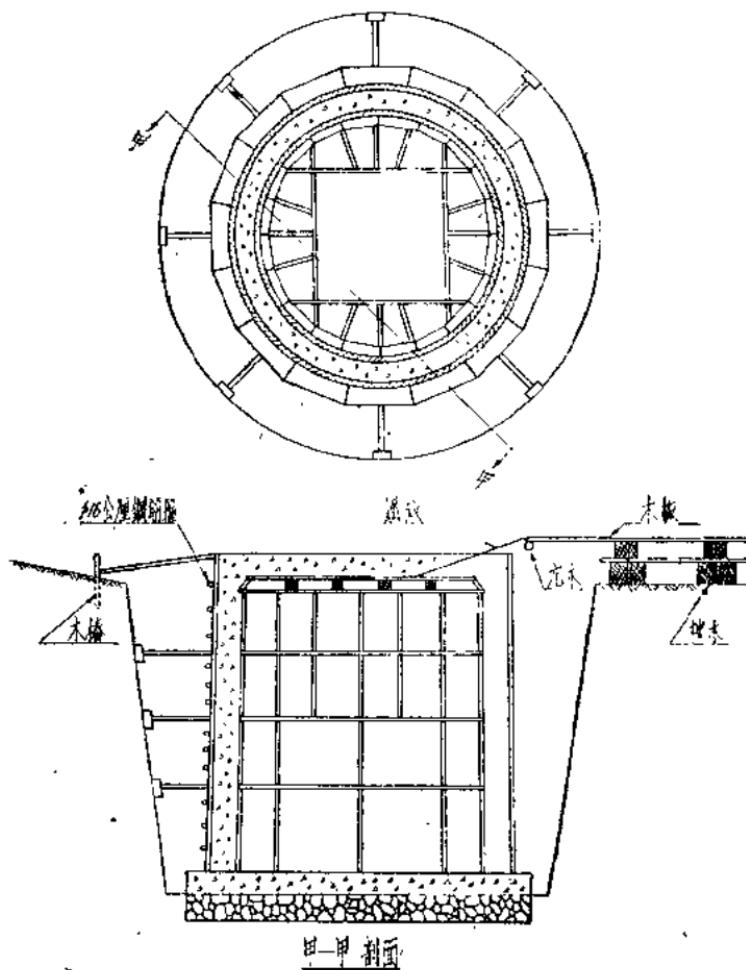

(四) 鋼筋混凝土水源井

混凝土水源井應與山上水槽同時開工，打井時需用抽水機，茲將施工組織及施工經過分述於下：

(1)勞動力組織：鐵工2人，木工2人，泥水工2人，普通工24人，共計30人（小工不夠添雇臨時工，做模型板由木工組派人協助）。

(2)備料情況：開工時全部勞動力，在附近河中採鍤卵石 $13M^3$ ，共用大工24工，普通工87.5工，採洗運河砂 $69M^3$ 共用大工28工，普通工93.5工，工地距車站有一公里，途中並有水溝，如運洋灰採取分節括運，所用工具，有手錘30餘個，抬筐20個，抬檣10根，鐵鍬30把，大木斗一個（洗砂子石子用），8#錘4個。

(3)施工方法及經過：(一)水面上三公尺明挖二日完畢。(二)立刃口模型紮鋼筋打刃口混凝土並養生約五天。(三)立井筒模型紮鋼筋分層灌注混凝土，並養生。(四)紮平台鋼筋打平台混凝土。(五)拆模型板，拆打混凝土腳手架立挖土用腳手架。(六)挖土并井筒下沉同時用兩部抽水機抽水五天。共下沉 $2.35M$ 。(七)拆腳手架及運走抽水機。(八)回填土。(九)立模型板紮鋼筋打井筒及井蓋混凝土。(十)拆模型回填土裝配管。

(4)井筒下沉及打混凝土所用機具：

井筒下沉所用工具：麻袋100條，鐵鍬20把，洋鎗10把，雨衣10件，膠鞋10雙，鐵鋼鉗(1M長)8根，8#錘4把，大繩2條，單輪滑車2個，抬檣10根，抽水機三台。
