




# 中國大運河歷史文獻集成

31

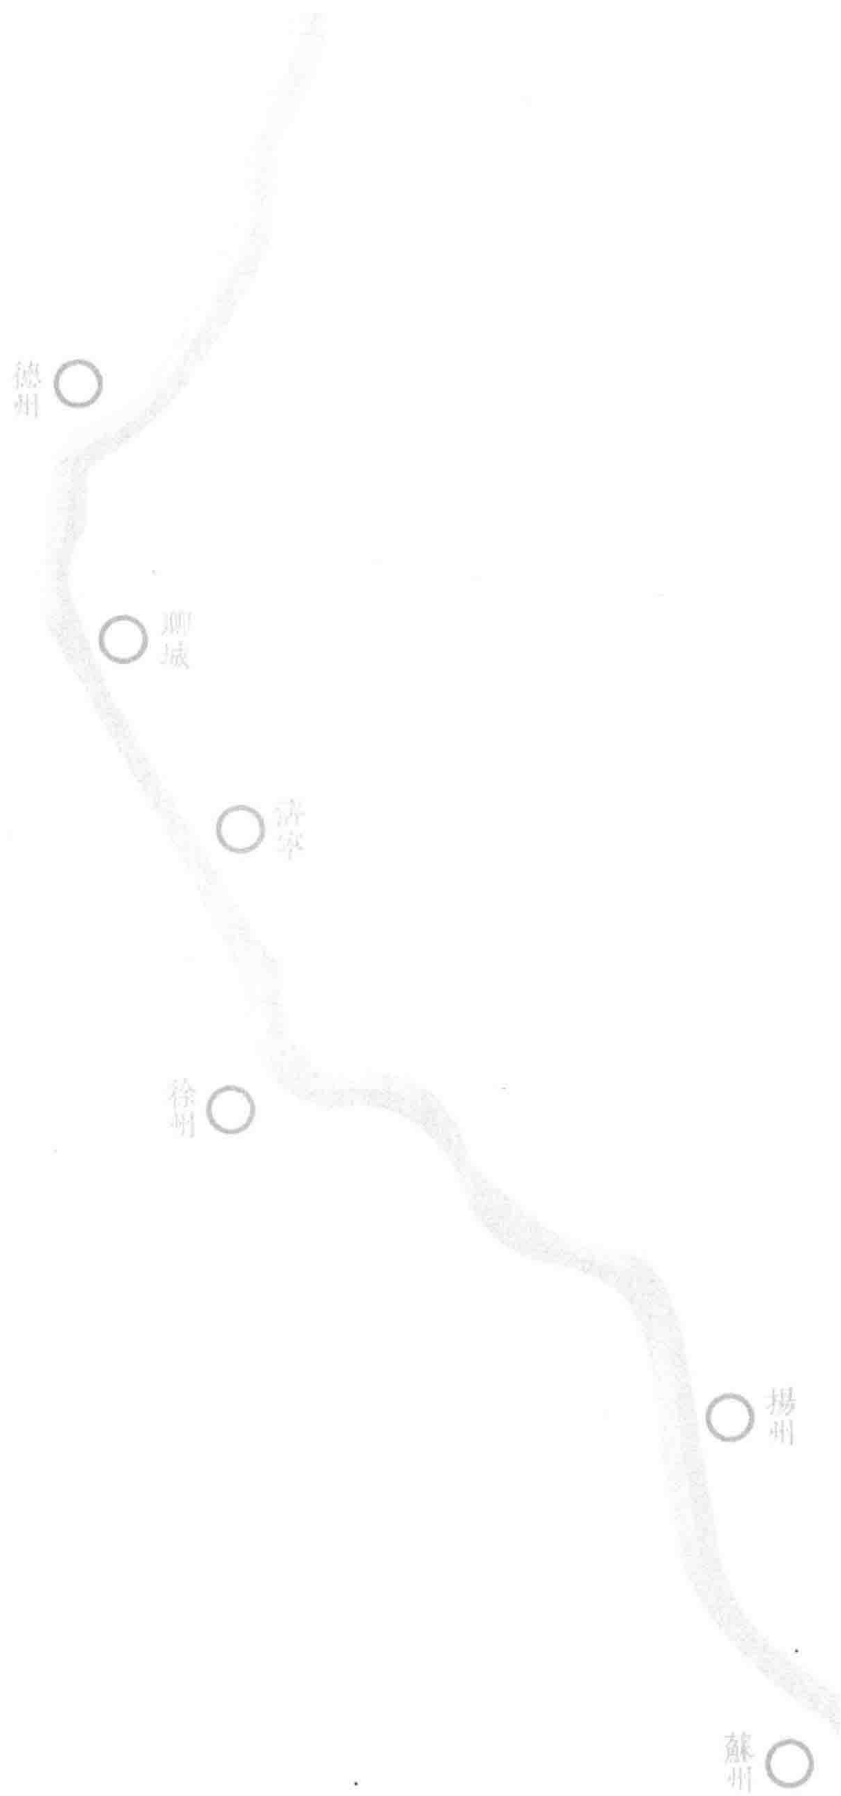

主編 王雲 李泉

國家圖書館出版社



又給屏水築壩工料銀一千五百四十八兩二錢六分

五釐

又給建開工料銀四千五百九十六兩

又給建造白茆河道渡船橋南渡橋北渡橋薦河橋顧

七房橋共木橋五座計工料銀四百六十七兩一錢

一分一釐

統計土方夫工開壩等項共用銀八萬九千一十七

兩五錢三分六釐理合登明

重濬白茆河全案 卷三

重濬七浦河全案卷一

前署太倉州知州周岱齡加知府

正鼎為遵札會勘議詳事奉

院臺札開案據前署太倉州周牧詳稱勘得七浦河

道東為海口設七浦橋一座閘門淤塞相離海口約

有一千五百餘丈由閘而西上至沙溪鎮西與蘇屬

昭文縣接壤自沙溪鎮下至浮橋鎮綿長三十餘里

中間或僅存水溝或淤成平陸卑職逐細勘丈擗節

估計應自沙溪鎮東陶鴻升田頭處擬築西大壩起

東至浮橋鎮迤東馬洞涇東大壩止應挑土工長五千

重濬七浦河全案 卷一

九百八丈二尺擬挑口寬五丈底寬二丈平水面挑

深七尺共估土一十三萬九千三百六十三方一分

四釐內除浮橋鎮市河六十丈向例由該處居民各

照門面自行開挖不計土方外實應挑土一十三萬

七千七百二十二方一分四釐每方估給價銀一錢

二分共估方價銀一萬六千五百二十六兩六錢五

分六釐又應築東西大小木壩十八座并各土壩二

十六條共估實需壩工銀八百六十一兩六錢九分

八釐又車水銀六百六十兩八錢統其實需銀一萬

八千四十九兩一錢五分四釐其壩外東至海口約

有七八百丈潮來普漫難以施工查七浦舖一座原設尾閘乘潮啟閉然離海較遠攻刷無力擬將現估東大壩培築寬大內爲清水河潦則啟壩宣洩旱則堵閉儲蓄潮汐不能漾入可無淤墊之患農田得以長資灌溉卑職卷查歷屆開挑七浦俱係業食佃力原不敢輕言借

帑祇緣卑州自道光三年大災以後連年災歉戶鮮蓋藏若仍拘執成例責令挑濬民力實有未逮且工程又屬緊急籌辦維艱卑職因思此次開濬劉河樽節估用尙有借賸餘銀可否仰懇俯念民間要工難緩

準將劉河餘存

帑項內借給興挑庶太鎮水利可以永遠疏通而田疇可冀膏腴悉復所有請借銀兩請俟工竣後仍照州縣役田附入劉河案內

奏請一律分作八年攤徵還款至是河向係業食佃力開挑現在每方價銀擬照劉河方價減半給發爲飯食之需輿情均所樂從工程可期無誤卑職因爲地方水利起見不揣冒昧謹將勘估工段土方車壩銀數繕具清冊繪圖貼說詳請興挑并據聲明免其造

報等情詳奉

重濬七浦河全案

卷一

二

撫院批司議詳當查歷屆挑濬七浦河道均係業食佃力興挑並無借

帑挑辦之案今據該州請將開濬劉河案內借賸餘銀借給興挑附入劉河案內一律分作八年攤徵還款等情是否不致奉

部駁詰應再由州確覈妥議切實通詳察辦且查前項河道前據該州面稟不過一萬三千餘兩工程今詳稱一萬八千四十餘兩之多其中顯有不實不盡必須另行樽節估計其所估土方工價據稱照劉河方價減半估計將來設奉

重濬七浦河全案

卷一

三

大部以同一挑河方價何以劉河方價與七浦多少懸殊駁飭殊多掣肘并查民辦一切工程近奉行準部文俱應造冊報銷况劉河動用銀兩卽應造報七浦河事同一例更未便率請免造卽經札飭該牧逐一確勘妥議覆勘減估另行通詳察辦在案迄今月餘未據詳到現已秋深冬令將屆水勢日漸消落或乘此時勘辦或先事綢繆交春興辦俱應及早勘酌定見查周牧現已卸事所有前項河道係原勘之員應速會同周牧趕辦覆勘估辦未便再延合就札飭札到該州立卽會同周牧遵照

撫院批示及指飭各層逐一確覈妥議先行通詳一面乘時覆加確勘樽節估計大加刪減另造估冊所稱照劉河方價減半估計聲敘之處殊與劉河通案室礙究應如何辦理何時興工方爲盡善該州等務須遵照指飭悉心熟籌妥議切實聲明另行通詳察辦事關

奏咨達

部之件毋稍草率願預等因到州奉此卑職遵卽移會卑職岱齡會同查勘旋據職舉生監汪彥杰等稟稱按畝役夫全憑佃力分段督濬不外業董刻下正

重濬七浦河全案

卷一

四

值佃農納稼輸租業戶收租辦賦之時不暇兼顧此次開濬七浦似可仿照開濬劉河成例一體請俟來春興挑等情據經詳奉

藩司批開該州七浦河道卽使須於來歲春融舉辦此時亦應將工段丈尺土方工銀數先行確切勘估造冊詳候覈定詳請

奏明屆期興挑未便延緩仰卽遵照卽飭會同前署州周倅乘時覆加勘估樽節估計造冊妥議通詳察辦

仍候

兩院憲覆

巡道批示等因並奉

各憲批示到州奉此卑職岱齡遵卽馳抵太倉會同卑職正鼎前詣該河逐段覆加勘丈除原估五十七八九等三段工長二百八十丈現在河面丈尺較爲寬深應請毋庸挑濬外自沙溪鎮東陶鴻升田頭處擬築西大壩起東至浮橋鎮迤東前屆老壩基擬築東大壩止計五十六段實量見工長五千六百二十八丈二尺現在擬挑口寬五丈底寬二丈平水面濬深六尺確切估計共應挑土一十四萬一千六百三十九方一分四釐其中浮橋鎮市河六十丈雖向有

重濬七浦河全案

卷一

五

由該處鋪戶居民各照門面自行開挖而河久淤墊商賈不通且頻年荒歉居民大半遷移鋪戶亦多閉歇應請歸案一律挑濬毋庸扣除雖與卑職岱齡原估丈尺土方均屬不符而卑職等會同逐段覆加確估實計土一十四萬一千六百有奇俱係應挑之土若迴護前詳仍照原估請挑固非覈實辦公之道若照現估土方承挑仍照原估給價又恐承挑之董事人夫以爲增出土方較多值茲歉歲民力難支轉恐推諉貽誤應請仰懇

恩施俯照現在覆估辦理以歸覈實以免藉口至奉

藩臺札開歷屆挑濬七浦河道均係業食佃力並無借

帑之案據請將劉河餘銀借給興挑附入劉河案內一律分作八年攤徵還款是否不致奉

部駁詰飭再妥議詳辦等因卑職等伏查劉河案內節省餘銀前蒙

撫院奏明於各處淤淺河道擇要興辦所有劉河借款仍照原估一十六萬五千三百二十餘兩之數歸

於太鎮等十六州縣分年攤徵還款並聲明太湖以下泖澱支河暨七浦河道委員確勘估計銀數分別

重濬七浦河全案

卷一

六

奏報已蒙

諭旨允準將來如奉

部駁應請以

奏準有案詳請咨覆又奉

藩臺札開同一挑河何以劉河方價與七浦多少懸殊設奉

大部駁飭殊多掣肘飭再妥議另詳等因卑職等伏查挑濬劉河係估挑面寬八九丈至十丈餘尺不等底寬三丈平水面挑深九尺今擬挑寬深丈尺均屬減少若照劉河方價一律報銷設奉

部查亦難登答且現在七浦所估土方一十四萬一千六百三十九方有零若照劉河每方概給價銀二錢四分共該方價銀三萬三千九百餘兩劉河借贖餘銀既屬有限尙須撥挑泖澱諸河未便全請借挑七浦而此次覆估土方實係覈實摺節又難再行刪減卑職等再四思維悉心會議七浦河道本係業食佃力開挑因近年秋收歉薄民情拮据又係迫不可緩之工仰沐

恩準借

帑挑濬原不過稍補其不足並非應借之款且現估寬

重濬七浦河全案

卷一

七

深丈尺較劉河減少應請每方定以一錢六分造冊報銷以免窒礙所有現估土方一十四萬一千六百三十九方一分四釐按照每方價銀一錢六分共該銀二萬二千六百六十二兩二錢六分二釐奉

藩臺準領銀一萬五千兩內除應築大小各壩實需銀八百六十一兩六錢九分八釐外計領方價銀一萬四千一百三十八兩三錢二釐應挑土八萬八千三百六十四方三分九釐其餘土方五萬三千二百七十四方七分五釐計方價銀八千五百二十三兩九錢六分應請飭令民間均勻捐辦以昭公允仰懇

鴻恩俯將準領銀一萬五千兩照數轉詳請給以便於來年正月間築壩興工至原詳車水銀六百六十兩八錢應請查照挑濬劉河之案於土方銀內發給毋庸另行請領緣奉前因合將會同覆勘確切估計悉心妥議各緣由聯銜具詳並造具土方壩工銀數清冊繪具圖說呈送仰祈

藩臺俯賜鑒覈轉詳請給典挑深爲公便除詳

巡道外再卑職岱齡現奉雷蘇審案未回本任是以未經會印合並聲明

道光十四年十二月 日具詳

重濬七浦河全案

卷一

八

代理蘇州府知府周岱齡太倉州知州李正鼎爲再行札催事奉

藩臺札開奉

蘇撫部院林憲札內開照得太倉鎮洋境內劉河一

道前因淤塞奏蒙

恩准借項興挑業已如式挑竣驗收復經奏奉

上諭準將節省餘銀督飭所屬於上游各處淤淺河道擇要興挑太倉州七浦河道亦著一律疏通等因當經恭錄轉行欽遵去後嗣據太倉州詳送勘估七浦河道工段土方車壩銀數清冊繪圖貼說前來即經批司確

重濬七浦河全案

卷一

九

覈議詳並又札飭將劉河工段高寬丈尺土方夫工銀兩價值細數開具清單請

奏其上游各處淤淺河道并七浦河工亦即覆加勘估辦理在案迄今日久未據分別勘辦合再札司即速遵照前札迅即轉飭該州覈實樽節確估由司覆覈議詳一面將劉河工長高寬丈尺土方夫工銀兩價值細數開具清單刻日敘具簡詳請

奏所有太湖以下泖澱等河亦即遴委委員分別馳往趕緊確勘樽節估計擇要次第舉辦等因到司轉飭將劉河工程開單請

奏併將七浦河道會同周牧逐一確覈妥議先行通詳

一面乘時確勘樽節估計另造估冊詳辦等因到州奉此遵卽移準卑職岱齡到州會同卑職正鼎前詣該河查勘得七浦河一道東爲海口設有七浦閘一座閘門淤塞由閘而西上至沙溪鎮自沙溪鎮以東下至浮橋鎮三十餘里卑職等逐細勘丈自沙溪鎮東陶鴻升田頭處擬築西大壩起東至浮橋鎮迤東前屆老壩基擬築東大壩止實係年久淤塞應請挑濬量見工長五千六百二十八丈二尺內有浮橋鎮市河六十丈雖向由該處居民各照門面自行開挑

重濬七浦河全案

卷一

十

而是河業已久淤商賈不通且頻年歲歉居民大半遷移鋪戶亦多閉歇自應一併給價承挑樽節估計擬挑口寬五丈底寬二丈平水面濬深六尺其應挑土一十四萬一千六百三十九方一分四釐其壩外東至海口約八九百丈有零潮來普漫難以施工查七浦閘一座原設尾閘乘潮啟閉然離海較遠啟閉不能得力擬將現估東大壩培築寬大內爲清水河潦則啟壩宣洩旱則堵閉儲蓄潮汐不能濠入可無淤墊之患農田得以長資灌溉卑職等伏查是河向係業食佃力開挑而此次仰蒙

奏準借

帑挑濬係因頻年歲歉民力拮据原不過補其不足況現在七浦擬挑寬深丈尺既與劉河減少方價自應遞減且劉河借賸餘銀尙須撥挑泖澱諸河未便全請借挑七浦卑職等悉心會議應請每方給銀一錢按估土一十四萬一千六百三十九方一分四釐共需銀一萬四千一百六十三兩九錢一分四釐又應築大小各壩估銀八百六十一兩六錢九分八釐統共實需銀一萬五千二十五兩六錢一分二釐至應須屏水方價及一切委員薪水董事夫頭飯食等項

重濬七浦河全案

卷一

十一

悉由卑職等籌款給發毋庸開銷是否允協相應造具土方壩工各冊繪圖具文詳請伏祈  
藩臺鑒覈詳

奏一面卽賜發銀興濬深爲公便

道光十五年二月十日具詳

前署太倉直隸州知州周岱齡加知府銜太倉直隸州知州李正鼎呈今將卑職等覆勘估計七浦幹河實在應挑工段丈尺土方開造細冊呈送鈞覈須至冊者

計開

七浦河自沙溪鎮迤東三里陶鴻升田頭起至五十六段王廷田頭東大壩止共工長五千六百二十八丈二尺估計應挑土一十四萬一千六百三十九方一分四釐

重濬七浦河全案

卷一

三

第一段自陶鴻升田頭西大壩起至曹大森田頭止工長一百丈實挑土五百九十四方  
第二段接前至陳文岳田頭止工長一百丈實挑土一千二十三方  
第三段接前至王應宅角小榆樹止工長一百丈實挑土一千一百二十三方  
第四段接前至陸士千田頭止工長一百丈實挑土一千三百五十方  
第五段接前至邵三觀田頭止工長一百丈實挑土一千四百六十五方  
第六段接前至俞明九田頭止工長一百丈實挑土

一千八百八十五方

第七段接前至顧聖千田頭止工長一百丈實挑土

一千九百四十方

第八段接前至王正方田頭止工長一百丈實挑土

一千九百五方

第九段接前至周萬全田頭止工長一百丈實挑土

一千一百八十四方

第十段接前至周倉田頭止工長一百丈實挑土二

千四十三方

第十一段接前至方位田頭止工長一百丈實挑土

重濬一浦河全案

卷一

三

二千二百五十方  
第十二段接前至老開椿西橋腳止工長八十丈實挑土一千一十方四分  
第十三段接前至李三觀田頭止工長一百二十丈實挑土二千五百七十八方八分  
第十四段接前至楊五觀田頭止工長一百丈實挑土二千五百二十方  
第十五段接前至張寶觀田頭止工長一百丈實挑土二千七百五方  
第十六段接前至王介田頭止工長一百丈實挑土

二千八百五方

第十七段接前至盧瑞明田頭止工長一百丈實挑

土二千七百七十五方

第十八段接前至潘茂田頭止工長一百丈實挑土

二千八百十五方

第十九段接前至蔣建生田頭止工長一百丈實挑

土二千八百三十七方

第二十段接前至徐天生田頭止工長一百丈實挑

土二千八百六十方

第二十一段接前至徐狗觀田頭止工長一百丈實

重濬七浦河全案

卷一

十四

挑土二千七百二十七方

第二十二段接前至蘇姓田頭止工長一百丈實挑

土二千七百三十方

第二十三段接前至金漢田頭止工長一百丈實挑

土二千六百八十八方

第二十四段接前至沈荷觀田頭止工長一百丈實

挑土二千六百九十八方

第二十五段接前至王足觀田頭止工長一百丈實

挑土二千七百五十八方

第二十六段接前至陸順宅前楊樹止工長一百丈

實挑土二千五百方

第二十七段接前至陸友常田頭止工長一百丈實

挑土二千五百九十五方

第二十八段接前至陸小大田頭止工長一百丈實

挑土一千九百一十八方

第二十九段接前至虞方觀田頭止工長一百丈實

挑土二千六百三十九方

第三十段接前至沈萬田頭止工長一百丈實挑土

二千五百九十五方

第三十一段接前至張三觀田頭止工長一百丈實

重濬七浦河全案

卷一

十五

挑土二千七百七十一方

第三十二段接前至施元田頭止工長一百丈實挑

土二千七百十方

第三十三段接前至沈三觀田頭止工長一百丈實

挑土二千八百十五方

第三十四段接前至廟和尚田頭止工長一百丈實

挑土二千八百二十六方

第三十五段接前至陶心田頭止工長一百丈實挑

土二千八百二十方

第三十六段接前至周壽觀田頭止工長一百丈實

挑土二千六百二十二方

第三十七段接前至顧春觀田頭止工長一百丈實

挑土二千五百四十方

第三十八段接前至顧足觀田頭止工長一百丈實

挑土二千七百六十方

第三十九段接前至顧憲田頭止工長一百丈實挑

土二千七百三十六方

第四十段接前至姚婁觀田頭止工長一百丈實挑

土二千七百二十四方

第四十一段接前至朱富洪田頭止工長一百丈實

重濬七浦河全案

卷一

六

挑土二千七百六十方

第四十二段接前至朱惠嘉田頭止工長一百丈實

挑土二千八百方

第四十三段接前至陸增田頭止工長一百丈實挑

土二千七百八十四方

第四十四段接前至吳壽觀田頭止工長一百丈實

挑土一千七百七十方

第四十五段接前至吳開元田頭止工長一百丈實

挑土二千四百七十八方

第四十六段接前至羨塚田頭止工長一百丈實挑

土二千四百五十方

第四十七段接前至潘家後門止工長一百五十丈

實挑土四千四十二方五分

第四十八段接前至陸家東牆角止市河六十丈實

挑土一千四百九十一方

第四十九段接前至許宗觀田頭止工長一百丈實

挑土二千九百五十方

第五十段接前至東闌尖止工長九十八丈二尺實

挑土三千三十九方五分又闌身挑土一百八十

二方五分四釐

重濬七浦河全案

卷一

七

第五十一段接前至尹朱氏田頭止工長一百丈實

挑土三千二百二十六方

第五十二段接前至張才田頭止工長一百丈實挑

土三千二百六十方

第五十三段接前至顧明田頭止工長一百丈實挑

土三千一百四十五方

第五十四段接前至季則田頭止工長一百丈實挑

土三千四百三十二方

第五十五段接前至高仁田頭止工長一百丈實挑

土三千一百九十二方

第五十六段接前至王廷田頭止工長一百二十丈  
實挑土三千八百六十六方四分

道光十年 月 日具詳

前署太倉直隸州知州周岱齡加知府銜太倉直隸  
州知州李正鼎呈今將勘估七浦幹河應築大小木  
土各壩實需工料銀兩開冊呈送

鈞覈須至冊者

計開

西大壩一座長一十二丈高一丈二尺底寬三丈五

尺面寬二丈五尺牽寬三丈

共估料工銀一百二十六兩六錢七分

白米涇壩一座長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬

八尺牽寬一丈

共估料工銀一十四兩五錢九分五釐

潮頭港壩一座長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬

八尺牽寬一丈

共估料工銀一十四兩五錢九分五釐

新涇塘壩一座長四丈高八尺底寬一丈七尺面寬

一丈三尺牽寬一丈五尺

共估料工銀二十兩八錢四分

北糜場壩一條長五丈五尺高一丈底寬二丈四尺

面寬一丈六丈牽寬二丈

共估料工銀三十三兩三錢三分

南花婆壩一條長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬八尺牽寬一丈

共估料工銀一十四兩五錢九分五釐

北八尺壩一座長四丈五尺高八尺底寬一丈七尺

面寬一丈三尺牽寬一丈五尺

共估料工銀二十三兩一錢八分

南八尺壩一座長四丈五尺高八尺底寬一丈七尺

面寬一丈三尺牽寬一丈五尺

共估料工銀二十三兩一錢八分

北六尺壩一座長五丈五尺高一丈底寬二丈四尺

面寬一丈六尺牽寬二丈

共估料工銀三十三兩三錢三分

南六尺壩一座長五丈高八尺底寬二丈四尺面寬一丈六尺牽寬二丈

共估料工銀二十八兩四錢

北轉河壩一座長四丈高八尺底寬一丈七尺面寬一丈三尺牽寬一丈五尺

共估料工銀二十兩八錢四分

南轉河壩一座長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬八尺牽寬一丈

共估料工銀一十四兩五錢九分五釐

宋家港壩一座長六丈高一丈一尺底寬三丈面寬二丈二尺牽寬二丈六尺

共估料工銀六十二兩一錢一分

北石孔涇木壩一座 南石孔涇木壩一座 北蝦

蟆涇木壩一座 南蝦蟆涇木壩一座

以上木壩每座長三丈高九尺底寬一丈二尺面寬八尺牽寬一丈

共估料工銀五十八兩三錢八分

東大壩一座係禦潮要壩長十六丈高一丈四尺底寬四丈五尺面寬三丈五尺牽寬四丈

共估料工銀三百一十四兩九分

南橫瀝長二丈 楊家浜長一丈五尺 俞漕長二丈 坦潭口長二丈 泥涇長二丈 石頭塘長三丈 桑樹浜長三丈 南吳淞長二丈 楊水漕長二丈 南糜場長三丈 南羊漕長二丈 南楊漕長二丈 水漕口長二丈 長浦涇長二丈 西楊涇長二丈 張家涇長二丈 戴浦長二丈 貫涇長二丈 馬沙口長二丈 渡船口長一丈五尺 張浦長二丈 草子口長二丈 福蒲塘長三丈

重濬七浦河全案

卷一

三

重濬七浦河全案

卷一

三

上方堰長一丈 長涇長二丈 王家堰長二丈

以上土壩二十六條共頂長五十四丈底長二十七

丈牽長四十丈五尺各底寬一丈六尺頂寬一丈

高七尺共計壩土三百六十八方五分五釐每方

銀八分該銀二十九兩四錢八分四釐又銷壩土

三百六十八方五分五釐該銀二十九兩四錢八

分四釐

共銷築壩土銀五十八兩九錢六分八釐

通共大小土木各壩共計四十四座共估料工銀八

百六十一兩六錢九分八釐

重濬七浦河全案 卷一

道光十一年 月 日具詳

三

代理蘇州府知府周岱齡太倉州知州李正鼎呈今  
將挑辦七浦幹河籌議章程造冊呈候

鈞覈須至冊者

計開

一應挑通工土方原估一十四萬一千六百三十九方

一分四釐查是河向本業食佃力開挑茲因頻年歲

歉民力不無拮据仰蒙

各大憲

奏準借

帑興挑原屬補其不足且現在估挑寬深丈尺較之劉

重濬七浦河全案 卷一

河減少每方酌給錢一百文分次給發開工之先發

給五分數工有六分再發三分數餘俟工將竣找清

其應給工價仍照劉河定章每錢一千改發洋錢一

元以免攙和小錢及短串尅扣之弊

一此次應雇人夫仍照舊章就境轄田畝多寡分別水

方挑土數目按田驗派每夫派土八方分段承挑

一每日每夫擬以挑土八分限十日竣事俾免玩延其

各段工程務照估挑面寬五丈底寬二丈挑深六尺

如式挑竣不許偷減分寸惟所定限內如實在趕挑

不及或遇陰雨再量為展寬以期工歸實在

三

一挑辦工程仍照劉河之案僉總董六人總司一切州工散董二十二人縣工散董十七人按工段之多寡分派稽查再於各鄉都圖選舉鄉董管轄夫頭復令舉報夫頭專管挑夫所有應給方價由總董具領分給散董轉給鄉董眼同夫頭按名散給仍遞取領狀由總董彙齊送官不許圩保書役涉手以免滋弊至於夫數短少則責夫頭工有不足則責挑夫其挑夫責令夫頭雇募精壯之人赴工不得以老弱充數如有人夫不足及偷減草率均由各董事逐層稽察隨時稟請委員分別覈辦

重濬七浦河全案

卷一

五

一通工河底開工之日先於河心正中開挖水溝一道工頭直達工尾既可收束滲水亦便挑工嗣後面土挑深一尺此溝亦隨挖深一尺如遇天雨水積不特毋害挑工而河底之平寬尺寸先可查驗再照原估寬深丈尺挑濬樣河數段以爲成式而杜貼坡墊崖肥肥臃肚等弊其不應開之灘岸不得鏟除寸土削草見新違者重究

一挑河出土之處最爲緊要定以遠離新口十丈堆貯插立旂竿爲誌如有零落拋灑卽隨時收拾淨盡不許圖便任意傾倒違者重處

一應挑工段界址州縣分定築壩後多設高脚牌豎立工次牌面註明州縣承挑工段再按工之長短劃分段落寫明每段工長若干丈應挑深寬若干丈尺由何處出土用夫若干名城董何人鄉董何人夫頭鄉保圩長姓名以便稽查

一原估挑深丈尺除立有信椿外仍於兩岸新口椿內築設樣墩蓋用灰印覆以瓦盆並將兩岸空高水面若干量準尺寸標立鐵牌以備查驗而杜弊竇

一通工壩座毋論大小均關緊要築竣後除嚴飭地保加謹看守不許稍有疏虞外並責令工員一體稽察

重濬七浦河全案

卷一

五

防護起除各壩時仍應酌量壩脚土之多寡先於壩旁加挖深潭俟驗收後將壩脚積土鏟削入潭不致有礙行舟

一各挑夫赴工若不定以時刻必致先後參差難於查察今仍照舊章定以每日黎明鳴鑼一次卯初齊集下塘工作如有缺少押令補足外並將夫頭柳示河工以做其餘至該挑夫如敢卯初不到未暮先停工員卽行查處

一州縣通工應請飭委鎮洋縣縣丞楊紹恭卑州七浦司巡檢田豐年鎮洋縣甘草司巡檢曾浩常川在工

稽查彈壓仍照劉河之案每日每員酌給洋錢二元以資薪水卑州吏目郭瀛鎮洋縣典史張得昌各有監獄之責應請飭令該二員各間一日輪流到工各照州縣工段稽察督催其薪水亦間日給以洋錢二元以示公允

一原估土方每方給銀一錢除夫價照銀數給錢外其河內通工積水應雇夫車馬所有戽水工價並委員薪水及應用工廠牌木號竹旂布等物并各衙門書役紙張辛工及管段家人飯食等項并一切零星雜用應請仍照劉河成案俱在盈餘項下支給

重濬七浦河全案

卷一

三

一挑土人夫有離工較遠之人均應在工就近住宿方可晝作夜息誠恐附近居民奇房價今擬自開工日起至工竣日止每夫房錢不得過六十文出示曉諭兩岸居民遵照如有多索賃值畱難不租者查出重處

以上各條儻有應行變通之處請由卑職等隨時酌辦

代理蘇州府知府周岱齡太倉州知州李正鼎爲道批詳請事奉

藩臺批卑職等詳送覆估七浦河道土方壩工清册緣由奉批查挑濬七浦河道請借劉河案內餘贖銀兩係應詳請

奏明辦理之件未便草率前經明晰札飭確覈妥議先行通詳察辦在案茲據詳稱估計土方每方銀一錢六分既與劉河案內估計土方數目不符又所稱共需銀二萬二千餘兩請給銀一萬五千兩其餘八千餘兩飭令民捐一事兩辦斷難詳請具

重濬七浦河全案

卷一

七

奏仰即遵照前札指飭逐一確覈估計另行妥議通詳以憑覈辦毋遲干咎仍候

巡道批示繳册圖並發又奉

巡道批開仰候移請  
藩司覈辦並候批示繳册圖存等因到州奉此遵查卑職等前次會詳請給方價及築壩銀一萬五千兩之外其餘八千餘兩飭令民捐係因限於准領銀數起見既奉

藩臺批飭一事兩辦斷難詳請具

奏自應概給方價毋庸飭令民捐以歸劃一惟是應挑
