



荊江分洪工程 的偉大勝利

中南人民出版社

荆江分洪工程的偉大勝利

中南人民出版社

一九五二年 • 漢口

書號：(中)0681

荊江分洪工程的偉大勝利

編輯兼出版者：中南人民出版社
(漢口黃興路21號)

發行者：新華書店中南總分店

印刷者：復興印書館
(漢口華商街49號)

1—10,000

一九五二年九月初版

定價(甲2)4,500元

為廣大人民的利益

爭取荆江分洪工程

的勝利！

毛澤東

要保江湖都
对人民有利

周昌来


荊江分洪工程落成紀念

荊江分洪工程大設計施工近代化
南堤腰斬黃天湖虎河脩起欄河壩
兩岸人民免災害萬頃沙田變沃野
節制江水往南流瀟湖年長好莊稼
如今荆堤無顧慮物資交流保正常
荆江分洪工告竣贏得時間策周詳
卅萬大軍同勞動艱巨工程來擔當
施工不到三個月創此奇績異名揚
自從出了毛主席革命成名震四方
人民比對今和昔永遠追隨共產黨
北開長逾千公尺蓄洪可達六十億
洞庭四水如暴漲洞庭之水浪滄滄
從此荆堤不潰垮隨時可把開門下
萬噸輪船可通航尚待專家細商量
這對國家大建設關係重大意深長
熱情技術相結合又有專家好主張
中國人民長建設勤勞勇敢素堅強
現在功成未建設前途偉大更無量
紀念分洪新勝利主席英明永不忘

公曆一九五二年七月

鄧子恢題並書

景全閘進洪口平水

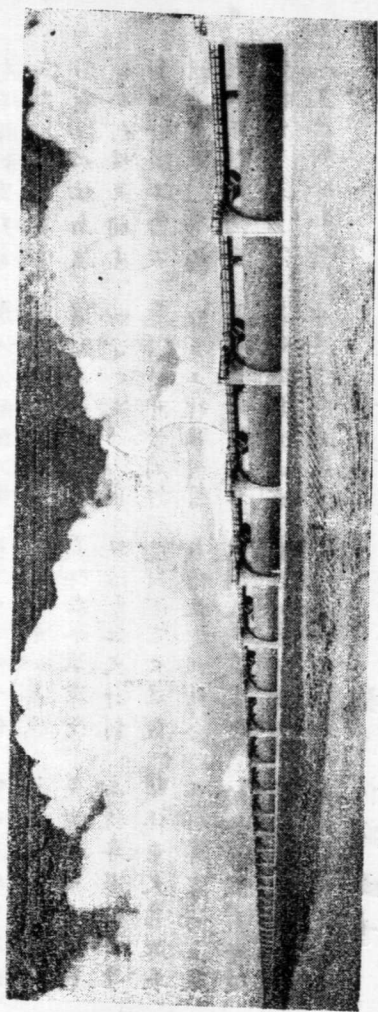

目 錄

毛主席題字

周總理題字

鄧副主席題字

太平口進洪閘全景（插圖）

中央人民政府政務院關於荊江分洪工程的規定……………（一）

中南軍政委員會關於荊江分洪工程的決定……………（四）

荊江分洪工程提前竣工基本經驗總結報告……………（八）

荊江分洪工程驗收報告……………荊江分洪總指揮部總指揮唐天際（三）

慶祝荊江分洪工程預定計劃的完工……………荊江分洪委員會主任委員李先念（五）
荊江分洪工程提早完成的關鍵……………荊江分洪總指揮部總指揮唐天際（五）

荆江分洪工程的勝利，是偉大的毛澤東思想的勝利……

荆江分洪總指揮部副總政委袁振（美）

提前完成荆江分洪工程任務的主要經驗是甚麼……

荆江分洪總指揮部副總指揮許子威（六四）

向布可夫同志學習，努力提高思想水平和技術水平……

荆江分洪總指揮部副總指揮林一山（七三）

在荆江分洪工程中是如何發動羣衆提高工作效率的……

荆江分洪總指揮部政治部主任白文華（八四）

在荆江分洪工程中的人民解放軍……

荆江分洪總指揮部參謀長藍脩（九二）

廣大農民在荆江分洪工程中的重大作用和收穫……

荆江分洪總指揮部政治部副主任須浩風（九六）

慶祝荆江分洪偉大工程勝利完工……

「長江日報」社論（一〇四）

荆江分洪工程介紹……

「長江日報」（二二）

荆江分洪工程示意圖……

（二六）

荆江地區略圖……

（二七）

中央人民政府政務院

關於荊江分洪工程的規定

長江中游荊江段由於河道狹窄淤墊，下游彎曲，不能承洩大量洪水，且堤身高出地面十數公尺，每當汛期，洪峯逼臨，險工迭出，時有潰決的危險。如一旦潰決，不僅江漢廣大平原遭受淹沒，並將影響長江通航，且在短期內難以堵口善後。不決，則以長江水位抬高，由四口（松滋、太平、藕池、調弦）注入洞庭湖的水量勢必增多，濱湖多數堤垸必遭潰決。為保障兩湖千百萬人民生命財產的安全起見，在長江治本工程未完成以前，加固荊江大堤並在南岸開闢分洪區乃是當前急迫需要的措施。

荊江分洪工程完成以後，如長江發生異常洪水需要分洪時，既可減輕洪水對荊江大堤的威脅，並可減少四口注入洞庭湖的洪量；同時，做好分洪區工程又能保障濱湖區不因分洪而受危害。這一措施對湖北、湖南人民都是有利的。為此，本院特作下列

規定：

(一) 一九五二年仍以鞏固荊江大堤爲重點，必須大力加強，保證不致潰決，其所需經費可酌予增加。具體施工計劃及預算由長江水利委員會會同湖北省人民政府擬訂，限期完成。

(二) 一九五二年汛前應保證完成南岸分洪區圍堤及節制閘、進洪閘等工程，並切實加強工程質量。其所需人力，應由湖北、湖南和部隊分別負擔。

(三) 一九五二年不擬分洪。如萬一長江發生異常洪水威脅荊江大堤的最後安全，在荊江分洪工程業已完成的條件下，可以考慮分洪，但必須由中南軍政委員會報請政務院批准。

(四) 湖北省分洪區移民工作應於汛前完成。

(五) 關於長江北岸的蓄洪問題，應即組織勘察測量工作，並與其他治本計劃加以比較研究後再行確定。

(六) 爲勝利完成一九五二年荊江分洪各主要工程，應由中南軍政委員會負責組成一強有力的荊江分洪委員會和分洪工程指揮機構，由長江水利委員會、湖南、湖北兩省人民政府及參加工程的部隊派人參加，並由中南軍政委員會指派得力幹部任正副主任。工程指揮機構的行政與技術人員由各有關單位調配。

上述各項工程，因時間緊迫必須抓緊時機進行週密的準備工作，並保證按期完

成。至於人力、器材、運輸及技術等方面，如中南力量不足時，得提出具體計劃，速報請政務院予以解決。

一九五二年三月三十一日

中南軍政委員會關於荊江分洪工程的決定

查荊江大堤的安危，不僅關係湖北、湖南兩省，而且是長江交通要道，關係全國經濟體系。但荊江大堤却是長江全線最薄弱最危險地帶，堤身高出地面十數公尺，堤防險工迭出，每當汛期，洪峯逼臨，時有潰決之虞，如一旦潰決，將使江漢平原變成大海，不僅江漢三百萬人民七百萬畝良田被淹沒，並要影響長江通航，貽禍將不堪設想。且在短時期內又難以善其後，為適當減除荊江大堤的危險，確保長江航運暢通，並保障兩湖人民生命財產的安全起見，除荊江大堤本身加固外，荊江分洪工程是目前十分必要的迫切措施。

長江水利委員會在去年提出此一計劃，業經中央水利部研究，提請政務院作出決定，本會三月四日召集湖南、湖北兩省負責同志及本會水利、農林、交通各有關部門負責人商討，一致同意荊江分洪的計劃，認為此一計劃的方針是照顧了全局，兼顧了兩省，對兩湖人民都是有利的，並經中南軍政委員會第七十四次行政會議通過作出如下決定：

一、荊江大堤繼續培修加固，保證安全渡過洪峯到達一九四九年的水位。

二、荊江南岸蓄洪區堤工及南面節制閘立即動工，必須於六月底前完成，北面邊洪閘爭取同時動工，汛前完成。

三、蓄洪區移民事宜由湖北省人民政府於汛前完成。

四、一九五二年不擬分洪。如萬一今年水量過大，萬不得已需要分洪時，須經本會報請政務院周總理批准後方能執行。

五、長江北岸蓄洪問題，應積極進行勘察，俟勘察完畢，作研究後再行確定。

六、這一工程所需人力、物力非常浩大，而時間又甚短促，為勝利完成此一艱巨的政治任務，指定：

(1) 分洪工程以軍工為主，南線堤工由軍工擔任，虎渡河西岸山地工程由湖北動員民工擔任，南面節制閘由湖南動員民工二萬人，湖北動員民工一萬人擔任，××兵團部全部調任分洪總指揮部工作。

(2) 湖北省荊州及湖南省常德兩專區全部軍政機關力量，聽候總指揮部調動，負責供應工作。

(3) 中南水利部、長江水利委員會須將全力投入此一工程。

(4) 荊江大堤培修加固由中游局負責。

(5) 運輸任務由交通部負責。

(6) 物資及日用品之調撥供應由財委系統各部門負責。

(7) 工人及幹部的調配、宣傳、教育、醫藥衛生、保衛工作、勞動改造隊的調配管理，及施工區司法工作等由中南勞動部、人事部、文化部、教育部、衛生部、公安部及最高人民法院中南分院等部門分擔，并須指定專人負責進行。

七、成立荊江分洪委員會，以李先念爲主任委員，唐天際、劉斐爲副主任委員，鄭紹文爲秘書長，黃克誠、程潛、趙毅敏、趙爾陸、潘正道、齊仲桓、張廣才、李毅之、林一山、許子威、王樹聲、袁振、徐覺非、鄭紹文、劉惠農、田維揚、李一清、劉子厚、張執一、任士舜等爲委員，以統一事權，集中力量。

成立荊江分洪工程總指揮部。以唐天際爲總指揮，王樹聲、林一山、許子威爲副總指揮，李先念爲總政委，袁振爲副總政委。

成立南線工程指揮部。以許子威爲第一指揮，田維揚爲第二指揮，李毅之、徐覺非、任士舜爲副指揮。

成立北關工程指揮部。以張廣才爲指揮，閻鈞爲副指揮。

八、荊江分洪委員會及其指揮機構有權逕與各方面商洽與決定一切有關分洪工程事宜；并有權調撥有關分洪工程進行的人力、物力；在工程上所需器材，加工定貨，物資運輸等均須享受優先權。各有關部門，必須大力支持，不得藉故推延。有關地區各級人民政府必須聽候調度，接受指定任務，協力完成。

九、其在人力、器材及技術等各方面，凡中南力量不足者，荆江分洪委員會應
揮部應迅速提出具體計劃，請求政務院幫助解決。

主席 林 彪

一九五二年三月十五日

荊江分洪工程提前竣工基本經驗總結報告

荊江分洪總指揮部
總指揮

唐天際

(一) 概況

我們荊江分洪工程，在毛主席、中央人民政府政務院、中南軍政委員會、荊江分洪委員會的領導下，在全國人民特別是武漢市及荊江兩岸人民和兩湖人民的熱烈支援下，三十萬工人、農民、部隊、工程技術人員、醫務、政治、行政人員及幹部的積極努力下，文藝工作者、新聞通訊工作者及其他人員的配合下，發揚了高度的愛國主義與革命英雄主義精神，戰勝了困難，按照中南軍政委員會批准之原訂三個月計劃，自四月五日全面開工，到六月二十日止，提前十五天完成了任務。

整個工程的施工大致分為以下幾個階段：

四月五日以前，主要是建立組織機構，進行初步動員，和解決生活供應，爭取迅速開工。三月下旬，由於大批工人、民工到達工地，各部即迅速抽調大批幹部，組成
