

治淮文刊

第五輯

水利部治淮委員會編印

治淮方案

第五輯

水利部治淮委員會編印

15(1) 31

8·11

治淮案例

第五輯 (一九五五年) 1~2000

編輯者 水利部治淮委員會
治淮刊物編審委員會

出版者 水利部治淮委員會辦公廳
(蚌埠三馬路)

印刷者 蚌埠市人民印刷廠

內部刊物 注意保存

前 言

1955年治淮工程，是在对淮河进一步认识的基础上进行的。因为1954年淮河发生了特大洪水，这次洪水不但是考验了我们所做的工程，更重要的是提高了认识，吸取了前期工程的经验证训。我们有那些新的认识，吸取了那些经验证训呢？

第一、一个大河流的治理，大工程的兴建，在水文上必须考虑到可能的情况。水文工作的错误，必然造成一系列的错误。以前在计算水文时，不但是计算上有缺点，特别是在思想上有毛病。思想上的毛病表现在两个方面：一是保守思想。它表现在只计算近期已发生的几次洪水，没有考虑和研究历史上发生过的，更没有考虑和分析今后可能发生的更大的洪水。二是对近期已经发生的洪水也有表示怀疑的，并错误地认为水文算大了就要增加很多工程等有害的思想。因为有这种思想指导，也就不可能考虑历史上的特大洪水和今后可能发生的情况了。1954年的洪水教育了我们，不但对历史上的水文资料进行了分析，那怕是农民的口头记忆，也注意了搜集和研究分析，并且进一步研究了频率，也就是说对一切可能的情况都进行了分析研究。这是我们接受的第一个经验证训。

第二、治好淮河不是一朝一夕的事。1952年的治淮会议，检查和批判了重防洪轻除涝的思想。1953年的治淮会议，不但检查批判了单纯防洪的片面性，还批判了三、五年治好淮河的急躁情绪，并提出防洪除涝防旱结合进行。1954年的洪水，更使我们进一步认识了治理淮河的复杂性和严重性，因而重视和加强了流域规划的编制工作。1955年底流域规划基本上完成，更证明淮河不是一朝一夕能治理好的。不重视流域规划，认为做了几个工程就可以治好淮河，是必然要碰壁的。

第三、大河流的第一期工程应稳妥地安排，才能争取全部治理过程的主动。因为一个大河流的治好，不是短期内能完成的，因此，治理的程序应该全面安排，那些先做，那些后做。关键性的工程一般地应放在第一期工程内，就是不放在第一期工程，至少要考虑到近期工程或者是说第一期工程和长远的打算不发生矛盾。1954年以前的工程有些是安排得很好，有些是安排得有缺点；凡是有缺点的都产生了以后工程上的被动局面。这是第三个经验证训。

第四、规划设计的标准，应根据效益的大小和损失轻重来确定。凡是工程效益大的，应考虑标准要高，要安全；安全问题，应充分地考虑。原淮河大堤只有3公尺左右的顶宽，按照理论计算，是够安全的，但是考虑可能发生的风浪等条件，就显然是不够了；尤其是在恶劣的气候条件下，就根本谈不到安全。又如水库，不安全就可能发生严重的伤亡和损失。这些工程，有的保护面积大，经济效益大，但如遭受破坏，就有大面积的灾害。这些主要工程，就是一次达不到标准，但也要考虑分期达到。

第五、有的工程施工质量不好，对工程管理工作重视不够，都给我们很多的教训。

吸取了这些经验证训，对淮河的认识提高了，因此，1955年的工程，可以看出以

下的几个基本特点：


第一、1955年的工程是在流域规划方案基本肯定的基础上进行的。也就是治淮的方向和目标进一步明确了。因为经过几年的摸索过程，又经过洪水的考验，找着了根治淮河的方向和办法。因此，是在全面地安排整个治淮工程的要求下进行当年工程的安排的，尤其是目前举办的工程，凡与以后工程矛盾太多的，都经过周密的考虑，设计条件不成熟的，绝不盲目地、仓促地进行设计。在设计中，同时考虑了综合利用的要求，凡和以后综合利用矛盾多的，设计上也采取了慎重的态度；凡防洪除涝能和航运、灌溉等结合的，都尽量考虑进去。这样做，就基本上争取了工作的主动性。这是第一个特点。

第二、展开了全面了解淮河各方面情况的工作。从洪水特性、流量情况、历史上的水旱灾害情况，直到水文地质情况、土壤情况以及经济情况、气象情况等，都进行了全面的、系统的工作。这些工作，都是帮助我们进一步认识淮河、治理淮河所不可缺少的。这是第二个特点。

第三、施工方面，在已取得计划施工的經驗基础上，陆续提高了施工的计划管理水平。如梅山水庫的工效就比佛子岭水库生产改革以后的水平提高一倍以上。1955年的梅山水庫大坝工程，若按佛子岭水库（1953年底水平）定额计算，则需混凝土工、木工、钢筋工157万工日，而梅山实际只用73万工日，效率提高一倍以上。实践证明，不但计划管理的水平提高了，工程质量也提高了。过去土方工程多以行硪几遍作为质量标准，今年是以干么重作为质量标准，不只是检验质量的方法改变了，特别是质量提高了。这是第三个特点。

第四、工程管理工作是当作三大中心之一提出来的，并且提出由点线的管理，逐步推广到面的管理。制订了一系列的办法、规范、通则等。这不仅是重视了工程管理工作，而且初步地打下了工程管理工作的基础。

总之，1955年治淮工程已进入了新的阶段。它吸取了过去的經驗教训，在新的认识基础上，布置了工作，并完成了这些工作。

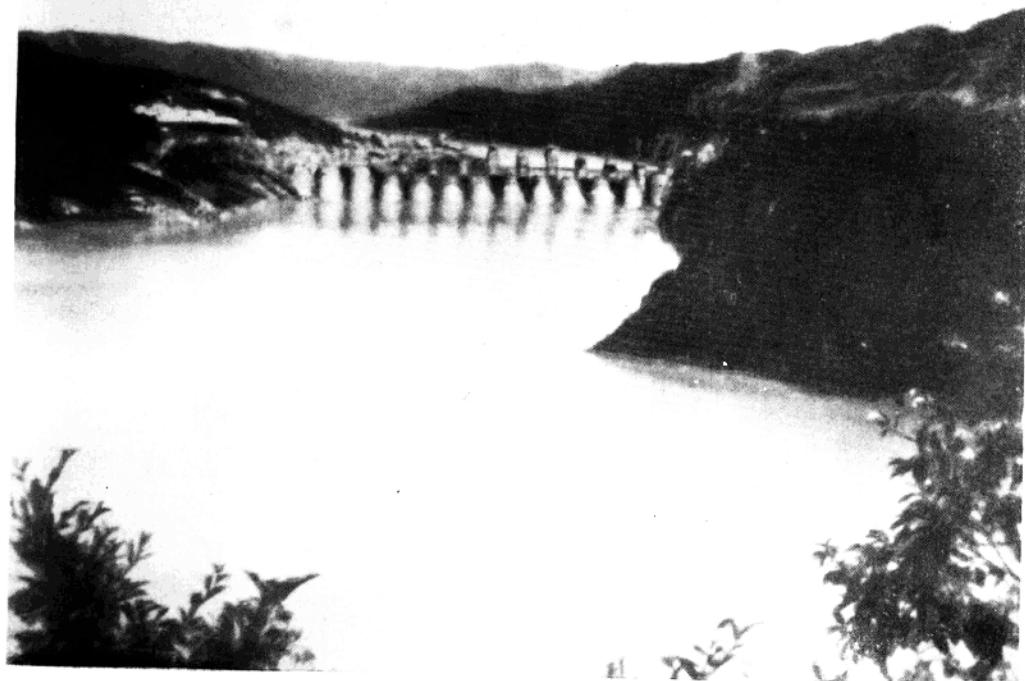


梅山水庫工程自1954年开工，連拱壩已按期于
今年汛前澆筑到攔洪高程(110公尺)，開始攔洪。





南灣水庫拦河坝施工情形



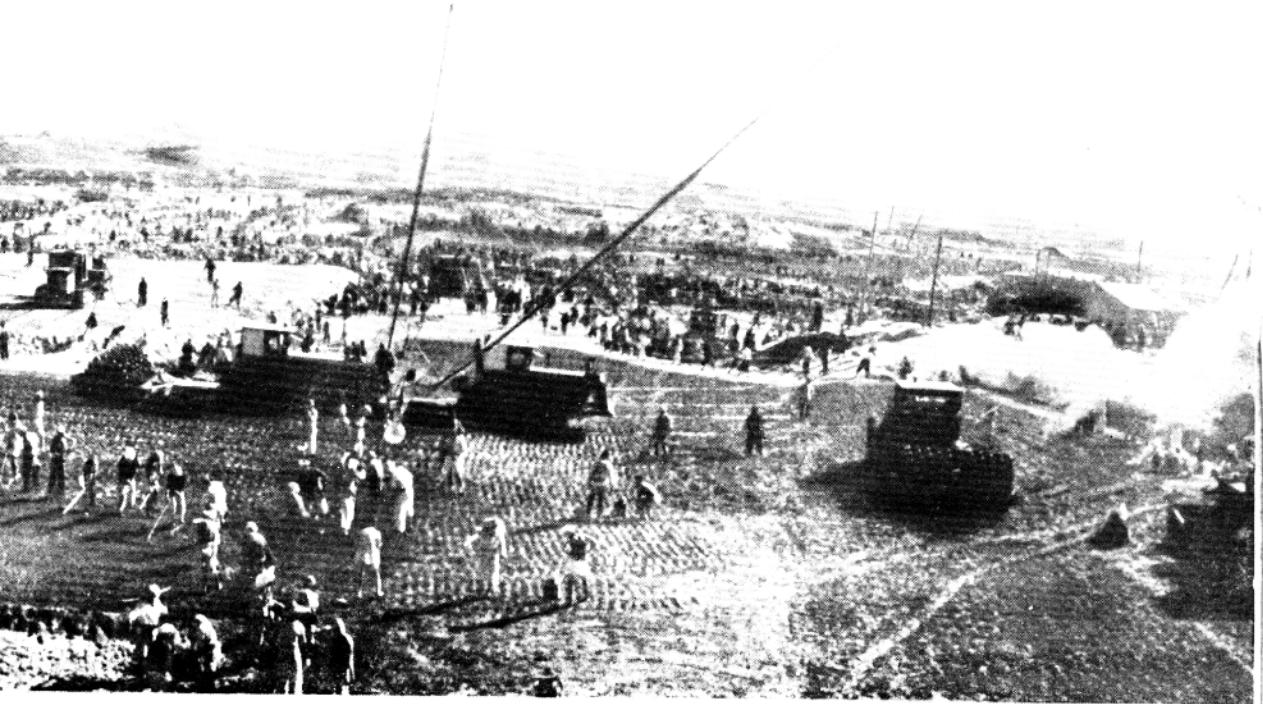


南澗水庫建成后開始拦蓄洪水

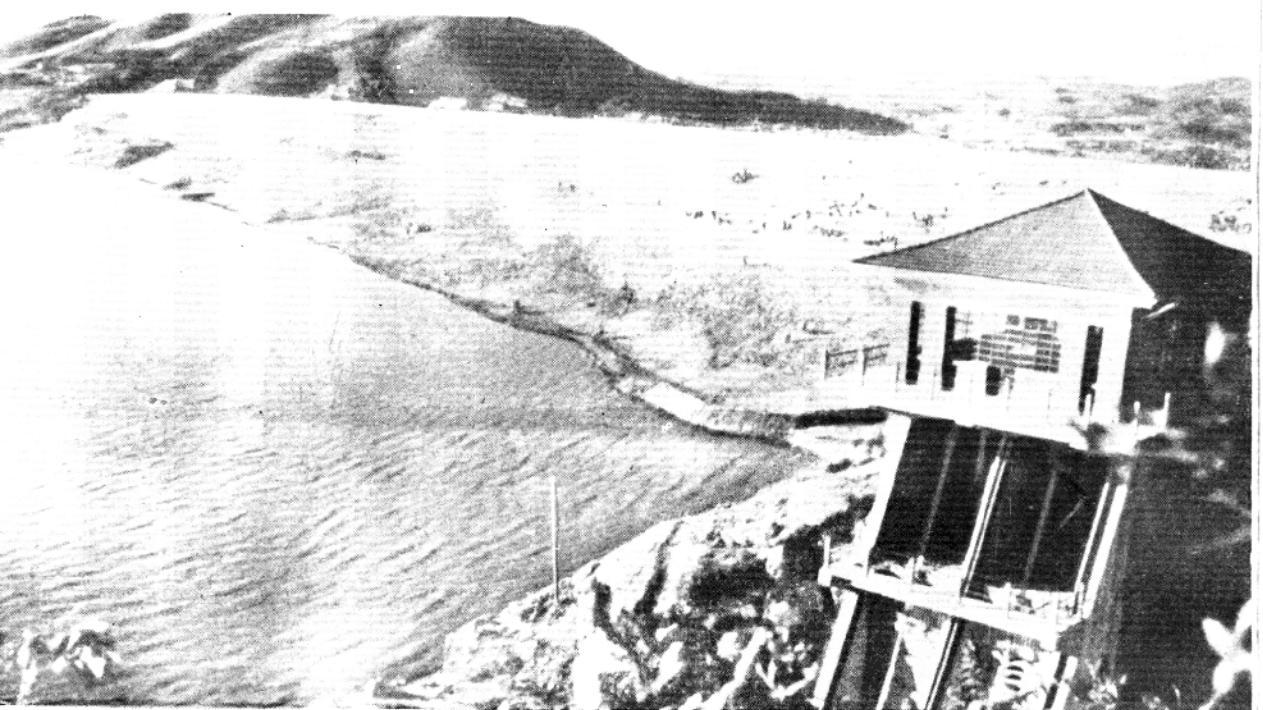


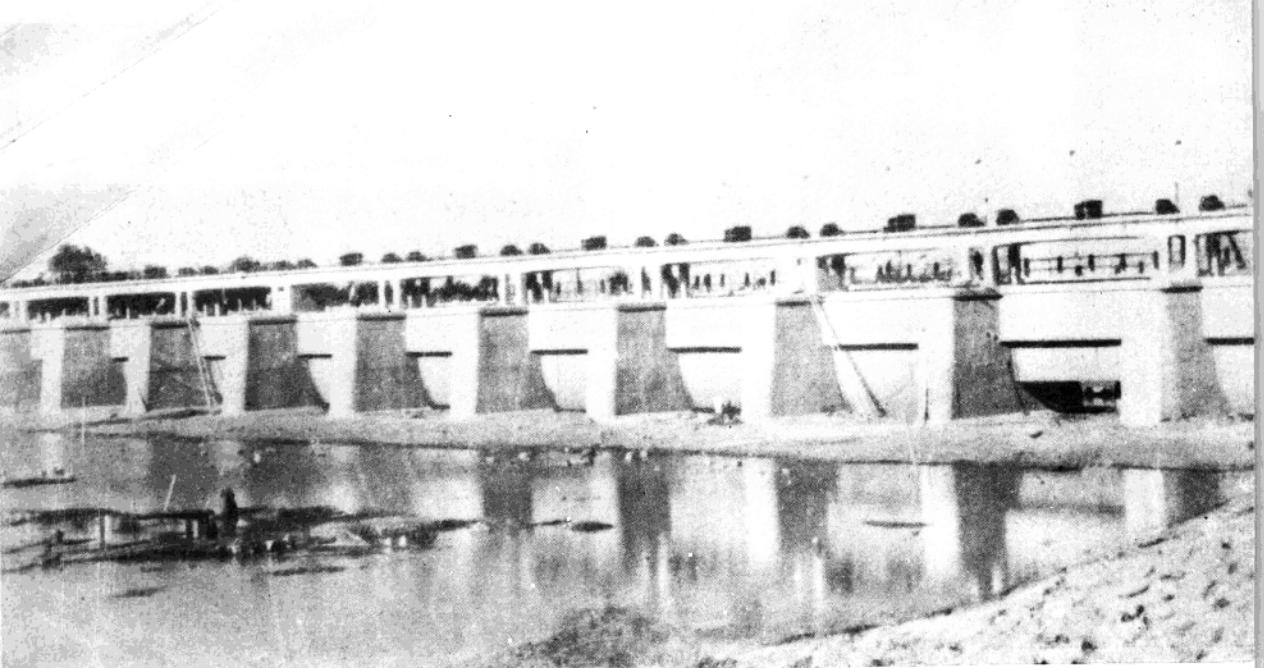


泥河洼蓄洪工程沙河馬灣進水閘

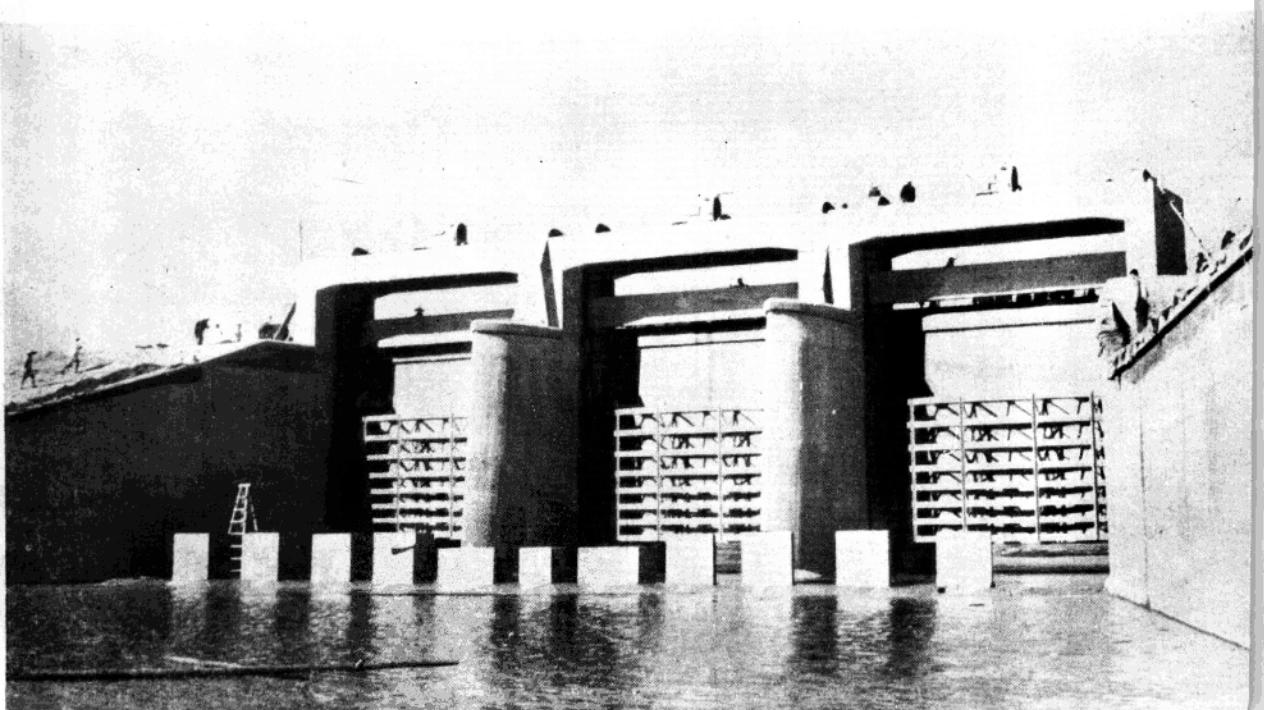


泥河洼蓄洪工程沙河紙房退水閘

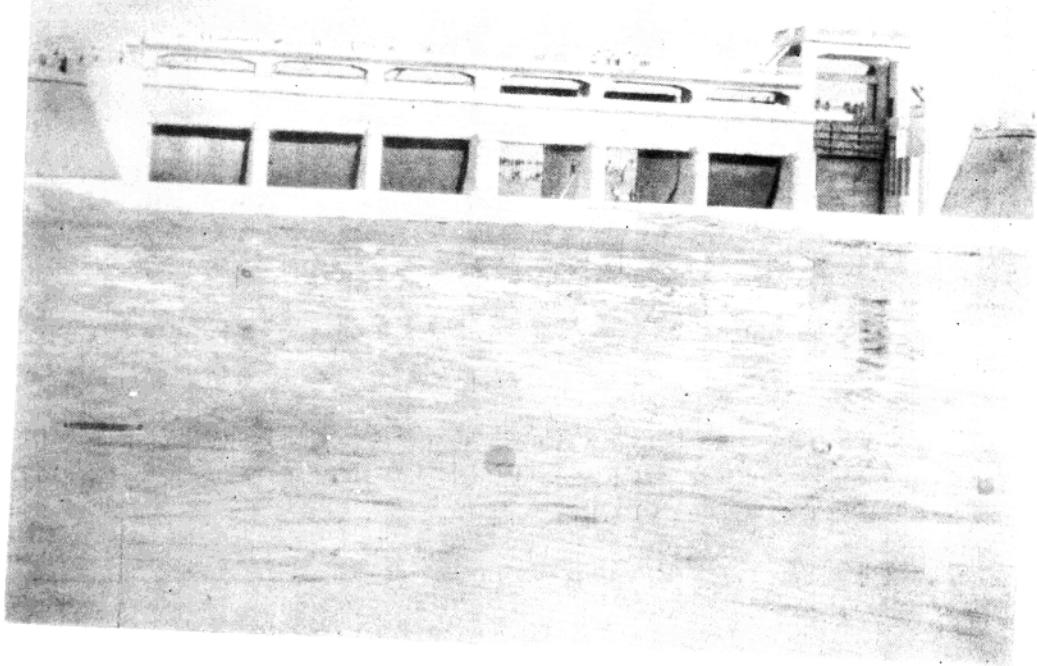

三 仓 河 擋 潮 閘

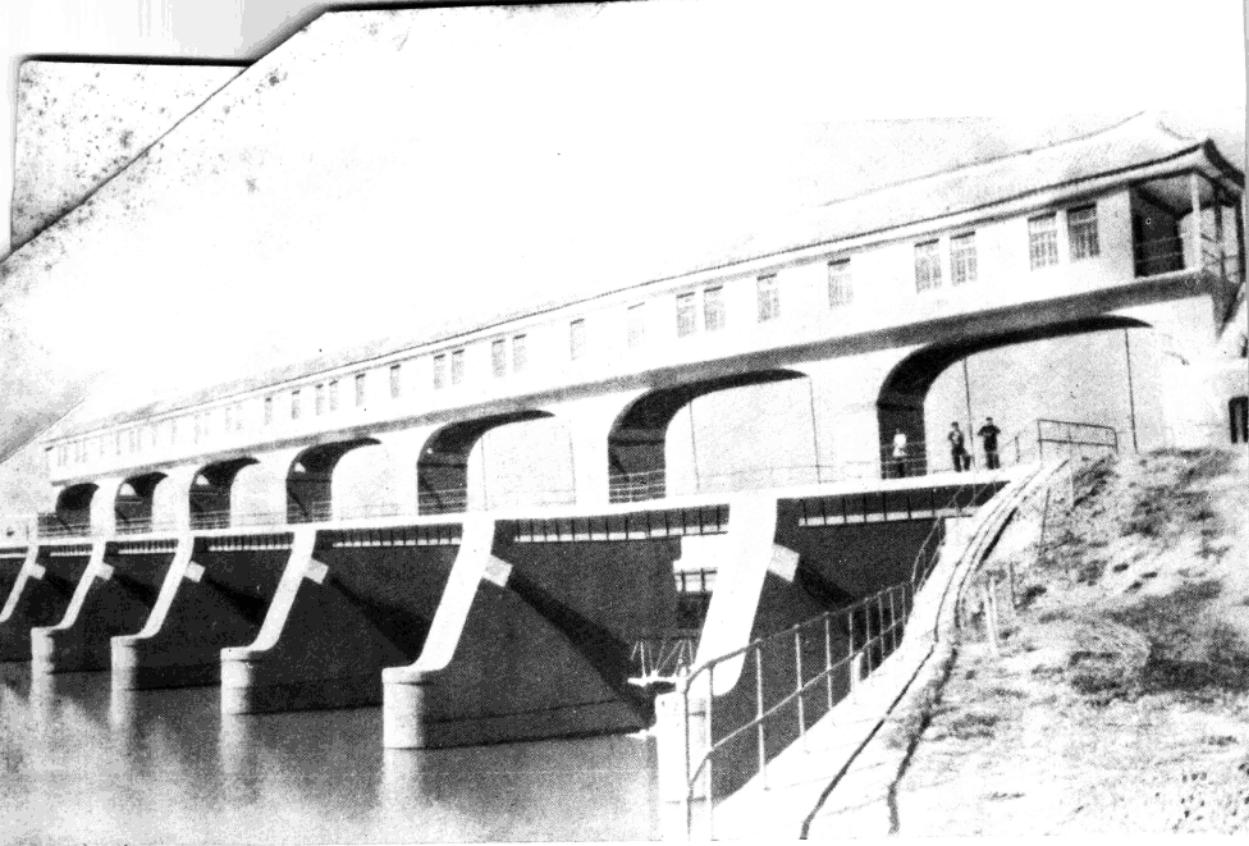


江分口风闸

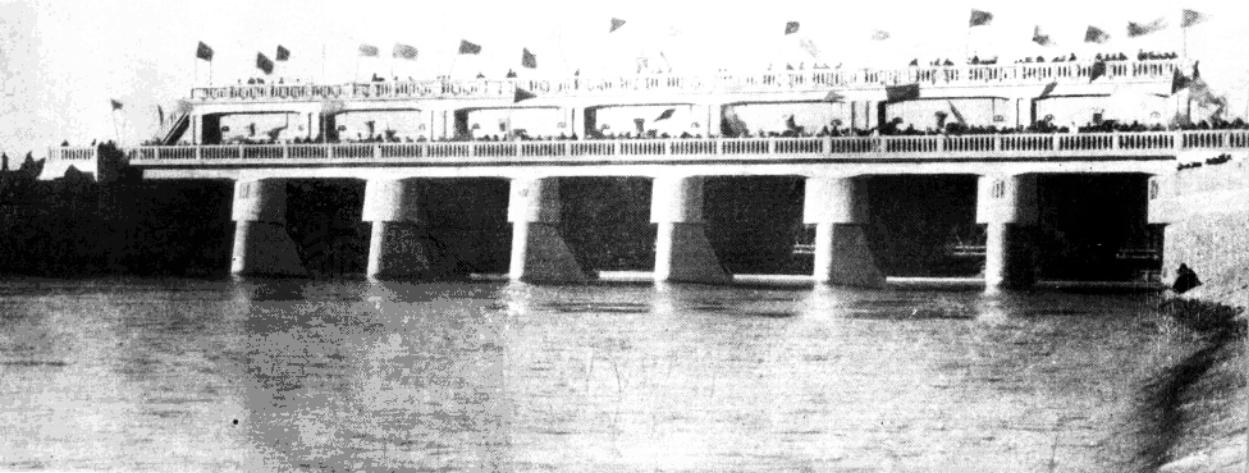

华沂节制闸



入江水道第一期工程——六閘附近切灘及鳳凰河
拓寬于今年开工。图为鳳凰河拓寬工程一个工段。

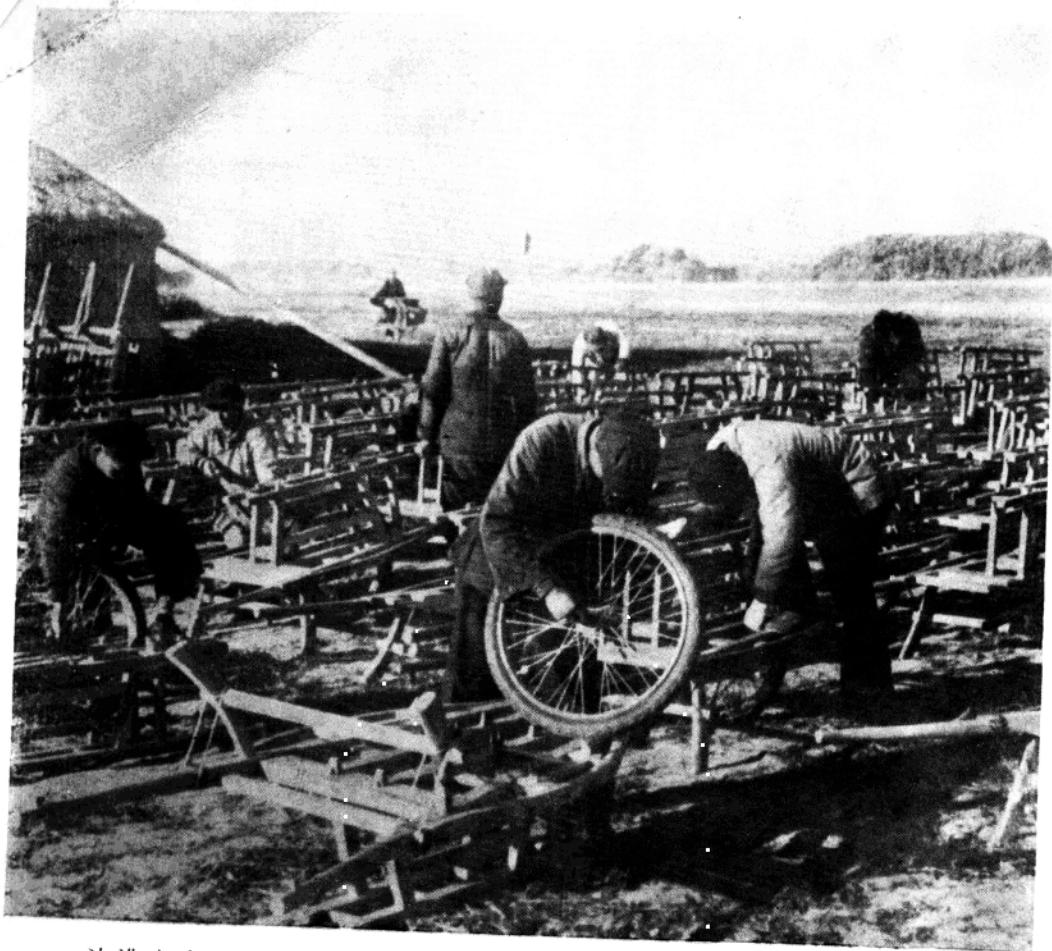

治淮土方工程运土工具改用膠輪車后，一般在100公尺左右运距，比人工挑运效率提高两至四倍。图为民工装膠輪車情形。

目 錄

淮河情況

黃淮平原氣候歷史記載的初步整理.....	徐近之 (1)
江淮流域氣候上的水旱類型.....	呂 壴等 (23)
淮河流域氣候特性.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (35)
淮河流量特性.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (47)
淮河洪水特性.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (59)
淮河流域水文地質勘測綜合報告.....	蕭楠森等 (83)
淮河流域土壤調查概述.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (115)
淮河干流(長台關至高良澗)航運查勘報告.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (137)
運河(黃河南岸至蘇州)航運查勘報告.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (159)
鹽河航運查勘報告.....	水利部治淮委員會 勘測設計院 (183)

工程規劃與施工總結

一九五五年治淮工程計劃綱要.....	水利部治淮委員會 (197)
一九五五年治淮工程施工總結.....	水利部治淮委員會 (215)
泥河窪蓄洪工程規劃概要.....	河南省治淮 總指揮部 (223)
射陽河擋潮閘工程規劃概要.....	江蘇省治淮 總指揮部 (231)
澗河集進湖閘靜水池損壞原因的分析和修復方案.....	水利部治淮委員會 (241)
南灣水庫工程總結.....	河南省治淮 總指揮部 (247)
江風口分洪閘工程總結.....	山东省沂沭泗泗區 治淮指揮部 (259)

工程管理

水利部治淮委員會關於召開治淮工程管理會議情況的報告.....	(269)
淮河流域涵閘管理養護通則(草案).....	水利部治淮委員會 (275)
淮河流域河道堤防管理養護通則(草案).....	水利部治淮委員會 (281)

制訂閘壩工程管理規範參考提綱	水利部治淮委員會 (285)
制訂小型涵閘管理辦法參考提綱	水利部治淮委員會 (295)
白沙水庫管理規範(草案)	河南省治淮 總指揮部 (299)
佛子嶺水庫管理規範(草案)	佛子嶺水庫 管理處 (329)
泥河窪蓄洪工程管理規範(草案)	許昌安區 治淮指揮部 (361)
三河閘臨時管理規範(草案)	江苏省治淮 總指揮部 (379)
東肥閘管理規範(草案)	東肥閘管理所 (393)
霍邱民生涵管理辦法(草案)	城東湖蓄洪 工程管理所 (405)
潤河集船閘管理規範(草案)	潤河集閘場 管理處 (409)
一九五五年治淮工程管理工作總結	水利部治淮委員會 (415)

工作研究與工作經驗

淮河下游閘壩水文測驗總結	水利部治淮委員會 (423) 勘測設計院
摻粉砂、煤灰、粘土(黃土)混凝土試驗報告	河南省治淮 總指揮部 (433)
土料擊實磣質比較試驗報告	水利部治淮委員會 (461) 勘測設計院
南灣水庫土壩基礎斷層處理經驗介紹	河南省治淮 總指揮部 (477)
南灣水庫土壩工程降低粘性土料含水量 及土砂料壓實的方法	河南省治淮 總指揮部 (483)
南灣水庫土壩防止砂體液化措施經驗介紹	河南省治淮 總指揮部 (495)
南灣水庫工程使用機車運輸土料的經驗	河南省治淮 總指揮部 (503)
治淮土方工程使用膠輪車運土的初步經驗	水利部治淮委員會 (509)
治淮土方工程計劃管理經驗介紹	水利部治淮委員會 (523)
梅山水庫工程安全技術勞動保護工作	梅山水庫 工程指揮部 (545)

附 錄

一九五五年淮河流域各級水文測站一覽表	
一九五五年淮河流域測量工作成績一覽表	
一九五五年水庫工程完成情況一覽表	
一九五五年河道整理及其他基建工程完成情況一覽表	

黃淮平原氣候歷史記載的初步整理*

徐 近 之

(中国科学院地理研究所)

黃淮平原的大部分是“中原”核心，历史悠久，很可以根据历史記載來看沒有測候記錄以前的氣候情形。1950年和1951年筆者兩次調查黃泛區地文，已曾利用新舊記錄和記載編寫成黃泛區氣候(未刊稿)。現在治淮委員會正進行淮河流域規劃工作，因此筆者把曾經整理過的比較散漫的一些歷史上關於本區氣候情形的記載提出來，略加分析，希望多少能有助於淮河流域的“百年大計”。

一 氣候的過渡性

關於淮河流域的氣候，地理學報19卷1期(1953年)有沈思璵先生的文章作了概括的陳述，可供參考。筆者擬趁此機會從已有研究結果，略論本區的氣候型和它的過渡性。

盧鑾依柯本氏法定本區氣候式為 $CW_a + CF_{aw}$ ，換言之，平原西部以離海較遠，為溫暖冬干氣候，東部濱海，遂為潤濕溫和氣候⁽¹⁾。照柯本氏的氣候分類，CW以南為廣闊的CF氣候區，其北為半干燥的草原氣候(BS)，所以它在我國東部是一個氣候上的過渡帶。

陶詩言以為本區屬於溫和半潤濕氣候($C_2' C_1'$)，並確定其為干燥與潤濕氣候過渡區⁽²⁾，算出它的潤濕指數為0~20，年平均水分需要量(即最大可能揮發量)為800~900毫米。又說明本區四季寒暖變化和長江下游彷彿，但冬季更為寒冷，年平均雨量有500~750毫米(沙河以南有多處的年雨量大于750毫米)，植物生長季長約230日。

么枕生根據溫度年振幅和緯度來劃分的研究，年溫振幅小於 15°C 區域，叫做暖溫過渡型氣候，本區便是這樣的氣候。么氏確定它大致為柯本氏的CW氣候；他在附圖上徑稱此類氣候為溫暖過渡型季候風氣候⁽³⁾。

上述三個學者的出發點雖然不同，而所得結果大同小異，這是值得注意的。本區除偶有反常潮濕年份外，我同意它是溫和半潤濕氣候，或溫暖過渡型季候風氣候。

中緯度的氣候過渡帶，通常在地勢起伏大和接近大陸邊緣地方，它的寬度變窄，這由於海洋和山地對溫度有調節影響；但在大陸內部，這中溫至低溫(mesothermal-microthermal)過渡帶反而加寬⁽⁴⁾。此種趨勢，我們很可以從盧、么兩氏的氣候圖上

*筆者這裡用黃淮平原這名稱來包括高寶湖以北至黃河(現在)以南的沖積平原。

看到。

在气候过渡带里，每多春旱和夏涝，卢鋈指出在华北春旱和夏涝不是偶然而是经常的现象^[5]。本区虽然不是华北，但它是南北的过渡地带，即使只从历史记载来看，卢鋈的结论也还多少适用。

本区气候有一点比较近似华北，就是在6月份的雨量，比起它前后的月份都要少些。而同时华北普遍缺雨，这是很不利的条件，容易发生旱灾。不过本区比较华北有利的条件是若干处春季雨量相当不少。但春旱仍是难免，有时它的严重性（如开封）比之华北区毫无逊色，这说明气候过渡性的特征所在。

据朱炳海研究，春旱的基本原因在于寒潮太强，使春季锋面波动在本区内不能充分发展，减少降水机会^[6]。而春季温度上升很快，蒸发量很大，土壤里水分消耗过多，无法补给，就形成了作物生长的困难条件。

过渡性也可从别的方面反映出来。在交通上，我国自古有南船北马的说法，本区是它的分野；在农业上，淮南多为水稻田，而本区主要农作是杂粮，旱田普遍。

二 厉害的春旱

旱象的形成主要是由于天久不雨。春夏之交的雨水和农业关系最密切，如不及时降落，便影响农业。历史上关于春雨失时成灾的记事相当多，表1不过是擇要举例。从这少数极端的例子，我们知道，不特本区北部可有很严重的春旱，就是区内最多雨的霍邱（年雨量1,097.4毫米），有时春旱也是严重的，如1867年春夏不雨，连霍邱城西湖都干涸了。

黄淮平原历史上春旱记事举例

表1

年	代	記	事	出	处
1. 1861年(唐咸通2年)		宁陵“秋七月大旱，至明年六月始雨”。		康熙宁陵县志，卷12。	
2. 1493年(明弘治6年)		泗州“春大旱，曹鄆禾稼不生”。		康熙曹州志，卷19。	
3. 1529~1533年(明嘉靖8年至12年)		灵璧“比岁旱”。		乾隆灵璧县志，卷4。	
4. 1588年(明万历16年)		霍邱“春旱，夏六月始雨”。		同治霍邱县志，卷15。	
5. 1607年(明万历35年)		淮阴“春大旱”。		咸丰清河县志，卷24。	
6. 1619年(明万历47年)		蒙城“三月无雨，至九月犹无雨，大旱”。		康熙蒙城县志，卷2。	
7. 1665年(康熙4年)		阜阳“春夏无雨，五月朔始雨”。		道光阜阳县志，卷23。	
8. 1670年(康熙9年)		开封“春夏大旱”。		光緒祥符县志，卷23。	
9. 1714年(康熙53年)		扶沟“秋不雨，至翌年五月乃雨”。		道光扶沟县志，卷12。	
10. 1738年(乾隆3年)		淮阴“春大旱”。		咸丰清河县志，卷24。	
11. 1785年(乾隆50年)		开封“春多暴风捲沙，大旱”。		光緒祥符县志，卷24。	
12. 1796年(乾隆51年)		通許“三月至七月不雨”。		1934年通許县志，卷1。	
13. 1813年(嘉庆18年)		开封“春旱，至七月始雨”。		光緒祥符县志，卷23。	
14. 1866年(同治5年)		五河“春大旱，潼河涸为平道”。		光緒五河县志，卷19。	
15. 1867年(同治6年)		霍邱“自春徂夏不雨，城西湖涓滴无存”。		同治霍邱县志，卷15。	
16. 1870、1871年(同治9年、10年)		开封“春旱”。		光緒祥符县志，卷23。	
17. 1878年(光緒4年)		开封“春大旱”。		光緒祥符县志，卷23。	

注：本文所用清以前的年代，为便于比較計，均已查出相当的公元年代，但記事中的月份仍然还是旧历。
