

全国建造师执业资格考试用书

全面覆盖2009~2014年试题精解

二级建造师考试 试题分类精解

(建设工程施工管理)

学赛网 编著

迅速扣住考点

提升解题技巧

顺利通过考试



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

全国建造师执业资格考试用书

二级建造师考试 试题分类精解

(建设工程施工管理)

学赛网 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京•BEIJING

内 容 简 介

本书由学赛网组织编写,作为二级建造师考试中的建设工程施工管理科目的辅导与培训教材。本书根据最新的二级建造师考试大纲,对历年考试试题进行了分析和总结,对考试大纲规定的内容有重点地进行了细化和深化。考生可通过阅读本书掌握考试大纲规定的知识点、考试重点和难点,熟悉考试方法、试题形式、试题的深度和广度、考试内容的分布,以及解答问题的方法和技巧。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

二级建造师考试试题分类精解. 建设工程施工管理 / 学赛网编著. —北京: 电子工业出版社, 2015.3
全国建造师执业资格考试用书

ISBN 978-7-121-25524-3

I. ①二… II. ①学… III. ①建筑工程—施工管理—建筑师—资格考试—题解 IV. ①TU-44②TU71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 028673 号

策划编辑: 孙学瑛

责任编辑: 徐津平

特约编辑: 赵树刚

印 刷: 三河市鑫金马印装有限公司

装 订: 三河市鑫金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 24 字数: 615 千字

版 次: 2015 年 3 月第 1 版

印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 69.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

前 言

《中华人民共和国建筑法》第 14 条规定：“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。”2003 年 2 月 27 日《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发〔2003〕5 号）规定：“取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册建造师代替，并设立过渡期。”

二级建造师是建设工程行业的一种执业资格，是担任工程项目经理的前提条件。建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的执业注册人员。建造师是懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人才，既要有理论水平，也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。建造师注册受聘后，可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理，从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。

本书是为二级建造师考试中的建设工程施工管理科目而编写的考试用书，分析了历年二级建造师考试建设工程施工管理科目的所有考题，对试题进行详细的分析与解答，对有关重点和难点进行了深入的分析。

作者权威，阵容强大

学赛网（www.xuesai.cn）是国内最专业的建设工程知识库和在线教育平台，专业从事人才培养、教育产品开发、教育图书出版，在职业教育方面具有极高的权威性。特别是在在线教育方面，稳居国内首位，学赛网的远程教育模式得到了国家教育部门的认可和推广。

本书由学赛网编著，参加编写的人员有张友生、王勇、谢顺、刘洋波、桂阳、胡光超、邓旭光、左水林、胡钊源、王军、王玉罡。

在线测试，心中有数

学赛网在线测试平台为考生准备了在线测试，其中有数百套全真模拟试题和考前密卷，考生可选择任何一套进行测试。测试完毕，系统自动判卷，立即给出成绩、测试报告、能力分析和学科分析。

对于考生做错的地方，系统会自动记忆，待考生第二次参加测试时，可选择“试题复习”。这样，系统就会自动把考生原来做错的试题显示出来，供考生重新测试，以加强记忆。

如此，读者可利用学赛网在线测试平台检查自己的实际水平，加强考前训练，做到心中有数、考试不慌。

海量资源，随时学习

学赛网有海量的学习资源，包括视频课程和在线阅读，这些资源对读者都是免费开放的。读者可以在学习本书的同时，学习学赛网上的视频课程，将视频课程与本书的内容同步，使学习更轻松，达到事半功倍的效果，提高学习效率。

互动讨论，专家答疑

学赛网是中国最大的建设工程在线教育网站，该网站问答频道是国内人气最旺的建造师考试社区，在这里，读者可以和数百万考生进行在线交流，讨论有关学习和考试的问题。学赛网拥有强大的师资队伍，为读者提供全程的答疑服务，在线回答读者的提问。

诸多帮助，诚挚致谢

在本书出版之际，要特别感谢建造师考试的命题专家，编者在本书中引用了部分考试原题，使本书能够尽量方便读者的阅读。在本书的编写过程中，参考了许多相关的文献和书籍，编者在此对这些参考文献的作者表示感谢。

感谢电子工业出版社孙学瑛老师，她在本书的策划、选题的申报、写作大纲的确定，以及编辑、出版等方面，付出了辛勤的劳动和智慧，给予了我们很多的支持和帮助。

感谢学赛网的所有用户，正是他们的想法汇成了本书的原动力，他们的意见使本书更加贴近读者。

由于编者水平有限，且本书涉及的内容很广，书中难免存在错漏和不妥之处，编者诚恳地期望各位专家和读者不吝指正和帮助，对此，我们将十分感激。

学赛网 (www.xuesai.cn)

2015年1月

目 录

第1章 2Z101000 施工管理..... 1

2Z101010 施工方的项目管理.....1

试题 1 (2009 年考试试题 1)	1
试题 2 (2010 年考试试题 2)	2
试题 3 (2010 年考试试题 6)	3
试题 4 (2011 年考试试题 1)	3
试题 5 (2011 年考试试题 2)	3
试题 6 (2012 年 6 月考试试题 1)	4
试题 7 (2013 年考试试题 15)	4
试题 8 (2013 年考试试题 68)	5
试题 9 (2013 年考试试题 69)	5
试题 10 (2014 年考试试题 1)	6
试题 11 (2011 年考试试题 71)	6
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 71)	7
试题 13 (2012 年 6 月考试试题 77)	7
试题 14 (2012 年 10 月考试试题 71)	8
试题 15 (2012 年 10 月考试试题 72)	9

2Z101020 施工管理的组织.....10

试题 1 (2009 年考试试题 3)	10
试题 2 (2009 年考试试题 4)	11
试题 3 (2009 年考试试题 5)	11
试题 4 (2009 年考试试题 6)	12
试题 5 (2010 年考试试题 1)	13
试题 6 (2010 年考试试题 3)	13
试题 7 (2010 年考试试题 4)	13
试题 8 (2010 年考试试题 5)	14
试题 9 (2010 年考试试题 7)	14
试题 10 (2011 年考试试题 3)	14
试题 11 (2011 年考试试题 4)	15
试题 12 (2011 年考试试题 6)	15
试题 13 (2011 年考试试题 7)	16
试题 14 (2011 年考试试题 51)	16
试题 15 (2012 年 6 月考试试题 2)	18
试题 16 (2012 年 6 月考试试题 3)	18
试题 17 (2012 年 6 月考试试题 4)	19

试题 18 (2012 年 10 月考试试题 1)19

试题 19 (2012 年 10 月考试试题 2)20

试题 20 (2012 年 10 月考试试题 3)20

试题 21 (2013 年考试试题 6)21

试题 22 (2013 年考试试题 24)22

试题 23 (2013 年考试试题 42)22

试题 24 (2014 年考试试题 2)22

试题 25 (2014 年考试试题 3)23

试题 26 (2011 年考试试题 72)23

试题 27 (2012 年 6 月考试试题 78)24

试题 28 (2012 年 10 月考试试题 73)24

试题 29 (2013 年考试试题 77)25

试题 30 (2013 年考试试题 84)25

试题 31 (2014 年考试试题 86)26

2Z101030 施工组织设计的内容及编制

方法.....27

试题 1 (2009 年考试试题 8)27

试题 2 (2010 年考试试题 8)30

试题 3 (2011 年考试试题 15)30

试题 4 (2012 年 6 月考试试题 5)31

试题 5 (2012 年 6 月考试试题 6)31

试题 6 (2012 年 10 月考试试题 4)32

试题 7 (2012 年 10 月考试试题 12)32

试题 8 (2013 年考试试题 33)32

试题 9 (2013 年考试试题 52)33

试题 10 (2013 年考试试题 54)33

试题 11 (2014 年考试试题 4)34

试题 12 (2009 年考试试题 72)34

试题 13 (2009 年考试试题 95)34

试题 14 (2010 年考试试题 76)36

试题 15 (2011 年考试试题 73)36

2Z101040 施工管理目标的动态控制.....37

试题 1 (2009 年考试试题 9)37

试题 2 (2009 年考试试题 10)38

试题 3 (2010 年考试试题 9)38

试题 4 (2010 年考试试题 10)	39
试题 5 (2011 年考试试题 16)	39
试题 6 (2011 年考试试题 17)	40
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 7)	40
试题 8 (2013 年考试试题 47)	41
试题 9 (2014 年考试试题 5)	41
试题 10 (2012 年 6 月考试试题 79)	41
试题 11 (2013 年考试试题 85)	42
2Z101050 施工项目经理的任务和责任	42
试题 1 (2009 年考试试题 11)	43
试题 2 (2011 年考试试题 18)	43
试题 3 (2011 年考试试题 19)	44
试题 4 (2012 年 6 月考试试题 8)	45
试题 5 (2012 年 10 月考试试题 14)	45
试题 6 (2013 年考试试题 39)	46
试题 7 (2013 年考试试题 55)	47
试题 8 (2014 年考试试题 6)	47
试题 9 (2014 年考试试题 7)	48
试题 10 (2009 年考试试题 73)	49
试题 11 (2010 年考试试题 95)	49
试题 12 (2011 年考试试题 74)	50
试题 13 (2012 年 10 月考试试题 80)	50
试题 14 (2014 年考试试题 74)	51
试题 15 (2014 年考试试题 79)	51
2Z101060 施工风险管理	52
试题 1 (2009 年考试试题 12)	52
试题 2 (2009 年考试试题 13)	53
试题 3 (2010 年考试试题 11)	53
试题 4 (2010 年考试试题 12)	53
试题 5 (2010 年考试试题 13)	55
试题 6 (2010 年考试试题 69)	55
试题 7 (2011 年考试试题 20)	55
试题 8 (2012 年 6 月考试试题 16)	56
试题 9 (2012 年 6 月考试试题 17)	56
试题 10 (2012 年 10 月考试试题 15)	57
试题 11 (2012 年 10 月考试试题 16)	57
试题 12 (2013 年考试试题 7)	58
试题 13 (2013 年考试试题 17)	58
试题 14 (2014 年考试试题 20)	59
试题 15 (2009 年考试试题 74)	59
试题 16 (2011 年考试试题 78)	59

试题 17 (2012 年 6 月考试试题 80)	60
试题 18 (2012 年 10 月考试试题 81)	60
试题 19 (2013 年考试试题 86)	61
2Z101070 工程监理的工作任务和方法	61
试题 1 (2009 年考试试题 14)	61
试题 2 (2009 年考试试题 15)	62
试题 3 (2010 年考试试题 14)	63
试题 4 (2010 年考试试题 15)	63
试题 5 (2011 年考试试题 21)	64
试题 6 (2011 年考试试题 22)	65
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 18)	65
试题 8 (2012 年 6 月考试试题 19)	65
试题 9 (2012 年 10 月考试试题 17)	66
试题 10 (2012 年 10 月考试试题 18)	66
试题 11 (2013 年考试试题 66)	66
试题 12 (2014 年考试试题 17)	67
试题 13 (2014 年考试试题 53)	67

第 2 章 2Z102000 施工成本管理..... 69

2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成 与计算	69
试题 1 (2009 年考试试题 16)	70
试题 2 (2009 年考试试题 17)	70
试题 3 (2009 年考试试题 18)	71
试题 4 (2009 年考试试题 19)	71
试题 5 (2009 年考试试题 20)	72
试题 6 (2010 年考试试题 16)	72
试题 7 (2010 年考试试题 17)	73
试题 8 (2010 年考试试题 18)	73
试题 9 (2010 年考试试题 19)	74
试题 10 (2010 年考试试题 20)	74
试题 11 (2010 年考试试题 21)	74
试题 12 (2010 年考试试题 31)	75
试题 13 (2011 年考试试题 5)	75
试题 14 (2011 年考试试题 8)	76
试题 15 (2011 年考试试题 9)	76
试题 16 (2011 年考试试题 10)	77
试题 17 (2012 年 6 月考试试题 9)	78
试题 18 (2012 年 6 月考试试题 10)	78
试题 19 (2012 年 6 月考试试题 11)	79
试题 20 (2012 年 6 月考试试题 20)	79

试题 21 (2012 年 6 月考试试题 21)	79
试题 22 (2012 年 6 月考试试题 22)	80
试题 23 (2012 年 10 月考试试题 5)	81
试题 24 (2012 年 10 月考试试题 6)	81
试题 25 (2012 年 10 月考试试题 7)	81
试题 26 (2012 年 10 月考试试题 8)	82
试题 27 (2012 年 10 月考试试题 9)	82
试题 28 (2012 年 10 月考试试题 10)	83
试题 29 (2012 年 10 月考试试题 19)	83
试题 30 (2012 年 10 月考试试题 20)	84
试题 31 (2013 年考试试题 13)	84
试题 32 (2013 年考试试题 18)	85
试题 33 (2013 年考试试题 20)	85
试题 34 (2013 年考试试题 40)	86
试题 35 (2013 年考试试题 65)	86
试题 36 (2014 年考试试题 11)	86
试题 37 (2014 年考试试题 25)	88
试题 38 (2014 年考试试题 26)	88
试题 39 (2014 年考试试题 27)	89
试题 40 (2009 年考试试题 75)	90
试题 41 (2009 年考试试题 76)	91
试题 42 (2010 年考试试题 72)	91
试题 43 (2011 年考试试题 79)	92
试题 44 (2011 年考试试题 80)	92
试题 45 (2011 年考试试题 81)	93
试题 46 (2012 年 6 月考试试题 72)	93
试题 47 (2012 年 6 月考试试题 81)	94
试题 48 (2012 年 10 月考试试题 82) ..	94
试题 49 (2012 年 10 月考试试题 83)	94
试题 50 (2013 年考试试题 72)	95
试题 51 (2013 年考试试题 73)	95
试题 52 (2013 年考试试题 79)	96
试题 53 (2014 年考试试题 76)	96
试题 54 (2014 年考试试题 87)	97
2Z102020 建设工程定额.....	97
试题 1 (2009 年考试试题 21)	97
试题 2 (2009 年考试试题 22)	99
试题 3 (2009 年考试试题 23)	100
试题 4 (2010 年考试试题 22)	101
试题 5 (2010 年考试试题 23)	101
试题 6 (2010 年考试试题 24)	102
试题 7 (2011 年考试试题 11)	103
试题 8 (2011 年考试试题 12)	103
试题 9 (2011 年考试试题 13)	104
试题 10 (2012 年 6 月考试试题 12)	104
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 13)	104
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 14)	105
试题 13 (2012 年 10 月考试试题 11) ...	105
试题 14 (2012 年 10 月考试试题 25) ...	106
试题 15 (2012 年 10 月考试试题 26) ...	106
试题 16 (2013 年考试试题 26)	106
试题 17 (2013 年考试试题 29)	107
试题 18 (2013 年考试试题 53)	107
试题 19 (2014 年考试试题 36)	108
试题 20 (2014 年考试试题 52)	108
试题 21 (2009 年考试试题 77)	108
试题 22 (2010 年考试试题 73)	109
试题 23 (2011 年考试试题 75)	109
试题 24 (2011 年考试试题 82)	110
试题 25 (2012 年 6 月考试试题 73)	110
试题 26 (2012 年 10 月考试试题 74) ...	111
试题 27 (2012 年 10 月考试试题 84) ...	111
试题 28 (2013 年考试试题 71)	112
试题 29 (2014 年考试试题 88)	112
2Z102030 合同价款约定与工程结算.....	113
试题 1 (2009 年考试试题 7)	113
试题 2 (2009 年考试试题 30)	113
试题 3 (2009 年考试试题 31)	114
试题 4 (2009 年考试试题 63)	114
试题 5 (2010 年考试试题 32)	115
试题 6 (2011 年考试试题 23)	115
试题 7 (2011 年考试试题 27)	116
试题 8 (2011 年考试试题 35)	117
试题 9 (2011 年考试试题 36)	117
试题 10 (2012 年 6 月考试试题 25)	118
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 26)	118
试题 12 (2012 年 10 月考试试题 21) ...	119
试题 13 (2013 年考试试题 12)	120
试题 14 (2013 年考试试题 57)	120
试题 15 (2009 年考试试题 80)	121
试题 16 (2010 年考试试题 71)	121
2Z102040 施工成本管理与施工成本计划 ...	122

试题 1 (2009 年考试试题 24)	122
试题 2 (2009 年考试试题 25)	123
试题 3 (2009 年考试试题 26)	123
试题 4 (2010 年考试试题 25)	124
试题 5 (2010 年考试试题 26)	124
试题 6 (2010 年考试试题 27)	125
试题 7 (2011 年考试试题 14)	125
试题 8 (2011 年考试试题 30)	126
试题 9 (2011 年考试试题 31)	126
试题 10 (2011 年考试试题 32)	126
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 15)	127
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 24)	128
试题 13 (2012 年 6 月考试试题 29)	129
试题 14 (2012 年 6 月考试试题 30)	130
试题 15 (2012 年 6 月考试试题 31)	130
试题 16 (2012 年 10 月考试试题 27)	131
试题 17 (2012 年 10 月考试试题 28)	131
试题 18 (2013 年考试试题 3)	132
试题 19 (2013 年考试试题 8)	132
试题 20 (2013 年考试试题 22)	133
试题 21 (2013 年考试试题 56)	133
试题 22 (2014 年考试试题 13)	134
试题 23 (2014 年考试试题 38)	134
试题 24 (2014 年考试试题 54)	135
试题 25 (2014 年考试试题 55)	135
试题 26 (2009 年考试试题 78)	135
试题 27 (2009 年考试试题 79)	136
试题 28 (2010 年考试试题 83)	136
试题 29 (2012 年 6 月考试试题 74)	137
试题 30 (2012 年 10 月考试试题 75)	137
2Z102050 施工成本控制与施工成本分析 ...	138
试题 1 (2009 年考试试题 27)	138
试题 2 (2009 年考试试题 28)	139
试题 3 (2009 年考试试题 29)	140
试题 4 (2010 年考试试题 28)	140
试题 5 (2010 年考试试题 29)	141
试题 6 (2010 年考试试题 30)	141
试题 7 (2011 年考试试题 33)	141
试题 8 (2011 年考试试题 34)	142
试题 9 (2012 年 6 月考试试题 23)	142
试题 10 (2012 年 6 月考试试题 32)	143

试题 11 (2012 年 10 月考试试题 13) ...	143
试题 12 (2012 年 10 月考试试题 29) ...	144
试题 13 (2012 年 10 月考试试题 30) ...	144
试题 14 (2012 年 10 月考试试题 31) ...	144
试题 15 (2013 年考试试题 1)	145
试题 16 (2013 年考试试题 64)	146
试题 17 (2014 年考试试题 9)	146
试题 18 (2014 年考试试题 13)	147
试题 19 (2014 年考试试题 44)	147
试题 20 (2009 年考试试题 79)	148
试题 21 (2010 年考试试题 74)	148
试题 22 (2010 年考试试题 75)	149
试题 23 (2012 年 6 月考试试题 75)	149
试题 24 (2012 年 6 月考试试题 93)	150
试题 25 (2012 年 10 月考试试题 76) ...	150
试题 26 (2013 年考试试题 89)	151
试题 27 (2014 年考试试题 84)	151
试题 28 (2014 年考试试题 91)	152

第 3 章 2Z103000 施工进度管理.... 153

2Z103010 建设工程项目进度控制的目标 和任务	153
试题 1 (2009 年考试试题 32)	153
试题 2 (2009 年考试试题 33)	154
试题 3 (2010 年考试试题 33)	155
试题 4 (2011 年考试试题 24)	155
试题 5 (2011 年考试试题 25)	156
试题 6 (2012 年 10 月考试试题 22)	156
试题 7 (2012 年 10 月考试试题 23)	157
试题 8 (2013 年考试试题 44)	157
试题 9 (2013 年考试试题 46)	158
试题 10 (2014 年考试试题 46)	158
试题 11 (2014 年考试试题 67)	158
2Z103020 施工进度计划的类型及其作用 ...	159
试题 1 (2009 年考试试题 34)	160
试题 2 (2009 年考试试题 35)	160
试题 3 (2010 年考试试题 34)	161
试题 4 (2010 年考试试题 35)	161
试题 5 (2010 年考试试题 36)	161
试题 6 (2011 年考试试题 26)	162
试题 7 (2011 年考试试题 28)	162

试题 8 (2013 年考试试题 28)	162	试题 34 (2010 年考试试题 79)	183
试题 9 (2013 年考试试题 34)	163	试题 35 (2011 年考试试题 77)	184
试题 10 (2009 年考试试题 81)	163	试题 36 (2012 年 6 月考试试题 88)	184
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 87) ...	164	试题 37 (2012 年 6 月考试试题 89)	185
试题 12 (2012 年 10 月考试试题 78) ...	164	试题 38 (2012 年 10 月考试试题 79) ...	186
试题 13 (2013 年考试试题 74)	164	试题 39 (2012 年 10 月考试试题 85) ...	186
试题 14 (2014 年考试试题 75)	165	试题 40 (2013 年考试试题 76)	187
2Z103030 施工进度计划的编制方法	165	试题 41 (2013 年考试试题 82)	187
试题 1 (2009 年考试试题 36)	165	试题 42 (2014 年考试试题 81)	188
试题 2 (2009 年考试试题 37)	166	2Z103040 施工进度控制的任务和措施	189
试题 3 (2009 年考试试题 38)	167	试题 1 (2009 年考试试题 39)	189
试题 4 (2010 年考试试题 37)	167	试题 2 (2012 年 6 月考试试题 27)	191
试题 5 (2010 年考试试题 38)	168	试题 3 (2012 年 6 月考试试题 45)	191
试题 6 (2010 年考试试题 39)	168	试题 4 (2012 年 10 月考试试题 32)	191
试题 7 (2011 年考试试题 29)	169	试题 5 (2013 年考试试题 62)	192
试题 8 (2011 年考试试题 45)	169	试题 6 (2014 年考试试题 39)	192
试题 9 (2011 年考试试题 46)	170	试题 7 (2014 年考试试题 48)	193
试题 10 (2011 年考试试题 47)	170	试题 8 (2009 年考试试题 83)	193
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 28) ...	171	试题 9 (2010 年考试试题 80)	194
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 41)	171	试题 10 (2011 年考试试题 90)	194
试题 13 (2012 年 6 月考试试题 42)	172	试题 11 (2011 年考试试题 91)	195
试题 14 (2012 年 6 月考试试题 43)	172	试题 12 (2013 年考试试题 78)	195
试题 15 (2012 年 6 月考试试题 44)	173	试题 13 (2014 年考试试题 92)	195
试题 16 (2012 年 10 月考试试题 24) ...	173	试题 14 (2014 年考试试题 95)	196
试题 17 (2012 年 10 月考试试题 39) ...	174	第 4 章 2Z104000 施工质量管理	197
试题 18 (2012 年 10 月考试试题 40)	175	2Z104010 施工质量管理与施工质量控制 ...	197
试题 19 (2012 年 10 月考试试题 41) ...	175	试题 1 (2009 年考试试题 41)	197
试题 20 (2012 年 10 月考试试题 42) ...	176	试题 2 (2010 年考试试题 40)	199
试题 21 (2013 年考试试题 21)	176	试题 3 (2010 年考试试题 41)	200
试题 22 (2013 年考试试题 36)	177	试题 4 (2011 年考试试题 48)	200
试题 23 (2013 年考试试题 38)	177	试题 5 (2011 年考试试题 49)	201
试题 24 (2013 年考试试题 59)	178	试题 6 (2012 年 6 月考试试题 33)	201
试题 25 (2013 年考试试题 67)	179	试题 7 (2012 年 6 月考试试题 34)	202
试题 26 (2014 年考试试题 10)	179	试题 8 (2012 年 10 月考试试题 33)	202
试题 27 (2014 年考试试题 18)	180	试题 9 (2012 年 10 月考试试题 34)	203
试题 28 (2014 年考试试题 19)	180	试题 10 (2013 年考试试题 10)	203
试题 29 (2014 年考试试题 32)	181	试题 11 (2013 年考试试题 23)	204
试题 30 (2014 年考试试题 59)	181	试题 12 (2014 年考试试题 47)	204
试题 31 (2009 年考试试题 82)	182	试题 13 (2014 年考试试题 56)	204
试题 32 (2010 年考试试题 77)	182	试题 14 (2010 年考试试题 81)	205
试题 33 (2010 年考试试题 78)	183		

2Z104020 施工质量管理体系.....	205
试题 1 (2009 年考试试题 42)	205
试题 2 (2010 年考试试题 42)	206
试题 3 (2011 年考试试题 37)	207
试题 4 (2011 年考试试题 50)	207
试题 5 (2012 年 6 月考试试题 35)	208
试题 6 (2012 年 6 月考试试题 36)	209
试题 7 (2012 年 10 月考试试题 35)	209
试题 8 (2012 年 10 月考试试题 36)	210
试题 9 (2013 年考试试题 5)	210
试题 10 (2013 年考试试题 27)	210
试题 11 (2014 年考试试题 16)	211
试题 12 (2014 年考试试题 43)	211
试题 13 (2014 年考试试题 51)	211
试题 14 (2009 年考试试题 84)	212
试题 15 (2010 年考试试题 90)	212
试题 16 (2011 年考试试题 92)	213
试题 17 (2012 年 6 月考试试题 90)	213
试题 18 (2012 年 10 月考试试题 86)	214
试题 19 (2014 年考试试题 94)	214
2Z104030 施工质量控制的内容和方法	215
试题 1 (2009 年考试试题 43)	215
试题 2 (2009 年考试试题 44)	216
试题 3 (2009 年考试试题 45)	216
试题 4 (2009 年考试试题 46)	217
试题 5 (2010 年考试试题 43)	218
试题 6 (2010 年考试试题 44)	218
试题 7 (2010 年考试试题 45)	218
试题 8 (2011 年考试试题 38)	219
试题 9 (2011 年考试试题 39)	219
试题 10 (2012 年 6 月考试试题 37)	220
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 38)	220
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 39)	220
试题 13 (2012 年 6 月考试试题 40)	221
试题 14 (2012 年 10 月考试试题 37)	221
试题 15 (2012 年 10 月考试试题 38)	222
试题 16 (2012 年 10 月考试试题 49)	222
试题 17 (2012 年 10 月考试试题 50)	223
试题 18 (2012 年 10 月考试试题 53)	224
试题 19 (2012 年 10 月考试试题 55)	224
试题 20 (2013 年考试试题 30)	225

试题 21 (2013 年考试试题 48)	225
试题 22 (2013 年考试试题 50)	225
试题 23 (2013 年考试试题 60)	226
试题 24 (2014 年考试试题 42)	226
试题 25 (2014 年考试试题 62)	227
试题 26 (2014 年考试试题 69)	227
试题 27 (2009 年考试试题 85)	228
试题 28 (2010 年考试试题 82)	228
试题 29 (2010 年考试试题 83)	229
试题 30 (2011 年考试试题 76)	229
试题 31 (2011 年考试试题 93)	230
试题 32 (2012 年 6 月考试试题 82)	231
试题 33 (2012 年 6 月考试试题 91)	233
试题 34 (2012 年 10 月考试试题 87)	233
试题 35 (2012 年 10 月考试试题 88)	234
试题 36 (2013 年考试试题 92)	234
试题 37 (2014 年考试试题 83)	235
2Z104040 施工质量事故预防与处理	235
试题 1 (2009 年考试试题 47)	235
试题 2 (2009 年考试试题 48)	237
试题 3 (2010 年考试试题 46)	237
试题 4 (2010 年考试试题 47)	238
试题 5 (2011 年考试试题 40)	238
试题 6 (2011 年考试试题 41)	238
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 53)	240
试题 8 (2012 年 6 月考试试题 54)	241
试题 9 (2012 年 6 月考试试题 55)	241
试题 10 (2012 年 10 月考试试题 51)	242
试题 11 (2012 年 10 月考试试题 52)	243
试题 12 (2013 年考试试题 14)	244
试题 13 (2013 年考试试题 63)	244
试题 14 (2014 年考试试题 15)	244
试题 15 (2014 年考试试题 30)	245
试题 16 (2014 年考试试题 45)	245
试题 17 (2009 年考试试题 86)	246
试题 18 (2011 年考试试题 94)	246
试题 19 (2012 年 6 月考试试题 83)	247
试题 20 (2013 年考试试题 83)	247
试题 21 (2014 年考试试题 82)	247
2Z104050 施工质量的政府监督	248
试题 1 (2009 年考试试题 49)	248

试题 2 (2010 年考试试题 48)	249
试题 3 (2011 年考试试题 42)	249
试题 4 (2011 年考试试题 43)	250
试题 5 (2012 年 6 月考试试题 56)	250
试题 6 (2012 年 10 月考试试题 56)	251
试题 7 (2013 年考试试题 51)	251
试题 8 (2014 年考试试题 8)	251
试题 9 (2014 年考试试题 57)	252
试题 10 (2009 年考试试题 87)	252
试题 11 (2010 年考试试题 84)	253
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 84)	253
试题 13 (2012 年 10 月考试试题 89)	254
试题 14 (2013 年考试试题 88)	254
试题 15 (2014 年考试试题 80)	255

第 5 章 2Z105000 施工职业健康 安全与环境管理 256

2Z105010 职业健康安全管理体系与环境

管理体系 256

试题 1 (2009 年考试试题 50)	256
试题 2 (2009 年考试试题 51)	257
试题 3 (2009 年考试试题 53)	258
试题 4 (2009 年考试试题 54)	258
试题 5 (2010 年考试试题 49)	259
试题 6 (2010 年考试试题 52)	259
试题 7 (2010 年考试试题 53)	259
试题 8 (2011 年考试试题 56)	260
试题 9 (2011 年考试试题 57)	261
试题 10 (2011 年考试试题 58)	261
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 46)	262
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 47)	262
试题 13 (2012 年 10 月考试试题 46)	263
试题 14 (2012 年 10 月考试试题 54)	263
试题 15 (2012 年 10 月考试试题 57)	264
试题 16 (2013 年考试试题 9)	264
试题 17 (2013 年考试试题 43)	265
试题 18 (2014 年考试试题 70)	265
试题 19 (2010 年考试试题 85)	266
试题 20 (2010 年考试试题 86)	266
试题 21 (2011 年考试试题 85)	267

2Z105020 施工安全生产管理 267

试题 1 (2009 年考试试题 52)	267
试题 2 (2010 年考试试题 50)	269
试题 3 (2010 年考试试题 51)	269
试题 4 (2011 年考试试题 44)	270
试题 5 (2012 年 6 月考试试题 57)	270
试题 6 (2012 年 6 月考试试题 58)	270
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 59)	271
试题 8 (2012 年 6 月考试试题 60)	271
试题 9 (2012 年 10 月考试试题 43)	271
试题 10 (2012 年 10 月考试试题 44)	272
试题 11 (2012 年 10 月考试试题 45)	273
试题 12 (2013 年考试试题 41)	273
试题 13 (2013 年考试试题 45)	273
试题 14 (2013 年考试试题 58)	274
试题 15 (2013 年考试试题 61)	274
试题 16 (2014 年考试试题 37)	275
试题 17 (2014 年考试试题 40)	275
试题 18 (2014 年考试试题 61)	276
试题 19 (2014 年考试试题 68)	278
试题 20 (2009 年考试试题 88)	278
试题 21 (2011 年考试试题 84)	278
试题 22 (2011 年考试试题 95)	279
试题 23 (2012 年 6 月考试试题 85)	280
试题 24 (2012 年 6 月考试试题 86)	280
试题 25 (2012 年 10 月考试试题 90)	281
试题 26 (2013 年考试试题 81)	281
试题 27 (2014 年考试试题 85)	282
试题 28 (2014 年考试试题 93)	283

2Z105030 生产安全事故应急预案和事故

处理 283

试题 1 (2009 年考试试题 55)	284
试题 2 (2009 年考试试题 56)	285
试题 3 (2010 年考试试题 54)	286
试题 4 (2010 年考试试题 55)	286
试题 5 (2011 年考试试题 59)	287
试题 6 (2011 年考试试题 60)	288
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 48)	289
试题 8 (2012 年 6 月考试试题 49)	289
试题 9 (2012 年 10 月考试试题 47)	290
试题 10 (2012 年 10 月考试试题 58)	290
试题 11 (2013 年考试试题 4)	291

试题 12 (2014 年考试试题 60)	291
试题 13 (2014 年考试试题 63)	293
试题 14 (2009 年考试试题 89)	294
试题 15 (2012 年 6 月考试试题 92)	294
试题 16 (2012 年 10 月考试试题 91)	295
试题 17 (2012 年 10 月考试试题 92)	295
试题 18 (2013 年考试试题 90)	296
试题 19 (2014 年考试试题 71)	296
2Z105040 施工现场文明施工和环境保护 的要求	297
试题 1 (2009 年考试试题 57)	297
试题 2 (2011 年考试试题 61)	297
试题 3 (2011 年考试试题 62)	298
试题 4 (2012 年 6 月考试试题 50)	298
试题 5 (2012 年 6 月考试试题 51)	299
试题 6 (2012 年 10 月考试试题 48)	299
试题 7 (2012 年 10 月考试试题 59)	300
试题 8 (2013 年考试试题 35)	300
试题 9 (2014 年考试试题 12)	301
试题 10 (2014 年考试试题 14)	301
试题 11 (2014 年考试试题 35)	304
试题 12 (2009 年考试试题 90)	304
试题 13 (2010 年考试试题 87)	305
试题 14 (2010 年考试试题 88)	305
试题 15 (2013 年考试试题 95)	306
试题 16 (2014 年考试试题 89)	306

第 6 章 2Z106000 施工合同管理.... 308

2Z106010 施工发承包模式	308
试题 1 (2009 年考试试题 58)	308
试题 2 (2009 年考试试题 59)	310
试题 3 (2009 年考试试题 62)	310
试题 4 (2010 年考试试题 56)	311
试题 5 (2010 年考试试题 57)	311
试题 6 (2011 年考试试题 52)	312
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 52)	312
试题 8 (2012 年 6 月考试试题 61)	312
试题 9 (2012 年 10 月考试试题 60)	313
试题 10 (2013 年考试试题 2)	314
试题 11 (2013 年考试试题 11)	314
试题 12 (2013 年考试试题 19)	315

试题 13 (2014 年考试试题 29)	315
试题 14 (2014 年考试试题 50)	316
试题 15 (2009 年考试试题 91)	316
试题 16 (2010 年考试试题 89)	317
试题 17 (2011 年考试试题 86)	317
2Z106020 施工合同与物资采购合同	317
试题 1 (2009 年考试试题 60)	318
试题 2 (2009 年考试试题 61)	320
试题 3 (2010 年考试试题 58)	320
试题 4 (2010 年考试试题 59)	320
试题 5 (2010 年考试试题 60)	321
试题 6 (2011 年考试试题 53)	321
试题 7 (2011 年考试试题 54)	322
试题 8 (2011 年考试试题 55)	322
试题 9 (2012 年 6 月考试试题 62)	323
试题 10 (2012 年 6 月考试试题 63)	323
试题 11 (2012 年 6 月考试试题 64)	324
试题 12 (2012 年 6 月考试试题 65)	324
试题 13 (2012 年 10 月考试试题 61)	325
试题 14 (2012 年 10 月考试试题 62)	325
试题 15 (2012 年 10 月考试试题 63)	326
试题 16 (2012 年 10 月考试试题 64)	326
试题 17 (2012 年 10 月考试试题 65)	326
试题 18 (2013 年考试试题 31)	327
试题 19 (2013 年考试试题 49)	327
试题 20 (2013 年考试试题 70)	328
试题 21 (2014 年考试试题 24)	328
试题 22 (2014 年考试试题 28)	329
试题 23 (2014 年考试试题 64)	329
试题 24 (2009 年考试试题 92)	330
试题 25 (2009 年考试试题 93)	330
试题 26 (2010 年考试试题 91)	331
试题 27 (2011 年考试试题 87)	331
试题 28 (2011 年考试试题 88)	332
试题 29 (2012 年 6 月考试试题 76)	333
试题 30 (2012 年 6 月考试试题 94)	333
试题 31 (2012 年 10 月考试试题 77)	334
试题 32 (2012 年 10 月考试试题 93)	335
试题 33 (2012 年 10 月考试试题 94)	335
试题 34 (2013 年考试试题 80)	335
试题 35 (2013 年考试试题 87)	336

试题 36 (2013 年考试试题 93)	336
试题 37 (2014 年考试试题 90)	337
2Z106030 施工计价方式.....	337
试题 1 (2009 年考试试题 64)	337
试题 2 (2010 年考试试题 61)	338
试题 3 (2010 年考试试题 62)	339
试题 4 (2011 年考试试题 63)	339
试题 5 (2011 年考试试题 64)	340
试题 6 (2011 年考试试题 66)	341
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 66)	341
试题 8 (2012 年 10 月考试试题 68)	341
试题 9 (2012 年 10 月考试试题 69)	342
试题 10 (2013 年考试试题 16)	342
试题 11 (2014 年考试试题 22)	343
试题 12 (2014 年考试试题 33)	343
试题 13 (2014 年考试试题 34)	344
试题 14 (2014 年考试试题 41)	344
试题 15 (2014 年考试试题 58)	345
试题 16 (2009 年考试试题 94)	345
试题 17 (2010 年考试试题 92)	346
试题 18 (2011 年考试试题 89)	346
试题 19 (2012 年 6 月考试试题 95)	347
试题 20 (2014 年考试试题 73)	347
试题 21 (2014 年考试试题 78)	348
2Z106040 施工合同执行过程的管理.....	348
试题 1 (2009 年考试试题 65)	348
试题 2 (2009 年考试试题 66)	349
试题 3 (2010 年考试试题 63)	349
试题 4 (2010 年考试试题 70)	349
试题 5 (2011 年考试试题 65)	350
试题 6 (2013 年考试试题 37)	350
试题 7 (2014 年考试试题 31)	351
试题 8 (2014 年考试试题 65)	351
试题 9 (2010 年考试试题 93)	352
试题 10 (2012 年 10 月考试试题 95)	352
试题 11 (2013 年考试试题 91)	353
2Z106050 施工合同的索赔.....	353
试题 1 (2009 年考试试题 67)	353
试题 2 (2009 年考试试题 68)	354
试题 3 (2010 年考试试题 64)	354
试题 4 (2010 年考试试题 65)	355

试题 5 (2011 年考试试题 67)	355
试题 6 (2011 年考试试题 68)	356
试题 7 (2012 年 6 月考试试题 67)	356
试题 8 (2012 年 10 月考试试题 66)	357
试题 9 (2013 年考试试题 25)	357
试题 10 (2014 年考试试题 23)	358
试题 11 (2014 年考试试题 49)	358
试题 12 (2013 年考试试题 75)	358
试题 13 (2014 年考试试题 77)	359

第 7 章 2Z107000 施工信息管理.... 360

2Z107010 施工信息管理的任务和方法.....	360
试题 1 (2009 年考试试题 69)	360
试题 2 (2009 年考试试题 70)	360
试题 3 (2010 年考试试题 66)	361
试题 4 (2012 年 6 月考试试题 68)	362
试题 5 (2013 年考试试题 32)	362
试题 6 (2014 年考试试题 21)	363
试题 7 (2013 年考试试题 94)	363
2Z107020 施工文件档案管理.....	364
试题 1 (2010 年考试试题 67)	364
试题 2 (2010 年考试试题 68)	365
试题 3 (2011 年考试试题 69)	365
试题 4 (2011 年考试试题 70)	365
试题 5 (2012 年 6 月考试试题 69)	366
试题 6 (2012 年 6 月考试试题 70)	366
试题 7 (2012 年 10 月考试试题 67)	367
试题 8 (2012 年 10 月考试试题 70)	367
试题 9 (2009 年考试试题 71)	368
试题 10 (2010 年考试试题 94)	368
试题 11 (2014 年考试试题 72)	369

参考文献..... 370

本部分知识是二级建造师考试建设工程施工管理的五大重点之一，根据考试大纲，要求考生掌握以下几个方面的内容。

- (1) 施工方的项目管理：建设工程项目管理的类型、施工项目管理的目标和任务。
- (2) 施工管理的组织：项目结构分析、施工管理的组织结构、施工管理的工作任务分工、施工管理的管理职能分工、施工管理的工作流程组织。
- (3) 施工组织设计的内容及编制方法：施工组织设计的内容、施工组织设计的编制方法。
- (4) 施工管理目标的动态控制：动态控制方法、动态控制方法在施工管理中的应用。
- (5) 施工项目经理的任务和责任：施工项目经理的任务、施工项目经理的责任。
- (6) 施工风险管理：风险和风险量、施工风险的类型、施工风险管理的任务和方法。
- (7) 工程监理的工作任务和方法：工程监理的工作任务、工程监理的工作方法。

从历年的考试试题来看，本章的主要分数集中在施工管理的组织、施工组织设计的内容及编制方法、施工项目经理的任务和责任、施工风险管理这 4 个方面。

2Z101010 施工方的项目管理

关于本目，根据考试大纲，要求考生掌握以下几个方面的内容。

- (1) 建设工程项目管理的类型。
- (2) 施工项目管理的目标和任务。

试题 1（2009 年考试试题 1）

编制项目建议书属于建设工程项目全生命周期（ ）。

- A. 决策阶段的工作
- B. 实施阶段的工作
- C. 设计准备阶段的工作
- D. 施工阶段的工作

试题 1 答案

A

试题 1 分析

建设工程项目的全生命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期，如图 1-1 所示。

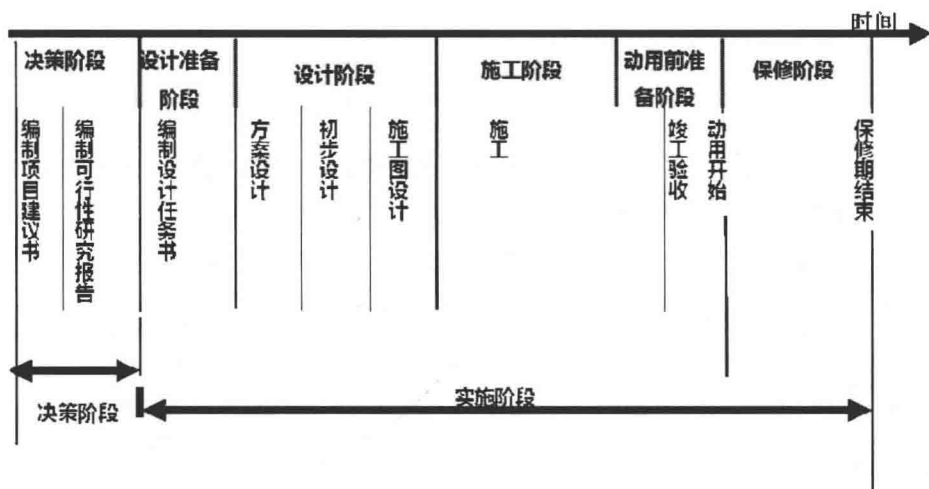


图 1-1 建设工程项目的决策阶段和实施阶段

试题 2（2010 年考试试题 2）

某工程项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中该分包单位必须接受（ ）的工作指令，服从其总体的项目管理。

- A. 业主
- B. 设计方
- C. 施工总承包方
- D. 项目监理方

试题 2 答案

C

试题 2 分析

若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，还是由业主指定的分包方）必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。

试题 3 (2010 年考试试题 6)

项目管理的核心任务是项目的 ()。

- A. 组织协调
- B. 目标控制
- C. 合同管理
- D. 风险管理

试题 3 答案

B

试题 3 分析

由于项目管理的核心任务是项目的目标控制,因此按项目管理学的基本理论,没有明确目标的建设工程不能成为项目管理的对象。

试题 4 (2011 年考试试题 1)

甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目的设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是 ()。

- A. 项目投资目标
- B. 设计进度目标
- C. 施工质量目标
- D. 设计成本目标

试题 4 答案

C

试题 4 分析

设计方项目管理的任务包括:

- (1) 与设计工作有关的安全管理。
- (2) 设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制。
- (3) 设计进度控制。
- (4) 设计质量控制。
- (5) 设计合同管理。
- (6) 设计信息管理。
- (7) 与设计工作有关的组织和协调。

试题 5 (2011 年考试试题 2)

某建设工程项目施工采用施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受 () 的工作指令。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 施工总承包管理企业
- D. 施工承包企业
