

2019年版

全国一级造价工程师职业资格考试

应试指南

建设工程造价案例分析

何增勤 王亦虹 李丽红 主编



微信扫码

免费领取配套课程题库



中国计划出版社

2019 年版

一级建造师执业资格考试用书

全国一级造价工程师职业资格考

应试指南

建设工程造价案例分析

何增勤 王亦虹 李丽红 主编

常州大学图书馆
藏书章

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

2019年

建设工程造价案例分析 / 何增勤, 王亦虹, 李丽红
主编. — 北京: 中国计划出版社, 2019. 6
2019年版全国一级造价工程师职业资格考试应试指南
ISBN 978-7-5182-1024-4

I. ①建… II. ①何… ②王… ③李… III. ①建筑造
价管理—案例—资格考试—自学参考资料 IV.
①TU723.31-

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第103242号

2019年版全国一级造价工程师职业资格考试应试指南

建设工程造价案例分析

何增勤 王亦虹 李丽红 主编

中国计划出版社出版发行

网址: www.jhpress.com

地址: 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座3层

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部)

北京市科星印刷有限责任公司印刷

787mm×1092mm 1/16 26.75印张 651千字

2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

印数 1—6000册

ISBN 978-7-5182-1024-4

定价: 82.00元

版权所有 侵权必究

本书环衬使用中国计划出版社专用防伪纸, 封面贴有中国计划出版社
专用防伪标, 否则为盗版书。请读者注意鉴别、监督!

侵权举报电话: (010) 63906404

如有印装质量问题, 请寄本社出版部调换

前 言

自2001年首次出版以来,《全国造价工程师执业资格考试应试指南》(共五册,以下简称《指南》)已经伴随参加全国造价工程师执业资格考试的业界同仁走过了18个考季。在此期间,教材经过了七次改版,《指南》也经历了从五科合订(2001—2004年版)到五个分册(2005年版至今)的演变。从体例的革新到内容的充实,近20年来《指南》的参编教师始终本着精益求精、服务考生和对读者负责的原则,投入到每年2~3个月的编写工作中。

回顾过往,《指南》在与广大读者、业界同仁交流互动中不断地完善、充实。2004年,全国造价工程师执业资格考试教材第三次改版后,具有多年造价工程师执业资格考试培训与研究的教师团队对《指南》从编写思路、体例设计、题目选排等方面进行了全面改版升级。2005年,我们在以前各版《指南》的基础上将各考试科目的合订本拆分为五个分册,方便考生根据所报考的科目自主选择,并充实了新出台的相关文件和精神。2006年,根据新教材的内容对《指南》进行了充实和修改,得到了广大考生的认可与大力支持。2007、2008年,针对《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的规定,组织编者对考试涉及《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的内容进行研讨,征求考前培训资深教师的意见,将《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的相关内容充实到《指南》中,为方便考生备考《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的相关内容提供了一条有效的捷径,满足了考生的迫切需求。

2009年,《全国造价工程师执业资格考试培训教材》第五次改版后,《指南》参编教师针对教材内容和结构上的变动进行了多次研讨,并将学习与研讨的收获和体会充分落实到2009年版《指南》的编写与修订中。2010年,对《指南》进行了体例和内容的全面升级,充分适应了考试综合性强、考核重点突出的变化趋势。此后,2011年版和2012年版《指南》又在此基础上进行了内容的更新和形式的修订。

2013年,住房城乡建设部组织编写了新版《全国造价工程师执业资格考试大纲》,并经人力资源和社会保障部审定。新大纲改变了考试科目名称,对科目内容和结构也做了重要调整。全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会根据新大纲的要求,对2009年版《全国造价工程师执业资格考试培训教材》进行了全面修订,形成了2013年版《全国造价工程师执业资

格考试培训教材》。新教材主要修订内容包括：一是对教材名称做了更改并调整了相关内容；二是增加了考核实际能力的知识点，删除了部分基本概念的内容；三是增加了最新出台涉及工程造价管理的法律、法规和相关规定的內容，补充了新的工程计价业务的内容；四是将《建设工程技术与计量（安装工程）》选考部分由原来的三个专业合并为管道和设备工程、电气和自动化控制工程两个专业。

2014、2015年，全国造价工程师执业资格考试仍沿用2013年版考试大纲，对《建设工程计价》和《建设工程造价案例分析》两本教材进行了修订，主要根据《关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》（建标〔2013〕44号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令2013年第16号）和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013对相关内容进行了调整与修订。2016年，《指南》的编写教师就《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）两个重要文件进行了学习研讨，为适应2017年版教材改版做了充分的准备工作。

2017年，《全国造价工程师执业资格考试培训教材》再次改版，《指南》参编教师在深入研习教材的基础上，对2017年版《指南》进行了全面修订与编写。2018年，《指南》参编教师根据读者反馈信息及意见、建议，对2017年版《指南》进行了认真修订和增补，并与出版社的编辑同志进行了多次交流，组织了若干专题研讨会，使各科目之间实现了较为深入的横向沟通，为2018年版《指南》的编写做了大量基础性工作。

2018年7月20日住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部联合印发了《造价工程师职业资格制度规定》和《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕67号），将造价工程师分为一级造价工程师（Class1 Cost Engineer）和二级造价工程师（Class2 Cost Engineer）。随后住房城乡建设部、交通运输部、水利部组织有关专家，在总结以往全国造价工程师职业资格考试大纲实施经验的基础上，制定了《全国一级造价工程师职业资格考试大纲》（2019年版）和《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》（2019年版），并经人力资源和社会保障部审定。

2019年，《指南》全体参编教师深入研讨新政策、新考纲，对各科目的变化趋势进行了分析与预测，在此基础上针对一级造价工程师职业资格考试的要求，对2019年版《指南》进行了全面修订与改编。

2019年版《指南》主要特点如下：

- 反映新版教材变化，捕捉新增考点动态。
- 每科目复习导言点明该课程总体变化趋势及命题走向。

- 知识架构勾勒出整章清晰轮廓，使考生明确各知识点在整个章节体系中的地位和作用，形成脉络分明的复习主线。

- 经典考题剖析以考点为核心，将各章节知识点重新组合，以近年考题为切入点，重点阐释各知识点的潜在联系，明示各种题型组合。

- 难题解析部分选取具有代表性的多考点难题进行详细解析，向考生传授正确的解题思路和规范的解题步骤。

- 案例分析部分增加了历年考试真题结构分析，对每章历年试题情况细化为若干知识点的形式，使每章各年的考查内容一目了然；增加对题型模块组合思路的图形演示，帮助考生理解各知识模块的关联性，形成清晰、完整的解题逻辑链条；在此基础上对各章的案例题重新进行了整合，为考生充分展现案例分析科目特有的多模块组合题型，满足考生备考要求。

- 每科目后附模拟自测题，囊括了全部考核要点，便于考生临考练兵，查缺补漏。

在各位参编教师数月辛勤工作的努力下，《指南》将以崭新的风格、合理的编排与广大考生见面，各部分具体参编人员如下：

建设工程造价管理：夏立明；

建设工程计价：柯洪；

建设工程技术与计量（土木建筑工程）：吴静、李毅佳；

建设工程技术与计量（安装工程）：赵斌、郭迺琦；

建设工程造价案例分析：何增勤、王亦虹、李丽红。

在与中国计划出版社合作的近20年中，我们深深地被他们严谨的工作态度和孜孜以求的专业精神所感动，在此向所有为《指南》得以顺利、迅捷出版而付出辛勤劳动的有关同志表示衷心的感谢。另外，《指南》部分内容参考了业内同仁出版的著作和教材，一并表示感谢。

《指南》编写人员虽然对稿件几度推敲和校阅，但由于水平和能力所限，终归会有不遂人愿之处，恳请长期以来给予我们支持和关注的广大业界读者一如既往地对我们的疏漏之处进行批评和指正。

《指南》编者

2019年5月28日

目 录

复习导言	(1)
第一章 建设项目投资估算与财务评价	(4)
考纲要求	(4)
考点与题型详解	(6)
考点一：建设投资估算	(6)
考点二：基于项目投资现金流量表的财务评价	(14)
考点三：基于项目资本金现金流量表的财务评价	(21)
考点四：基于利润与利润分配表的财务评价	(27)
考点五：盈亏平衡分析	(33)
考点六：敏感性分析	(37)
难题解析	(41)
第二章 工程设计、施工方案技术经济分析	(45)
考纲要求	(45)
考点与题型详解	(46)
考点一：建设工程设计、施工方案的综合评价与比选	(46)
考点二：网络计划分析方法与应用	(57)
考点三：决策树分析在建设项目评价中的应用	(71)
难题解析	(74)
第三章 工程计量与计价	(80)
考纲要求	(80)
考点与题型详解	(82)
考点一：建设施工项目定额，指数、指标的计算与应用	(82)
考点二：工程计价	(87)
考点三：工程计量	(103)
难题解析	(145)
第四章 工程招标投标	(162)
考纲要求	(162)
考点与题型详解	(163)
考点一：建设项目招标投标工作相关知识的识别与简答	(163)
考点二：建设项目招标投标过程中的计算	(181)

难题解析	(193)
第五章 工程合同价款管理	(198)
考纲要求	(198)
考点与题型详解	(201)
(一) 考点一: 建设项目施工合同管理	(201)
(二) 考点二: 工程索赔	(214)
(三) 难题解析	(232)
第六章 工程结算与决算	(238)
考纲要求	(238)
考点与题型详解	(240)
(一) 考点一: 施工合同价款支付与结算	(240)
(二) 考点二: 资金使用计划与偏差分析	(264)
(三) 考点三: 形成资产法确定新增资产构成与竣工决算的相关知识	(271)
(四) 难题解析	(275)
模拟自测题一	(282)
模拟自测题二	(304)
模拟自测题三	(324)
2016 年度全国造价工程师执业资格考试试卷	(345)
2016 年度全国造价工程师执业资格考试试卷参考答案	(357)
2017 年度全国造价工程师执业资格考试试卷	(367)
2017 年度全国造价工程师执业资格考试试卷参考答案	(380)
2018 年度全国造价工程师执业资格考试试卷	(393)
2018 年度全国造价工程师执业资格考试试卷参考答案	(409)

复习导言

全国造价工程师执业资格考试自1997年开始进行考试,随着国内建设项目投资规模的不断扩大,相关法规、标准的调整,与考试相关的知识体系也在不断完善、调整,按照基本理论架构要求和方法应用、实务计算的基本要求,形成了定性分析与定量分析相结合、整体要求与阶段要求相结合、工程实践与知识集成相结合的考试形式;全面考核学员在工程造价管理过程的系统分析能力、综合判断能力、逻辑推理能力、实务计算能力、环境适应能力;试卷所涉及的知识范围广、综合性强、计算量大。

一、“建设工程造价案例分析”考试内容的基本要求

《建设工程造价案例分析》教材与考试大纲对教材各章节的考核要求做了明确规定。

工程项目决策阶段知识点的基本要求是:掌握相关经济政策、法规、制度;对可行性研究过程中的建设项目投资估算,建设项目财务指标计算与分析,建设项目的不确定性分析全面掌握;对各类财务基础数据指标与基本报表编制的熟练掌握。

工程项目设计阶段知识点的基本要求是:掌握工程设计、施工方案指标体系的结构特点;掌握多种技术、施工、设计方案的评价方法(价值工程分析方法,资金时间价值分析方法,决策树分析方法,网络计划分析方法,综合评价方法等),能够结合工作实践特点进行技术经济方案的优化对比;结合项目全寿命周期理论对建设方案进行整体评价。

工程项目施工前期阶段知识点的基本要求是:掌握工程量计量与审查,建设工程人工、材料、机械台班消耗指标的编制,分部分项工程单价的确定;设计概算,施工图预算的编制与审查;工程量清单计价规范和建筑安装工程费用项目组成相关规定的的应用。考核中以工程实际要求为试题背景,全面考核考生在工程施工全过程计量、计价、定额应用中解决实际问题的能力。

工程项目招标投标阶段知识点的基本要求是:掌握招标投标的法律、规范要求、程序、方式;掌握招标控制价的编制方法;掌握多种形式的评标、定标的计算方法,投标报价计算与投标方案比较,投标策略与决策树分析方法在投标决策中的应用。

工程项目施工阶段知识点的基本要求是:熟悉工程施工合同的类型与工程量清单计价规范和合同示范文本的主要条款,合同价款的调整,合同纠纷解决方式的应用;掌握工程实施过程中索赔事件的确定,责任判定,工程索赔与网络分析方法结合进行的综合计算。

工程项目竣工验收阶段知识点的基本要求是:掌握工程合同价款确定至合同收入形成过程的相关规定,工程价款结算与支付的具体方法;资金使用计划的编制与投资偏差分析方法;熟悉竣工决算的整体要求;掌握新增资产分类、确定、计算方法。

二、“建设工程造价案例分析”科目应试过程中的几点说明

(一) 注意造价工程师执业资格考试中其他科目与本科目的关系

造价工程师执业资格考试共有四个科目:“建设工程造价管理”(科目一)、“建设工

程计价”(科目二)、“建设工程技术与计量”(土木建筑工程或安装工程)(科目三)和“建设工程造价案例分析”(科目四)。“建设工程造价案例分析”课程内容与科目一、二、三的课程内容有着不可分割的关系。本科目的知识点来源于其他科目。为了保证“建设工程造价案例分析”考试试题的完整性,个别知识点可能超过其他科目考试大纲要求掌握和熟悉的内容。

(二) 应注意本科目中各章节知识点间的联系与结合

本科目考试是综合应用型考试,需要掌握同一知识考核点在不同条件下、不同题型中的具体要求,掌握同一题型中各个考核知识点间的关联关系。如网络计划分析方法在第二章题型中是工期优化、调整、比较的形式(结合项目背景),在第四章是投标方案工期确定与比较的形式,在第五章中与工期索赔中工期索赔计算结合,在第六章中与工程价款结算、偏差分析相结合。

(三) 应注意国家建设主管部门新颁布的法律、法规、标准的相关内容对考试的影响

近年来,国家有关部门颁布了《中华人民共和国招标投标法实施条例》(修订版)、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856—2013,调整了《建筑安装工程费用项目组成》和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013附录中工程量计量的部分内容。特别是有关部门出台了《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY 01-31-2015、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,与“建设工程造价案例分析”考试内容有关联。

三、基本知识、多点集成、基于实践、题型创新是目前试题题干构成的基本形式

“建设工程造价案例分析”考试是知识综合型考试;以基本知识点的不同表述形式,不同章节知识点的各种关联方式,试题背景材料构造中的实践性与多样性的特点构成试题结构。

在近几年试题难度基本稳定的情况下,由于很多考生不适应题型不断创新的变化,只靠掌握案例分析教材介绍的独立的知识点参加考试,必然产生多年考试不通过的状况。近年来试题基本结构的变化趋势应引起大家的注意:

1. 考试试题内容与相关法律的变化相适应,阅读近年来新出台的相关法律已成为准备考试不可缺少的环节。

2. 考试试题内容与工程管理工作实际相结合,背景材料的构成内容中实践性内容加大。考试中细心读题和对试题背景材料的分析,关键词语的理解,成为成功应试的重要前提。

3. 考试试题内容的分布范围加大,由前几年的单章节命题转化为多章节、多知识点综合命题,单独知识点考核难度有所降低,但整体试题综合分析要求提高。部分试题计算量适当减少,但思维分析强度增加。

4. 考试试题内容充分体现了对于基本概念、基本方法、基本规定、基本题型综合

第一章 建设项目投资估算与财务评价

考纲要求

1. 建设项目投资估算；
2. 建设项目财务分析；
3. 建设项目不确定性分析与风险分析。

表 1-1 第一章历年试题结构分析

财务评价知识点

年份	投资估算	收入	折旧	利息	成本	利润	税收	投资现金流量表	资本金利润表	利润表	不确定分析	备注
2009	静态投资为已知数据, 生产能力指数法计算	利用生产能力调整	直线折旧法计算			息税前利润	营业税调整所得税	融资现金流量表	第 8 年净现金流量分析			税后财务净现值 税后静态回收期
2010	建设投资为已知		直线折旧法计算	等额还本付息(表)	总成本表	利润总额	营业税 所得税		列式计算净现金流量			
2011	预备费计算 固定资产投资估算表		直线折旧法计算	等额还本付息(表)	总成本计算(列式)	利润总额	营业税 所得税		列式计算净现金流量			
2012	建设投资为已知	利用生产能力调整	直线折旧法计算	等额还本付息(表)	总成本计算(列式)	利润总额 净利润	营业税 所得税		判断还款能力			总投资收益率
2013	类推法计算 建设投资		直线折旧法计算	等额还本付息(表)	总成本计算(列式)	利润总额 (负值处理)	所得税	全表				税后净现金流量
2014	价差预备费、静态投资、建设投资		直线折旧法计算		固定、可变经营成本	利润总额 净利润	所得税		资本金净利润率		产量、单价盈亏平衡点	
2015	建设投资为已知	利用生产能力调整	直线折旧法计算	等额还本付息(表)	总成本(列式)	利润总额 净利润	营业税 所得税		列式计算净现金流量	判断还款能力		最大偿还能力形式 偿债备付率计算
2016	列式计算(建设 投资整体构成)	利用生产能力调整	直线折旧法计算	等额还本付息(表)	总成本(列式)	利润总额 净利润			列式计算净现金流量	判断还款能力		
2017	PPP 形式投资组合	收入形式 细化分解	直线折旧法计算	等额本息形式计算	总成本(列式)	净利润	所得税		资本金净利润率(社会)	判断运营还款能力		待定未知数法确定 社会资本投入值
2018	建设投资形成计算	已知 不含税 销售收入	直线折旧法计算		含进项税经营成本 已知	息税前 利润计算	调整所得税 增值税	全表				总投资收益率

考点与题型详解

考点一：建设投资估算

建设投资估算包括固定资产估算和流动资金估算两部分。其中固定资产投资估算部分涉及知识点较多，综合性较强，能够组合多种估算方法进行考核，因此，在历年造价工程师执业资格考试工程造价案例分析试题中出现过6次。流动资金估算分为扩大指标估算法和分项详细估算法两种方法，其中分项详细估算法涉及公式较多，具有一定难度。

知识要点集成

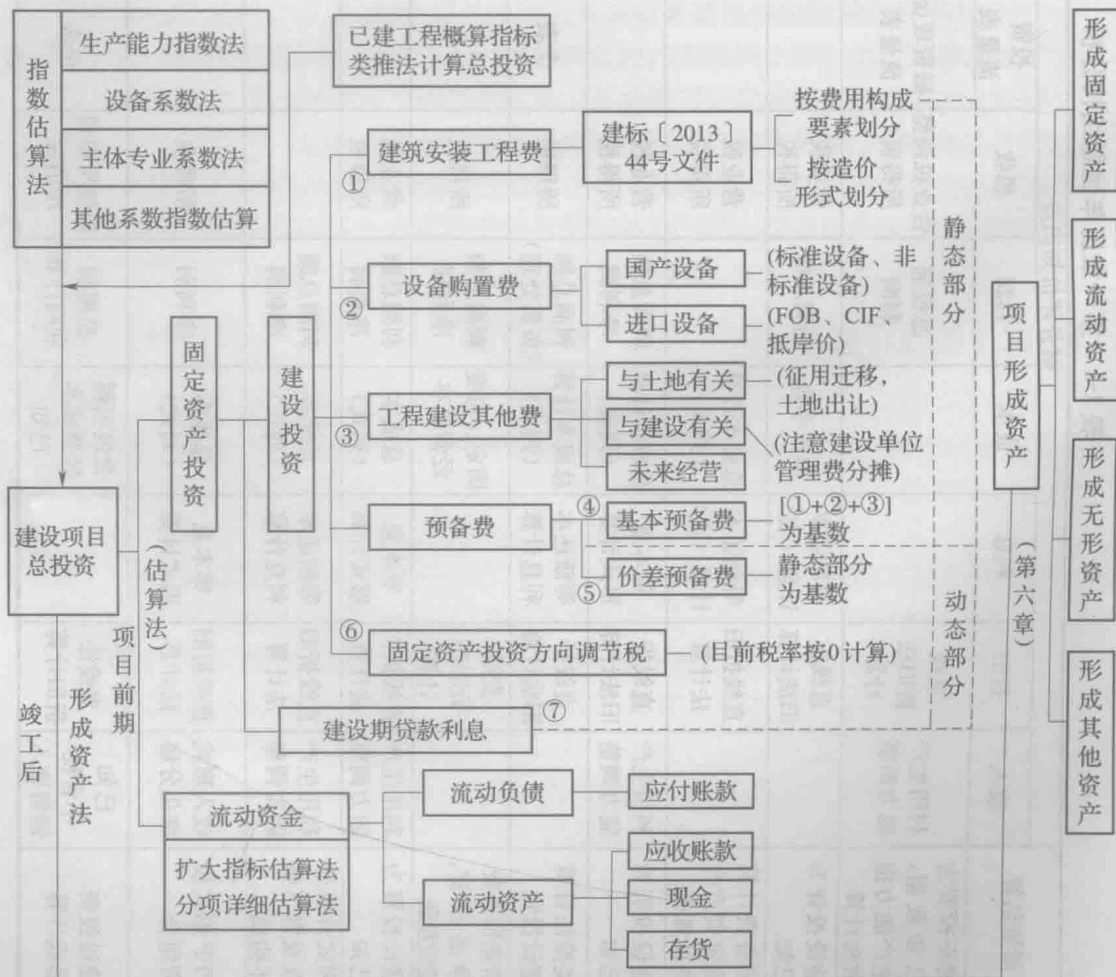


图 1-1 项目投资估算知识架构图

一、建设项目总投资的构成

表 1-2 建设项目总投资的构成

建设项目 总投资	固定资产投资	1. 设备及工器具购置费	} 工程费	} 建设投资
		2. 建筑安装工程费		
3. 工程建设的其他费用				
4. 基本预备费	} 预备费			
5. 价差预备费				
		6. 建设期贷款利息		
		流动资金投资		

二、固定资产投资估算

表 1-3 固定资产投资估算知识要点

估算 顺序	估算内容	估算 基数	涉及公式	公式备注
1	设备及工器具购置费； 建筑安装工程费； 工程建设其他费用	根据背景资料已知数据	①生产能力指数法： $C_2 = C_1 \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)^x f$ ②设备系数法： $C = E(1 + f_1 P_1 + f_2 P_2 + f_3 P_3 + \dots) + I$ ③主体专业系数法： $C = E(1 + f_1 P'_1 + f_2 P'_2 + f_3 P'_3 + \dots) + I$	C_1 (C_2): 已建类似 (拟建) 项目的投资额; Q_1 (Q_2): 已建类似 (拟建) 项目的生产能力; x : 生产能力指数; C : 拟建项目投资额; E : 拟建项目设备费; P_1 、 P_2 、 P_3 、 \dots : 已建项目中建筑安装工程费及其他工程费等占设备费的比重; f_1 、 f_2 、 f_3 、 \dots : 由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合调整系数; I : 拟建项目的其他费用; P'_1 、 P'_2 、 P'_3 、 \dots : 已建项目中各专业工程费用占设备费的比重
2	基本预备费	(1)	基本预备费 = (设备及工器具购置费 + 建安工程费 + 工程建设其他费用) × 基本预备费率	(1) + (2) 称为静态投资

估算顺序	估算内容	估算基数	涉及公式	公式备注
3	价差预备费	(1)+(2)	$PF = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)^m (1+f)^{0.5} (1+f)^{t-1} - 1]$	PF: 价差预备费; n: 建设期年份数; I _t : 建设期第 t 年计划投资额; f: 年均投资价格上涨率; m: 建设前期限
4	固定资产投资方向调节税	(1)+(2)+ (3)	固定资产投资方向调节税 = (设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其他费用 + 预备费) × 固定资产投资方向调节税税率	固定资产投资方向调节税于 2000 年暂停征收, 目前实际税率为零, 但解题时应按题目要求税率为准
5	建设期贷款利息	[(1)+(2)+(3)+ (4)] - 自有资金	① 名义利率转化为实际利率: $i = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$ ② 建设期各年应计利息: $q_j = \left(P_{j-1} + \frac{1}{2} A_j\right) i$	i: 年实际利率; r: 年名义利率; m: 年计息期数; q _j : 建设期第 j 年应计利息; P _{j-1} : 建设期第 j-1 年末贷款本息和; A _j : 建设期第 j 年贷款额

三、流动资金投资估算

表 1-4 流动资金投资估算知识要点

估算方法	估算步骤	涉及公式
扩大指标估算法	—	年流动资金额 = 年费用基数 × 各类流动资金率 年流动资金额 = 年产量 × 单位产品产量占用流动资金额
分项详细估算法①	① 估算流动资产: 流动资产 = 应收账款 + 预付账款 + 存货 + 现金 ② 估算流动负债: 流动负债 = 应付账款 + 预收账款 ③ 估算流动资金: 流动资金 = 流动资产 - 流动负债	应收账款 = 年经营成本 / 应收账款年周转次数 预付账款 = 外购商品或服务年费用金额 / 预付账款年周转次数 现金 = (年工资福利费 + 年其他费用) / 现金年周转次数 存货 = 外购原材料、燃料 + 在产品 + 产成品 + 其他材料 外购原材料、燃料 = 年外购原材料、燃料费用 / 分项年周转次数

① 分项详细估算法中涉及的算法和公式完全按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)修订, 具体案例解题时可根据背景数据选择使用。

经典题型剖析

题型一 多种估算方法结合运用

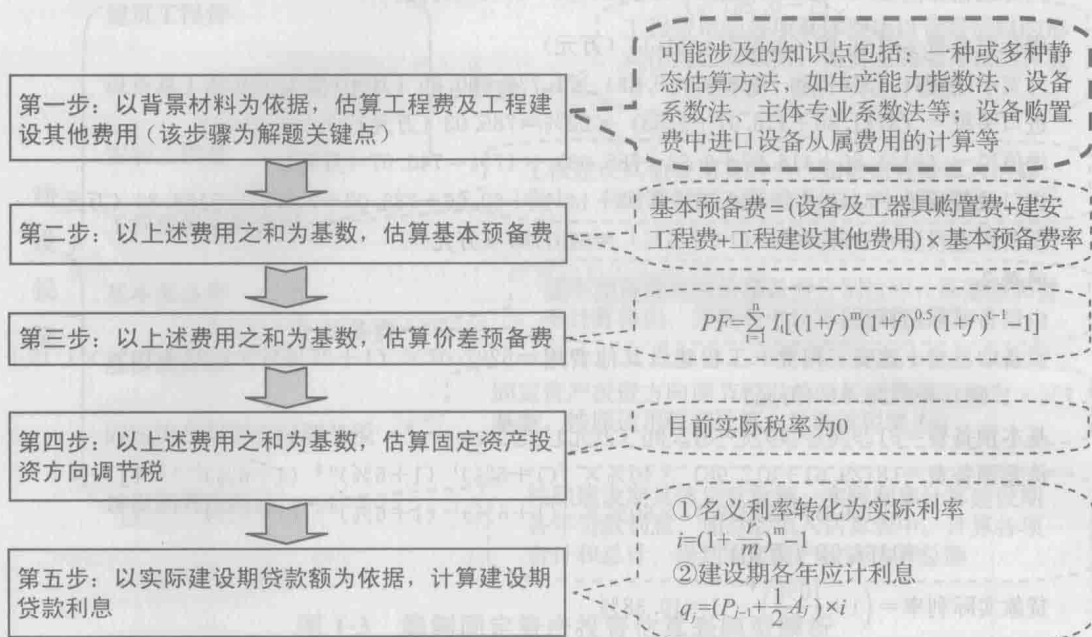


图 1-2 建设投资估算解题步骤

案例一

某工业引进项目，基础数据如下：

1. 项目建设前期为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的全部投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。
2. 全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为17%，美元对人民币的银行牌价为1:6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。
3. 根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，以上三项的综合调整系数分别为：1.23, 1.15, 1.08。
4. 本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款利率按10%计算，按季计息。基本预备费率10%，预计建设期物价年平均上涨率为6%。
5. 根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。

问题：

1. 计算项目设备购置投资。
 2. 估算项目固定资产投资额。
 3. 试用扩大指标法估算流动资金。
 4. 估算该项目的总投资。
- (计算结果保留小数点后两位)
