

建设工程项目管理丛书

建设工程项目成本管理

刘允延 主编



机械工业出版社

建设工程项目管理丛书编委会

主任委员 刘长滨

委 员 (排名不分先后)

刘长滨 刘允延 郭 立 戚振强

王炳霞 周晓静 钱雅丽 张 原

陶 庆 张 卓 周 霞

序

随着我国国民经济的发展，国际形势的变化，以及我国基本建设和建筑业管理体制的深化改革，工程建设如何适应市场经济体制的要求，不仅引起业内人士的重视，也为社会所普遍关注。与此同时，高等学校为了适应社会发展的需要，培养出满足市场需求的人才，也正在经历着重大的改革。在一系列重大改革之中，教材建设显得尤为重要。

为适应这种需要，北京建筑工程学院管理工程系组织在工程项目管理领域有丰富教学和实践经验的教师编写了建设工程项目管理丛书：《建设工程项目成本管理》、《建设工程项目工期管理》、《建设工程项目质量管理》、《建设工程项目风险管理》、《建设工程项目安全管理》。

本套丛书在编写过程中，我们力求做到在借鉴国际先进管理方法的同时，又结合我国进行项目管理体制改革以来的主要经验，理论联系实际，避免泛泛而谈，期望能对读者实际工作和学习有一定的指导意义。本套丛书虽经精心编写，但是限于我们的水平，定会存在很多不足，恳请广大读者不吝赐教。

本套丛书不仅适合在建设领域从业的广大读者，也可作为高等学校的师生的学习参考用书。

同时感谢机械工业出版社对本丛书编写和出版的大力支持。

前 言

成本管理是工程项目管理的一个非常重要的方面。成本管理的内容和控制的方法在建设项目生命周期的不同阶段各不相同。

项目业主的成本管理习惯上称为造价管理，其实质是投资控制。业主的投资控制主要体现在投资机会研究、可行性研究、投资决策、工程设计、施工招标等阶段中。工作的重点是前期的一系列估算，为投资决策提供依据。

选择项目的实施方式（采购模式）及确定施工合同类型是业主开发新项目时必须做出的重大决策，如选择正确不仅能最大限度地降低开发成本，提高投资效益，还能降低业主的风险。本书在第 猿章对此进行了较详细的论述。

优化设计是工程项目建设前期降低成本的核心措施。全寿命周期造价管理（~~蕴藻~~）是工程项目投资决策的一种分析工具，是一种用来选择决策备选方案的方法。主要以价值工程的思想 and 手段，综合考虑工程项目的建造成本和运营、维护成本，从而实现更为科学的建筑设计和更为合理的材料设备的选择。以便在确保设计质量的前提下，实现降低项目全寿命周期成本的目标。本书在第 缘章论述这一问题。

我国从今年 苑月 员日起实行工程量清单计价。本书在第 远章除介绍了传统的以概预算定额为基础的工料单价法和实物法编制工程标底的方法外，还详细地介绍了综合单价法和工程量清单计价的概念和方法，以适应目前建设市场新旧两种计价方式并行的实际情况。

承包商的成本管理发生在中标签约之后，主要工作包括投标报价、中标后在合同价格的基础上制定工程费用计划、费用目标分解、对目标实施监控并实施合理的索赔。主要的措施是降低企业的管理费用和施工过程中的资源消耗及向分包商转移风险。因此从纵向看，建设项目成本管理贯穿项目生命周期的始终；从横向看，包括业主、总包商、分包商、供货商在内的几乎所有参与方都要参与项目的成本管理。

本书在第 苑章介绍了承包商投标报价的方法和技巧，主要从技术的角度论述和介绍投标的程序和方法，不仅定性地分析各种投标技巧的应用原则，还定量地介绍了如何建立数学模型对工程项目进行精确报价。

承包商中标只是获得了潜在的盈利可能性，能否实现盈利要取决于施工阶段成本管理的效果。本书在第 愿章以成本—进度的计算机集成管理为主线，以赢得值理论的偏差分析为方法，通过例题详细介绍如何建立目标工程和数据更新，如何对施工项目的成本、资源、进度等数据进行动态监控。

本书由刘允延编写第 员 圆 猿 远 苑 怨 章，王炳霞编写第 源 缘 章，刘允延、陶庆合编第 愿 章。

本书由刘允延主编、王炳霞为副主编，由刘允延最终定稿。

本书虽然精心编写，但由于作者水平和能力所限，定有不足之处，敬请专家和读者批评指正。

作 者

圆 园 零 年 源 月 于 北 京

目 录

序	圆	圆	建设期贷款利息	圆
前言	圆	圆	固定资产投资方向调节税	圆
第 1 章 绪论	圆	圆	铺底流动资金	圆
1.1 工程造价的含义和特点	圆	圆	建设项目的计价依据	圆
1.1.1 工程造价的含义	圆	圆	建设工程定额	圆
1.1.2 工程造价的特点	圆	圆	工程造价信息	圆
1.1.3 工程造价的计价特征	圆	猿	第 2 章 建设项目的实施方式对成本的影响	猿
1.1.4 工程造价管理的改革	猿	猿	2.1 传统的实施方式	猿
1.1.4.1 我国传统工程造价管理制度存在的问题	猿	猿	2.2 设计原建造方式	猿
1.1.4.2 工程造价管理改革的现状	源	猿	(阅读原月)	猿
第 2 章 建设项目造价的构成	远	猿	2.3 施工管理方式(悦方式)	猿
2.1 概述	远	猿	猿 代理型悦方式	猿
2.1.1 我国现行工程项目投资构成和工程造价构成	远	猿	(悦转手)	猿
2.1.2 世界银行工程造价的构成	苑	猿	猿 非代理型悦方式	猿
2.1.3 设备及工具、器具购置费用的构成	苑	猿	(晕转手)	猿
2.1.3.1 设备购置费的构成及计算	苑	猿	2.4 建造原经营原移交(月)方式	源
2.1.3.2 工具、器具及生产家具购置费的构成及计算	怨	猿	猿 月模式的产生	源
2.1.4 建筑安装工程费用构成	怨	猿	猿 我国月项目的运作程序	源
2.1.4.1 建筑安装工程费用构成概述	怨	猿	猿 月模式尚待解决的问题	源
2.1.4.2 直接工程费	员	猿	2.5 结论	源
2.1.4.3 间接费	员	猿	第 3 章 建设项目决策阶段的造价控制	源
2.1.4.4 利润及税金	员	猿	3.1 建设项目的可行性研究	源
2.1.4.5 国外建筑安装工程费用的构成	员	猿	3.1.1 可行性研究(云)的概念	源
2.1.5 工程建设其他费用构成	员	猿	3.1.2 可行性研究的作用	源
2.1.5.1 土地使用费	员	猿	3.1.3 可行性研究的依据	源
2.1.5.2 与项目建设有关的其他费用	员	猿	3.1.4 可行性研究的内容	源
2.1.5.3 与未来企业生产经营有关的其他费用	员	猿	3.1.5 可行性研究的阶段	源
2.1.5.4 预备费	员	猿	3.1.6 可行性研究报告的主要内容	源
		猿	3.2 建设项目的投资估算	源
		猿	3.2.1 投资估算及其作用	源
		猿	3.2.2 投资估算的编制依据与原则	源
		猿	3.2.3 投资估算的编制方法	源

源源 流动资金的估算	源	源 建设工程标底的编制方法	苑
源 建设项目的经济评价	源	源源 工料单价法	苑
源源 建设项目经济评价的内容	源	源源 综合单价法和工程量清单	
源源 经济评价指标	源	计价	苑
第 源章 建设项目设计阶段的造价		源 合同类型的选择	源
控制	源	源源 总价合同 (违约责任)	源
源 概述	源	源源 单价合同 (违约责任)	
源源 设计阶段的划分和各阶段的		违约责任	源
成本管理	源	源源 成本加酬金合同 (违约责任)	源
源源 工程设计与工程造价的关系	源	第 苑章 建设工程施工招标投标的方法	
源 设计方案的优选	源	和技巧	源
源源 设计招投标	源	源源 建设工程施工招标投标程序	源
源源 设计方案竞选	源	源源 投标前期的工作	源
源 运用价值工程优化设计方案	源	源源 投标报价	源
源源 价值工程的含义	源	源源 投标报价的技巧	源
源源 价值工程的目的	源	源源 不平衡报价	源
源源 提高价值水平的途径	源	源源 增加建议方案	源
源源 价值工程的工作程序	源	源源 无利润算标	源
源源 用价值工程控制造价的要点	源	源源 利用数学模型辅助投标报价	源
源 实行限额设计	源	第 愿章 建设工程施工阶段的成本	
源源 限额设计的含义	源	管理	源
源源 限额设计的全过程	源	源源 工程项目的成本费用计划	源
源源 限额设计要点	源	源源 成本费用计划的编制依据	源
源 设计概算的编制	源	源源 成本费用计划的编制方法	
源源 设计概算的内容和作用	源	和步骤	源
源源 设计概算的编制依据和编制		源 工程项目的成本控制	源
原则	源	源源 工程项目成本控制的依据	源
源源 单位工程概算的编制	源	源源 成本费用控制的步骤	源
源源 单项工程综合概算的编制	源	源源 成本控制的方法	源
源源 建设项目总概算的编制	源	源 建设工程价款的结算	源
第 源章 建设工程施工招标价格的		源源 工程预付款的支付及偿还	源
确定	源	源源 工程进度款的支付 (中间	
源 概述	源	结算)	源
源源 建设工程项目实行招投标		源源 工程变更价款和施工索赔	
的范围	源	价款	源
源源 建设工程的招标方式	源	源源 工程竣工结算	源
源 建设工程施工发包承包价格的影响		第 怨章 建设工程的竣工决算	源
因素	源	源源 竣工验收	源
源 建设工程施工招标价格的确定	源	源源 竣工验收的范围和依据	源
源源 标底的概念和作用	源		
源源 标底的编制依据	源		

竣工验收的标准	员源	新增资产价值的确定	员苑
竣工验收的程序	员缘	附录 建筑工程施工发包与承包计价	
竣工决算	员缘	管理办法	员怨
竣工决算的内容	员缘	参考文献	员圆
竣工决算的编制	员苑		

第 1 章 绪 论

1.1 工程造价的含义和特点

1.1.1 工程造价的含义

工程造价的直接含义就是工程的建造价格。这里的工程泛指一切建设工程，它的范围和内涵具有很大的不确定性。在市场经济的条件下工程造价有两种含义。

第一种含义：建设成本（或叫工程投资）是对投资方、业主、项目法人而言。为谋求以较低的投入获得较高的产出，在确保建设要求、工程质量的前提下谋求尽可能低的建设成本，这就必须对建设成本实行从前期就开始的全过程控制和管理。因此建设成本的管理属于对特定工程项目的投资管理范畴。

第二种含义：承包价格（或叫工程价格）是对发包方、承包方双方而言的。双方的利益要求是矛盾的。双方在特定工程上都通过市场谋求有利于自己的承包价格。因此承发包双方都要对特定的工程项目进行价格管理。这种管理属于价格管理的范畴。

中文的“造价”与英文的“cost”是对应的，而“price”同样既可以表示“费用”或“成本”，也可以表示“价格”或“造价”。“cost”的具体含义同样取决于该词使用在何处和使用者的用意。本书在不同场合提到造价、成本、费用、价格等词汇时一般会指明其含义，如果在特定的章节其含义已很明显，读者完全可从上下文逻辑关系知晓其含义，笔者就不再赘述其含义。

1.1.2 工程造价的特点

1.1.2.1 工程造价的大额性 工程价格的大额性是由于其形体庞大、构造复杂、大量耗费资源所致，少则几百万，多则几个亿，十几亿甚至更多。价格越高的工程，其节约的潜力也越大。工程价格的大额性影响到有关各方的重大经济利益，同时也会对国家宏观经济产生重大影响。因此加强工程价格管理可取得巨大的经济效益。

1.1.2.2 工程价格的竞争性 发包价格只有一个，然而由于参与施工承包的竞争者的多元性，故各有自己的估价方式和估价量。在投标竞争中，价格的竞争是最主要的竞争，竞争的结果只剩下取胜者的一个价格。按照《招标投标法》的规定，这个价格是在能够满足招标文件的实质性要求的前提下，由评审的投标价格最低者中标。竞争性计价有利于进行价格优化，有利于提高承包者的经营管理水平。

1.1.2.3 工程价格的可变性 由于工程施工期长、资金具有时间价值、工程变更的必然性和索赔行为的存在等原因，承包时的合同价格是要变化的。没有人能够事先确定其变化后的具体数值，只有在竣工结算时，才能确定实际的准确价格。所以，在计价中必须考虑风险因素和可变因素，力争在估价时估算的价格与实际工程价格更贴近，而在工程价格结算时必须进

行价格调整。

圆工程价格的地区性 工程是固定在大地上的，不能移动。工程有地区性，故工程价格亦有地区性。地区性使价格水平、计价应考虑的因素、工程价格的可变性和竞争性等均产生很大差异。这种差异表现在国内、省内的不同地区，也表现在国内外。地区性差异使宏观监督管理的难度增大，在不同地区之间竞争与管理的难度大，风险也大。我国幅员辽阔，应在工程价格管理中充分注意工程价格的地区性。

圆工程价格的多专业性 建设工程施工按专业可分成许多类，如建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、矿山工程、电信工程、铁路工程、化工石油工程等。各类专业工程由专业施工队伍进行承包施工，各专业施工队伍又往往分属于不同的主管部门。因此长期以来，各有一套管理模式、计价方法、标准与规定，计价水平也有差别，由此导致了工程价格的多专业性。在我国工程价格的确定和管理必须考虑专业的特点，尊重各专业管理部门的管理要求。随着改革的深入和与国际惯例相衔接，随着建筑市场的逐步发育和完善，专业不同的工程的价格管理差距会越来越小，管理的责任会逐渐集中，但是各专业的工程价格之间的专业差别是不会消除的，进行工程价格管理仍然要考虑专业特点。

圆计价依据的复杂性 不同的费用有不同的计价依据；不同的计价方式也有不同的计价依据；不同的建设阶段计价依据也不相同；不同部门、不同地区、不同时期，计价依据均有差异。因此，工程施工发包承包价格的计价依据十分复杂。如何选择和使用适宜的计价依据是重大的管理理论问题，也是改革中一项十分突出的问题。

圆工程价格结算方式的多样性 工程价格的结算可以采用按月结算、竣工后一次结算、分阶段结算和合同约定的其他方式结算。各种结算方式产生了不同的核算方式，不同的核算难度、不同的核算工作量，对社会经济产生不同的影响。

工程价格的以上特点，既是它区别于其他价格的标志，又是对工程价格进行管理的根据，应当引起充分重视。工程价格管理同一般商品价格管理比较，无论在内容上、方法上、难度上，均独具特点，它对国民经济的影响之大也是其他商品难以比拟的。

圆工程价格的计价特征

作为建设工程这一特殊商品的价值表现形式，建设工程造价除具有一切商品价格的共同特点之外，同时又具有其自身的特点。主要特征是：单件性计价、多次性计价、按工程构成的分部组合计价和计价方法的多样性。

圆单件性计价 每一项建设工程都有特定的用途，不同的结构、造型和装饰，不同的规模，建设时采用不同的设备和材料。即使是用途相同的建设工程，设计标准差别也很大。还要受工程所在地的水文、地质、地震、气候等自然条件的影响。再加上不同地区各种价格要素的差异，最终导致建设工程造价的千差万别。因此对于建设工程不能像对工业产品那样按品种、规格、质量成批定价，只能通过特殊的程序（编制估算、概算、预算、合同价、结算价及最后确定竣工决算价等）就特定项目计算建设工程造价。

圆多次性计价 建设工程是一个周期长、规模大、造价高的生产过程。包括可行性研究在内的设计过程一般较长，并且要分阶段进行，逐渐深化。为了便于工程建设过程中各方经济关系的建立，满足项目管理的要求，适应工程造价控制和管理的要求，需要按照设计和建设阶段进行多次计价。

该过程从投资估算、设计概算、施工图预算到合同价的确定，再到各项工程的结算价和最后在结算价基础上编制的竣工决算，整个计价过程是一个由粗到细、由浅入深，最终确定建设工程造价的过程。计价过程各环节相互衔接，前者制约后者，后者补充前者。

獾按工程构成分部组合计价 在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程，也可将它理解为具有独立存在意义的完整的工程项目。各单项工程又可分解为各个能独立施工的单位工程。再进一步将单位工程分解为分部工程和分项工程。计价时先进行分项工程计价，再进行组合，依次完成分部工程、单位工程、单项工程和建设项目的计价。所以计价时的计算量很大。之所以要进行分部组合计价，是因为计价对象的体形庞大，又是一次性的，没有标准的价格。这一特点造成了计价结果的差异性。如何进行分解、怎样进行组合、怎样计入综合性价格等问题成为业内人士研究的课题和争论的焦点，由此便产生了工程价格计价方式的问题。该问题在第 6 章详细讨论。

6.1 工程造价管理的改革

6.1.1 我国传统工程造价管理制度存在的问题

我国工程造价管理一直沿用前苏联的模式，实行与高度集中的计划经济相适应的概预算定额管理制度。在计划经济时期，工程建设概预算定额管理制度对工程造价的确定和控制起过积极作用。因为在传统的社会主义计划经济的模式下，商品生产的范围只限于个人消费品，生产资料不是商品，在生产领域起调节作用的是国民经济有计划按比例发展的规律，价值规律只在流通领域起调节作用，在生产领域只起影响作用，这就淡化或排斥了价值规律。随着经济体制的改革和对外经济开放的扩大，我国目前的概预算定额管理制度与社会主义市场经济的发展越来越不适应。造价管理制度和定额计价手段暴露出很多问题。

(1) 国家成为工程价格运行的主体，而本应作为建筑市场的主体的承包人和发包人没有价格的决策权和定价权，影响了发包人投资的积极性；取消了承包人生产经营的自主权。

(2) 违反商品的供求规律，将建筑经济活动纳入行政管理活动。法定性的固定计划价格在承包过程中不可能对通货膨胀（或紧缩）做出价格调整的反映。当供求不平衡时，不便于承包人按照市场竞争原则进行正当的竞争。

(3) 概预算定额管理作为一种法定性质的制度，在一定程度上束缚了投资者的投资行为和承包者的经营行为，削弱了市场主体的行为能力，既不利于企业的发展也不利于与国际管理接轨。

(4) 定额理应是确定分项工程资源消耗量的参考标准，但为了事先确定工程造价的需要，而将“量”“价”合一。这在政府长期控制价格水平的计划经济体制下是可行的，也为造价人员带来了方便。但市场经济条件下的工、料、机价格是变化的，这就必然产生“活市场”和“死单价”的矛盾，不能在中及时准确地反映建筑产品的造价。

(5) 定额综合程度过大，在实际操作中往往因为定额的限制，不应计取的也不便扣除。如在墙体工程中，综合了过梁、圈梁、砖砌垃圾道、通风道及附墙烟囱，尽管在实际工程中

所包括的内容各不相同，但所计取的单价却相同，造成价格不能反映价值。

此外，施工方法消耗部分也统得过死，工程实体消耗部分固然应由设计决定，而施工方法、手段却可以是多种多样的，应由施工方在统筹考虑成本和工期等因素后自行决定。如模板、机械台班等使用摊消费如何计算，到底是按折旧费还是按租赁费，也应由施工方在确保履行合同的前提下自行决定。但过去的定额制度未考虑结合工程实际的必要的调整，把企业的技术力量、施工能力、管理水平、设备装备等竞争因素固定化了，客观上削弱了优势企业的竞争力。

(远) 现有的对号入座式的概预算子目不可能涵盖所有的材料做法，不可能涵盖不断发展的新材料、新工艺、新技术。为了满足设计要求，施工单位在报价时必须不断地调整换算规定的子目，这样做一方面增加了承发包双方造价人员的工作量，另一方面也为高估冒算提供了可乘之机，从而助长了三超现象。如果业主方（目前我国大部分工程业主仍是国家）缺少称职的造价咨询人员就必定蒙受巨大损失。

工程造价管理改革的现状

针对上述问题，我国近年来就如何建立符合市场经济体制的工程造价管理模式展开了积极有益的探索，广东率先进行了工程量清单计价方式的试点；北京市根据建设部“十五”规划中有关造价管理改革的指导意见，也提出了造价管理改革的基本思路：总目标是通过改革建立起国家宏观调控下，由市场形成工程造价的机制。近阶段目标是通过改革具体计价依据和计价办法，理顺费用构成，为推行国际通用的工程量清单计价办法提供依据。

为此北京市新编了预算定额，其原则是以本地定额为基础；以全国定额为指导；现行规范、标准图集为依据；以新技术、新工艺、新材料、新设备等为补充。子项以本地为主，本地没有的采用全国的；本地与全国水平有差异的进行合理调整，以反映北京市当前的施工水平和管理水平。体现最新成果、节能和智能建筑的特点。在上述原则的指导下北京市业已完成了下述工作：

(员) 将概算定额体系改为预算定额体系。在子目设置和工作内容方面，将概算定额以主要工程为主，综合相关工程内容的以主带次、综合编制的原则改成按施工工序编制；把概算定额按轴线和层高计算改成按图示尺寸计算。

(圆) 将构成工程实体的实体消耗与非实体性消耗分离，非实体性消耗指为了工程必须发生但又逐步分摊到工程上的消耗及一些措施性消耗。

(猿) 理顺费用构成，将概算定额中的其他直接费分别列入其他人工费、其他材料费、其他机具费、临时设施费、现场经费或单独成章。

(源) 实行“定额量、市场价、指导价”的计价原则，工程的实体性消耗以定额为依据，非实体性消耗由企业参照定额的消耗标准自主确定；人工、材料、机械全部实行市场价，现场管理费、企业管理费、利润为指导性费率，可上下浮动。

在推出上述计价措施的同时，北京市还颁发了一系列配合性的管理办法。如颁发了《关于北京市建设工程造价计价办法的通知》，《关于取消建筑行业劳动保险统筹基金记取有关问题的通知》等。

这一系列配套措施为新旧两种计价方式的并行创造了条件，即既能按预算定额计价，又有利于推行工程量清单计价，两种模式并行，适应了目前建设市场的实际情况。

目前《建设工程工程量清单计价规范》已由建设部编纂完成。建设部第 108 号公告已批准上述规范为国家标准，并自 2003 年 9 月 1 日起实施。这是我国造价管理体制的一场变革，是工程计价模式的飞跃，对建筑市场各方主体都将产生重大的影响。该部分的具体内容将在第 2 章做更深入的阐述。

第 四 章 建设项目造价的构成

第一节 概述

第一节 我国现行工程项目投资构成和工程造价构成

一、工程造价相关概念

建设项目总投资 建设项目总投资指建设项目的投资方在选定的建设项目上所需投入的全部资金。建设项目一般是指在一个总体规划和设计的范围内，实行统一施工、统一管理、统一核算的工程，它往往由一个或数个单项工程所组成。建设项目按用途可分为生产性项目和非生产性项目。生产性项目总投资包括固定资产投资和包括铺底流动资金在内的流动资产投资两部分。而非生产性项目总投资只有固定资产投资，不含上述流动资产投资。建设项目总造价是项目总投资中的固定资产投资总额。

固定资产投资 在我国固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、房地产开发投资和其他固定资产投资四部分。建设项目的固定资产投资也是建设项目的工程造价，其中建筑安装工程投资也就是建筑安装工程造价。

建筑安装工程造价 建筑安装工程造价是比较典型的生产领域价格，是建设项目投资中的建筑安装工程投资，也是项目造价的组成部分。投资者和承包商之间是完全平等的买方与卖方的商品交换关系，建筑安装工程实际造价是买卖双方共同认可的由市场形成的价格。

二、建设项目总投资及工程造价的构成

从图 4-1 可以看出建设项目总投资包含固定资产投资和流动资产投资两部分。工程造价由设备及工、器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税构成。

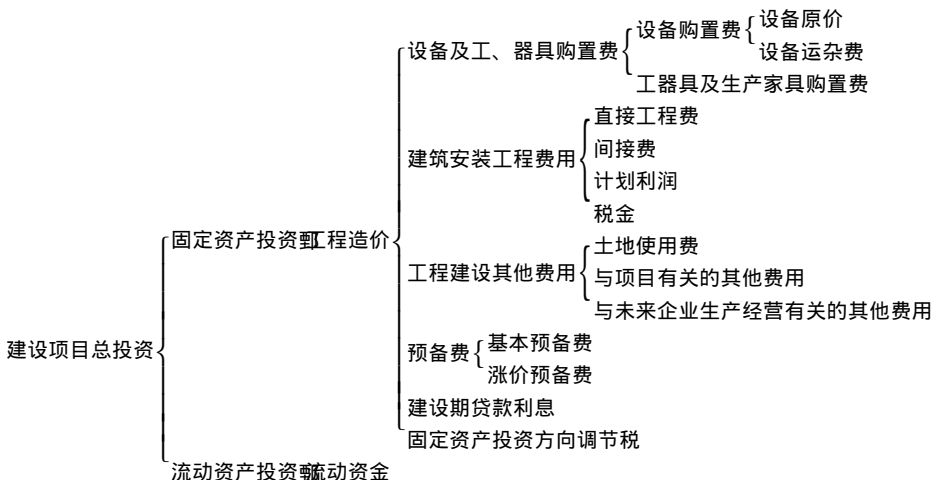


图 4-1 我国现行建设项目总投资及工程造价的构成

8.1.1 世界银行工程造价的构成

世界银行和国际咨询工程师联合会于 1983 年对工程项目的总建设成本做了统一的规定(相当于我国的工程造价),其详细内容如下。

项目直接建设成本 主要包括土地征用费、场外设施费用、场地费用、工艺设备费用、设备安装费用、管道系统费用、电器设备费、电器安装费、仪器仪表费、机械的绝缘油漆费、工艺建筑费、工厂普通公共设施、车辆费、其他当地费用等。

项目间接成本

(1) 项目管理费:包括总部人员的工资和福利费用、施工现场管理人员的工资、差旅、业务费等杂项费用及各种耐金。

(2) 开工试车费:指工厂投料试车必须的劳务和材料费用。

(3) 业主的行政性费用。

(4) 生产前费用:指前期研究、勘测、建矿采矿等费用。

(5) 运费和保险费。

(6) 地方税。

应急费 包括未确定项目的备用金和不可预见费

建设成本上升费用

8.1.2 设备及工具、器具购置费用的构成

设备及工具、器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的。

8.1.2.1 设备购置费的构成及计算

设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用,由设备原价和设备运杂费构成。

设备购置费 = 设备原价 + 设备运杂费

上式中的设备原价指国产或进口设备的原价,设备运杂费指除设备原价之外的有关设备采购、运输、途中包装及仓库保管等方面支出费用的总和。

国产设备原价的构成及计算

(1) 国产标准设备原价:国产标准设备原价是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求,由我国设备生产厂批量生产的,符合国家质量检测标准的设备。有的国产设备原价有两种,即带有备件的原价和不带备件的原价。计算时一般采用带有备件的原价。

(2) 国产非标准设备原价:国产非标准设备是指国家尚无定型标准,各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产,只能按一次定货,并根据特定的设计图纸制造的设备。该类设备原价有多种不同的计算方法,如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。但无论采用哪种方法都应使非标准设备计价接近实际出厂价,并且计算方法要简便。按成本计算估价法,非标准设备的原价由以下费用组成:

1) 材料费

材料费 = 材料净重 \times (1 + 加工耗损系数) \times 每吨材料综合价

圆 加工费：包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等。其计算公式为：

加工费 越设备总重量（吨）伊设备每吨加工费

獭 辅助材料费（简称辅材费）包括焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等费用。计算公式如下：

辅助材料费 越设备总重量 伊辅助材料费指标

源 专用工具费：按以上三项之和乘以一定百分数计算

缘 废品损失费：按以上四项之和乘以一定百分数计算

远 外购配套件费：按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。

苑 包装费：按以上六项之和乘以一定百分数计算

愿 利润：可按以上 员~ 缘项之和乘以一定的利润率计算。

怨 税金：主要指增值税，计算公式为：

增值税 越当期销项税额 原进项税额

当期销项税额 越销售额 伊适用增值税率

员园 非标准设备设计费：按国家规定的设计费收费标准计算。

因此单台非标准设备原价可用下面公式表达：

单台非标准设备原价 越 [（材料费 垣辅材费 垣加工费）伊（员垣专用工具费率）伊（员垣废品损失费率）垣外购配套件费 伊（员垣包装费率）原外购配套件费] 伊（员垣利润率）垣增值税 垣非标准设备设计费 垣外购配套件费

员员 进口设备原价的构成及计算 进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税后的价格。

（员）进口设备的交货方式：进口设备的交货方式可分为内陆交货类、目的地交货类和装运港交货类。

内陆交货类即卖方在出口国内陆的某个地点交货。卖方在交货地点及时提交合同规定的货物和有关凭证，并承担交货前的一切费用和风险；买方按时接受货物，交付货款，承担接货后的一切费用和风险，并自己办理出口手续和装运出口。货物的所有权也在交货后由卖方转移给买方。

目的地交货类即卖方在进口国的港口或内地交货，包括目的港船上交货价、目的港船边交货价和目的港码头交货价（关税已付）及完税后交货价（进口国指定地点）等几种交货价。上述交货方式的特点是：买卖双方承担的责任、费用和 risk 是以目的地约定交货点为分界线，只有当卖方在交货地点置于买方控制下才算交货，才能向买方收取货款。这种交货方式对卖方来说风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

装运港交货类即卖方在出口国装运港交货，主要有装运港船上交货价（云獭月），习惯称离岸价格；运费在内价（悦云圆）以及运费、保险费在内价（悦云），习惯称到岸价。它们的主要特点是：卖方按照约定的时间在装运港交货，只要卖方把合同规定的货物装船后提供货运单据便完成交货任务，可凭单据收回货款。

装运港船上交货价（云獭月）是我国进口设备采用最多的一种货价。采用船上交货价时卖方的责任是：在规定的期限内，负责在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只，并
