

“十二五” “十三五” 国家重点图书出版规划项目

China South-to-North Water Diversion Project

中国南水北调工程

● 建设管理卷

《中国南水北调工程》编纂委员会 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

“十二五” “十三五” 国家重点图书出版规划项目

China South-to-North Water Diversion Project

中国南水北调工程

● 建设管理卷

《中国南水北调工程》编纂委员会 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书是《中国南水北调工程》丛书的第三卷，全书系统介绍了南水北调东、中线一期工程建设管理的做法与经验，内容包括工程建设管理体制与机制、招标投标管理、工程进度管理、安全生产管理、工程验收管理等方面，并以大量工程建设实例介绍了水利工程建设管理的基本理论和方法在工程建设中的运用情况，书末对南水北调工程的建设管理进行了经验总结并提出了值得思考的问题。本书旨在将南水北调工程建设管理的成果予以交流和传承。

本书可为南水北调二、三期工程建设管理提供指导，也可与其他水利工程，特别是跨流域调水工程的建设管理提供借鉴，可供从事水利工程相关专业人员以及高等院校相关专业师生借鉴、参考。

图书在版编目（CIP）数据

中国南水北调工程. 建设管理卷 / 《中国南水北调工程》编纂委员会编著. — 北京：中国水利水电出版社，2018.9

ISBN 978-7-5170-6922-5

I. ①中… II. ①中… III. ①南水北调—水利工程管理 IV. ①TV68

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第219520号

书 名	中国南水北调工程 建设管理卷 ZHONGGUO NANSUIBEIDIAO GONGCHENG JIANSHE GUANLI JUAN
作 者 出版发行	《中国南水北调工程》编纂委员会 编著 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版 印 刷 规 格 版 次 印 数 定 价	中国水利水电出版社装帧出版部 北京中科印刷有限公司 210mm×285mm 16开本 20.25印张 542千字 20插页 2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷 0001—3000册 280.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究



2013年3月28日，国务院南水北调办主任鄂竟平视察八里湾泵站



2012年3月6日，国务院南水北调办副主任张野在南阳段湍河渡槽施工工地调研




2012年11月6日，国务院南水北调办副主任蒋旭光检查工程质量




东线第一梯级泵站——江苏宝应站



东线第二梯级泵站——江苏淮安四站

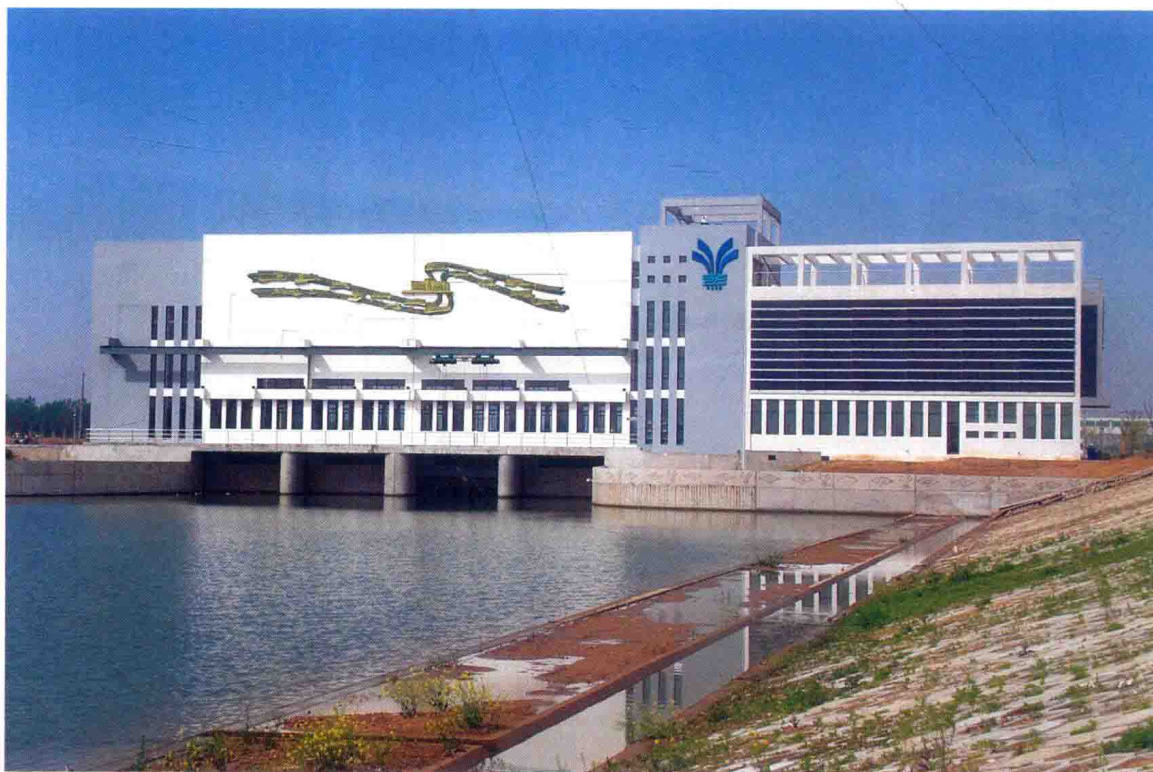

东线第三梯级泵站——江苏淮阴三站

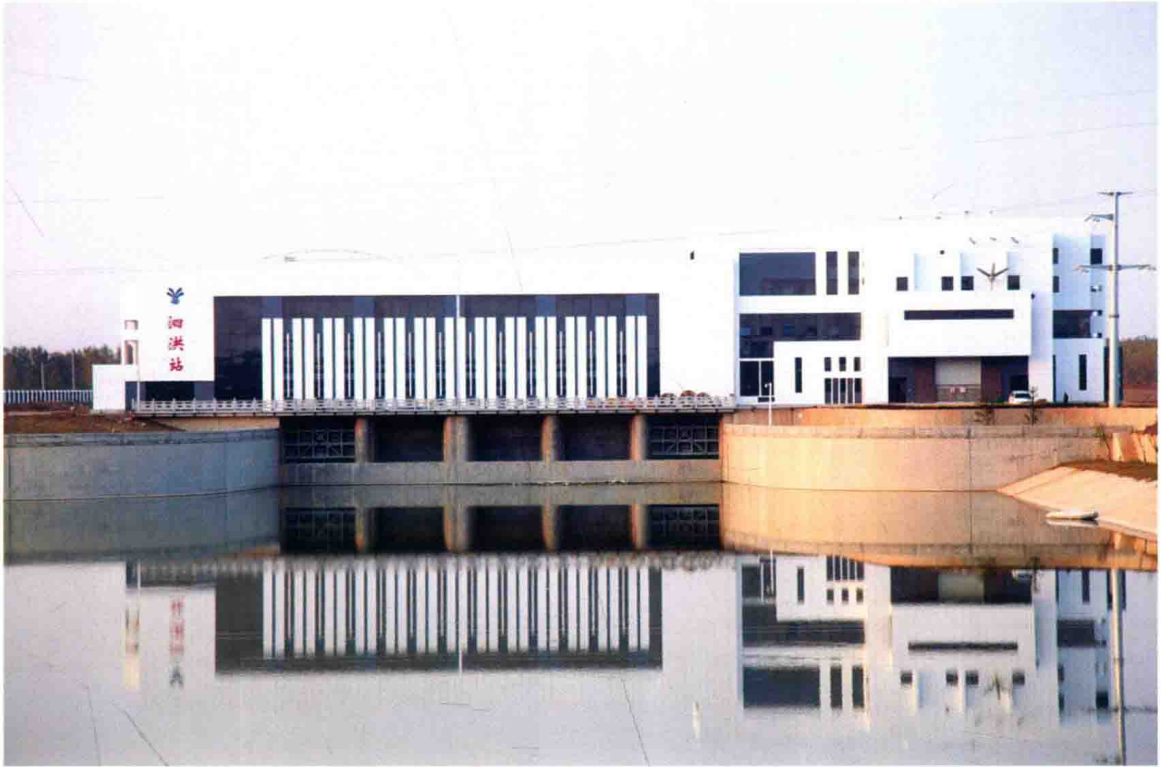

东线第四梯级泵站——江苏泗洪站



东线第五梯级泵站——江苏刘老涧二站



东线第六梯级泵站——江苏邳州站



东线第七梯级泵站——江苏刘山站



东线第八梯级泵站——江苏解台站



东线第九梯级泵站——江苏蒯家坝站



东线第十梯级泵站——山东二级坝站



东线第十一梯级泵站——山东长沟站



东线第十二梯级泵站——山东邓楼站



东线第十三梯级泵站——山东八里湾站




东线江苏洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程



东线江苏骆马湖水资源控制工程



东线南四湖水资源控制工程——大沙河闸

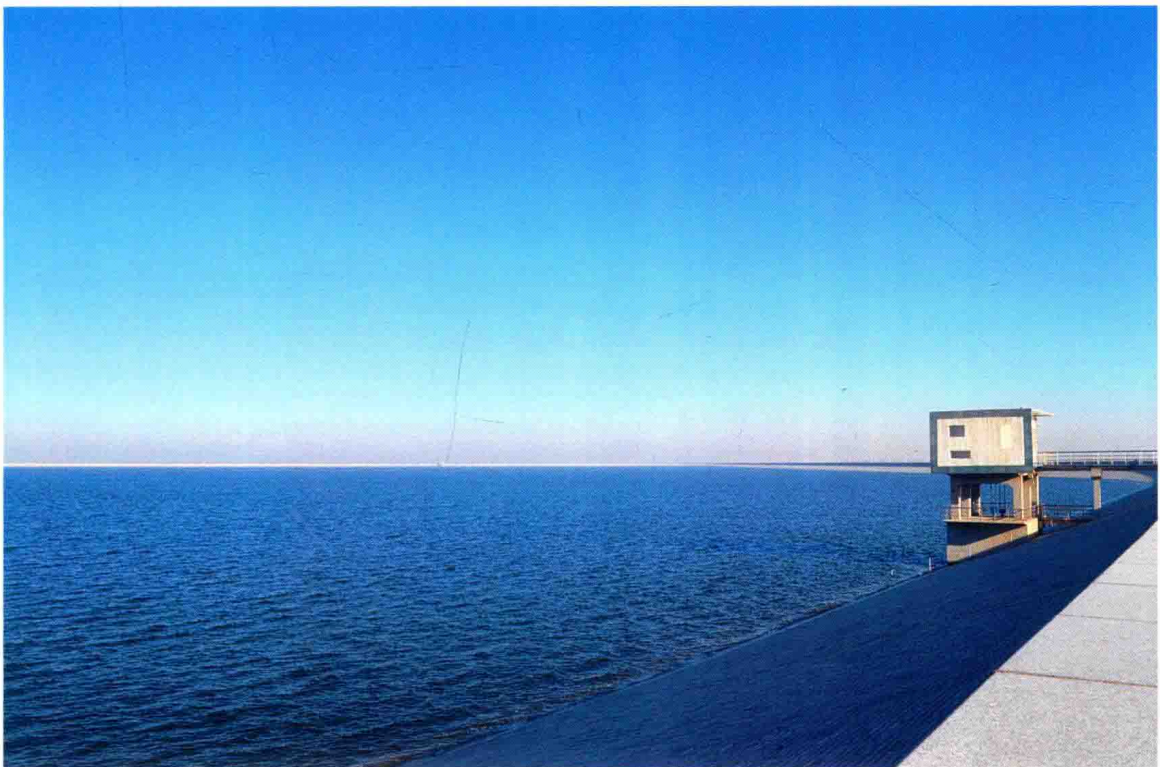

东线山东大屯水库



东线山东东湖水库




东线山东双王城水库



东线穿黄工程施工



东线山东济平干渠混凝土衬砌

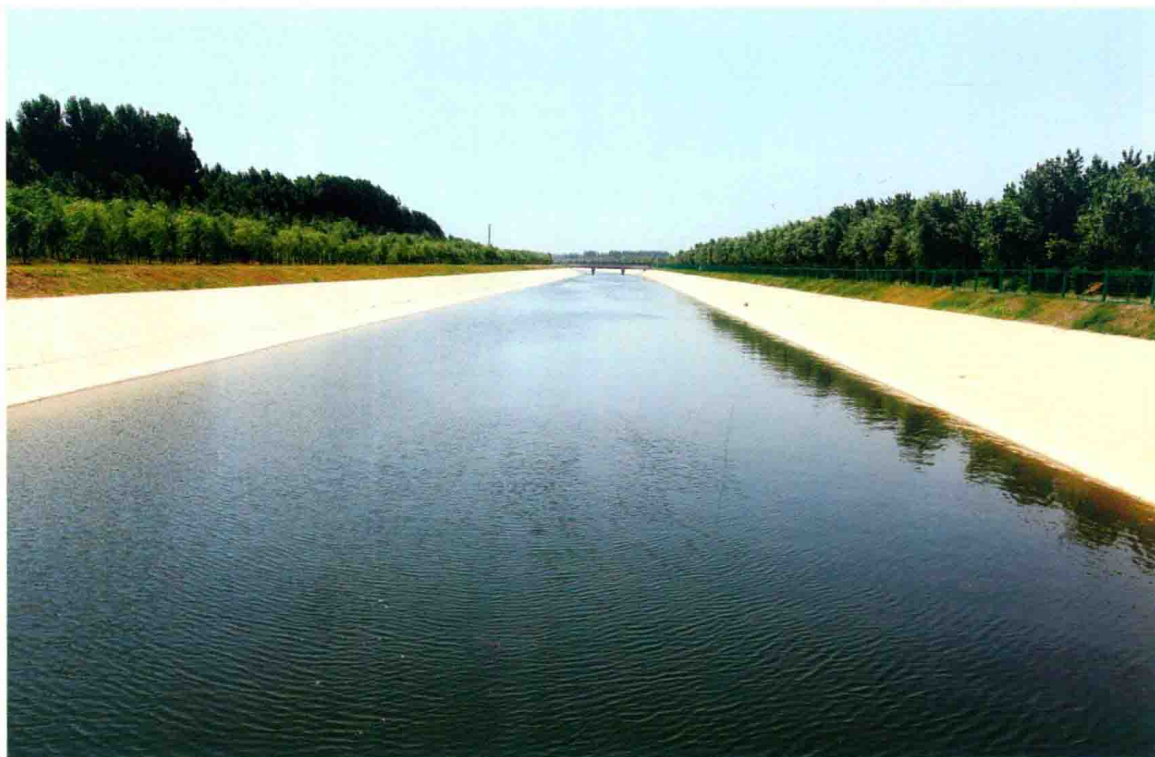

东线山东陈庄渠道



江苏骆南中运河



山东滕州滨湖湿地水质净化效果明显



东线洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程——安徽五河泵站
